

亞新工程顧問股份有限公司 函

地址：22102新北市汐止區新台五路一段
112號22樓
承辦人：簡至立
電話：02-28910567
電子郵件：maagroup@maaconsultants.
com

受文者：宏昇營造股份有限公司

發文日期：中華民國115年10月5日

發文字號：亞新（工管）字第1150061186號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：1150930-第225次專技會議紀錄含簡報（0061186_1150930-第225次專技會議紀錄含簡報.pdf）

主旨：檢送115年09月30日召開「復興崗營區職務宿舍新建統包工程」第225次專業技術協調會議紀錄，請 鑒核。

說明：

- 一、依據復興崗營區職務宿舍新建工程委託專案管理及監造技術服務契約第八條/五/（四）及第七條/十/（一）規定辦理。
- 二、有關建築能效評估辦理進度，115年9月30日第225次專技會議，設計單位續予說明，預計於115年10月2日（五）前依建築中心意見完成修正，並重新提送申請資料，後續持續追蹤辦理。
- 三、有關第二次變更設計之新設圍牆校方側（基地外側）排水工程，115年9月24日第224次專技會議原則同意先行辦理第二次變更設計相關檢討及行政作業；惟基地外側積水區及排水設施涉及原計畫範圍外之新增需求，其辦理方式仍俟新增需求及機關核定程序結果續辦；至工期調整部分，另




依實際影響情形及相關佐證資料續予檢討。115年9月30日第225次專技會議，專管單位說明，已依前次會議決議完成相關資料彙整，並於115年9月29日以亞新（工管）字第1150058339號函送北部地區工程營產處辦理。

四、統包團隊與會人員(或代理人員)應依核定之服務實施計畫書人員或經機關同意之人員為限，如未經機關同意或未納入服務實施計畫書之人員，請統包團隊依序報核，以符權責。

五、有關統包商各項送審資料進版應依契約規定期限辦理，避免影響貴單位權益。

六、再次提醒統包廠商，依統包契約第九條第(四十四)款第1目略引：「乙方之建築師、技師或其他依法令、契約應到場執行業務人員，其應到而未到場，每人次懲罰性違約金 5 千元。」

正本：國防部空軍司令部人事軍務處、國防部軍備局工程營產中心北部地區工程營產處、王正源建築師事務所、宏昇營造股份有限公司、王騰建築師事務所

副本：國防部軍備局工程營產中心(含附件) 

總經理 毛聖生 本案依分層負責規定授權業務主管
決行



復興崗營區職務宿舍新建統包工程
第 225 次專業技術協調會會議紀錄

「復興崗營區職務宿舍新建統包工程」

第 225 次專業技術協調會會議紀錄

會議時間：中華民國 115 年 9 月 30 日(星期三) 上午 09 時 30 分

會議地點：工地 1 樓會議室

主持人：專案經理周澤民

紀錄：簡至立

出(列)席：詳簽到表

壹、 本次討論事項：

一、 專案管理及監造：

1. 細部設計各階段逾期不可歸責之檢討(自第 101 次~225 次專技會議，未完成)：114 年 5 月 22 日經與機關及統包商研討確認，納入計價款時之設計工期檢討，統包商說明預計第二期設計費後辦理。工營中心 114 年 11 月 26 日已完成第二期設計費計價。
 - (1) 統包商 115 年 7 月 1 日 115 宏工字第 1150003877 號函送細部設計不可歸責乙方原因相關事宜。
 - (2) 專管監造單位業於 115 年 7 月 8 日以亞新(工管)字第 1150038465 號函檢附審查意見函送機關。
 - (3) 機關於 115 年 7 月 20 日備工建規字第 1150009197 號函覆審查意見請專管監造單位續辦。
 - (4) 專管單位於 115 年 8 月 21 日亞新(工管)字第 1150050877 號函請機關同意將審查期限展延 30 日。
 - (5) 機關 115 年 9 月 01 日備工建規字第 1150011371 號函同意專管單位展延作業至 115 年 9 月 21 日前完成檢討報告。
 - (6) 115 年 9 月 21 日專管單位已亞新(工管)字第 1150055010 號發函，敬請機關展延工作天 15 日。
2. 有關細部設計報告書(含工期檢討)(自第 171 次~225 次專技會議，未完成)：
 - (1) 114 年 8 月 28 日工營中心說明針對專管所提送逾期檢討，倘有不可歸責乙方原因，請統包商提出澄復意見及相關佐證資料儘速函送專管及本中心審認。
 - (2) 統包商 115 年 7 月 1 日 115 宏工字第 1150003877 號函送細部設計不可歸責乙方原因相關事宜，專管監造單位業於 115 年 7 月 8 日以亞新(工管)字第 1150038465 號函檢附審查意見函送機

關，後續俟機關核示辦理。

- (3) 有關細設報告書及細設各階段逾期不可歸責之檢討，統包商併案於前開公文(統包商 115 年 7 月 1 日 115 宏工字第 1150003877 號函)提送專管審查，因此本項次併項次 1 追蹤辦理。

3. 建照第 2 次報備圖說與原核准細設圖差異，辦理細設圖說調整事宜：

- (1) 115 年 4 月 29 日第 203 次專技會議，設計單位在會議中回覆，細部設計圖說與建造執照第二次變更(報備)，因為時間差的問題，建築執照變更已調整為與細部設計核准圖一致為主，建造執照第二次報備，主要差異是在消防的部份，配合消防變更的檢討，B 棟_1 樓幼兒園之排煙窗及天花板高程調整，會盡快整理相關資料發函回覆。
- (2) 統包設計單位於 115 年 5 月 6 日以 115 宏工字第 115550002729 號函回覆。
- (3) 專管單位於 115 年 5 月 12 日以亞新(工管一)字第 1150025040 號函文機關，同意廠商以設計釋疑辦理。
- (4) 115 年 6 月 4 日第 208 次專技會議，專管單位請統包商儘速辦理圖說釋疑。設計單位說明，本項主要係因 B 棟 1 樓排煙窗及天花板高度等內容，於第二次報備變更送審過程中配合消防審查意見辦理調整，致部分內容與原細設圖說不符。另第二次報備變更相關圖說、差異表及附件資料均已完成彙整，經會議討論，本項原則併入第二次建照變更一併辦理；惟如現場施工時程不及，得先以圖說釋疑或設計釋疑方式先行釐清，後續再併同第二次建照變更程序辦理。
- (5) 115 年 6 月 25 日第 211 次專技會議，專管監造單位提醒倘涉及建築法第 39 條變更設計要件，應先行辦理變更設計程序後再行施工，請避免先行施工情事再發生。

4. 第 1 次五大管線變更設計：

- (1) 115 年 7 月 30 日第 216 次專技會議：
 1. 消防局轉消防大隊於 7 月 2 日審圖，臺北市政府消防局於 115 年 7 月 3 日發函重新檢討，7 月 17 日修正後送審，7 月 21 日進入審查階段，於 7 月 29 日收到核准函。
 2. 給水於 115 年 3 月 19 日掛件、6 月 10 日清圖階段、6 月 16

日核准。

3. 電力於 115 年 4 月 10 日掛件、6 月 10 日清圖階段、7 月 14 日製作副本、7 月 15 日取得核准。

4. 電信於 115 年 3 月 23 日掛件、5 月 21 日取得核准。

(2) 115 年 8 月 6 日第 217 次專技會議，設計單位說明統包團隊於 115 年 8 月 3 日以 115 宏工字第 1150004554 號函，檢送本工程經各權責機關審查核定之五大管線第一次設計變更核准圖說資料；專管單位已於 115 年 8 月 5 日函轉工營中心備查。

(3) 115 年 8 月 13 日第 218 次專技會議，設計單位說明，五大管線第一次設計變更核准圖說已完成提送，目前俟機關核定；另就五管變更與核定的細設圖進行差異比較，經會議討論，為利後續變更設計及圖說調整有所依據，原則仍請統包設計單位正式函文提送，後續依程序辦理。

(4) 115 年 8 月 18 日第 219 次專技會議，設計單位說明，依前次會議結論，統包團隊已就五管第一次變更核准圖說與核定細部設計圖說辦理差異比較，並於 115 年 8 月 17 日以 115 宏工字第 1150004815 號函正式提送相關資料，後續由專管單位依程序辦理審查及函轉作業。

(5) 115 年 8 月 28 日第 220 次專技會議，專管單位說明，已於 115 年 8 月 25 日以亞新（工管）字第 1150049670 號函陳報機關，建請機關同意將本案納入後續變更設計程序辦理。

(6) 115 年 9 月 17 日（專管 9/18 收文），北工處發函備北工營字第 1150007909 號，請專管單位配合五大管線第一次變更設計核准，檢附業管機關核准證明，並依契約規定完成設計疏責、同等品及工期增減等相關檢討後再行提送，俾利本處憑辦。

(7) 115 年 9 月 23 日，專管單位發函回覆北工處發函備北工營字第 1150007909 號，建請機關以第 220 次專業技術協調會議說明，將本案納入後續變更設計程序辦理。

5. 流出抑制計畫與施工作業期程影響（含排水滯洪規劃變更）（歷經第 164 次~225 次專技會議，未完成）：114 年 10 月 2 日第 174 次專技會議設計單位回報，經水利技師及工地確認後流出抑制須辦理變更設計，變更時程最遲需於使照請領前 6 個月辦理相關作業。

(1) 114 年 9 月 4 日第 170 次專技會議，另流出抑制部分統包商上週

已完成清圖，細設圖與原核定流出抑制設施排水計畫不同部分，目前待水利技師及工地確認後於 114 年 9 月 30 日前回報是否辦理變更設計。另統包商說明排水滯洪規劃之滯洪量依臺北市政府工務局水利工程處核定之流出抑制設施排水計畫辦理，無須辦理變更。

- (2) 114 年 10 月 2 日專技會議設計單位回報，經水利技師及工地確認後流出抑制須辦理變更設計，變更時程最遲需於使照請領前 6 個月辦理相關作業。

6. 建築能效評估(歷經第 163 次~225 次專技會議，未完成)：

- (1) 114 年 7 月 28 日備工建管字第 1140010618 號函說明四略以「另針對建築能效評估乙案，……釐清本案後續適用規定、原核定細設內容須配合調整項目、是否涉及其他契約變更等初步檢討，於 114 年 8 月 8 日前提送本中心，……」(專管單位 114 年 8 月 1 日收文)。臺北市政府都市發展局於 114 年 7 月 14 日北市都授建字第 1143048016 號函已說明本工程建築能效應達第 1+ 級；有關建築能效初步評估展延部分，為考量後續行政程序時效性，工營中心於 114 年 8 月 18 日函送同意展延至 114 年 8 月 25 日。

- (2) 有關建築能效初步評估展延部分：

- 1、114 年 8 月 22 日統包商、專管單位取得內政部建築研究所函覆建築能效評估諮詢事宜。114 年 9 月 4 日第 170 次專技會議，有關建築能效初步評估設計單位於會中說明，目前能效評估顧問仍在計算中，因作業不及無法於原訂期限內提出初步評估資料，且試算後內容需再研討，故需再展延至 114 年 9 月 18 日，前述展延日期在不影響現場工進前提下，專管單位與北工處無意見，仍須請設計單位於函送建築能效評估資料時，於函文內敘明延後提送緣由及考量，以利簽辦。
- 2、114 年 9 月 18 日第 172 次專技會議，統包團隊說明建築能效評估目前內部仍持續討論中，預計需再展延至 114 年 10 月 9 日提出初步評估資料，專管單位提醒，統包團隊欲展延日期在不影響現場工進前提下無意見，建築能效初步評估若因統包團隊持續延宕，進而影響材料設備發包作業執行或現場工進，仍屬統包團隊責任。

- 3、114 年 10 月 9 日第 175 次專技會議，工營中心要求 114 年 10 月底前提出確定方案。
- 4、114 年 10 月 29 日第 178 次專技會議，本次會議統包團隊建築能效建築能效顧問未依據第 175、177 次專技會議結論，與專管單位顧問討論合宜方案，以致無法於專技會議提出方案予使用單位在會議中討論，無法依工營中心要求於 114 年 10 月 31 日前提出確定方案，需再展延，初步評估資料預計需再展延日期請統包商於下週專技會議回報，請統包團隊勿再拖延，以免影響現場工進。請下週五前(114 年 11 月 7 日)須與專案管顧問召開會議確認揚水泵及瓦斯爐方案，並請統包商於本週五(114 年 10 月 31 日)前確認下週可開會日期及時間，以利專管單位邀集顧問與會，並須於 114 年 11 月 13 日專技會議提出方案予使用單位於會議中討論。
- 5、114 年 11 月 6 日統包商協同專管相關顧問召開建築能效討論會議。
- 6、114 年 11 月 13 日第 180 次專技會議，有關建築能效展延部分，統包設計單位於會議中說明，114 年 11 月 6 日協同專管相關顧問召開建築能效討論會議之意見尚未調整完妥，原預計於 114 年 11 月 27 日專技會議提出方案討論，並預定 114 年 12 月 5 日前提出初步評估資料，因揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式認定問題，統包設計單位諮詢建築中心，目前建築中心討論中，初步評估資料恐無法於 114 年 12 月 5 日提出。
- 7、114 年 12 月 4 日第 183 次專技會議，經會中詢問有關建築能效需再展延之日期，統包設計單位回復，因揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式認定問題尚未確認，初步評估資料預計需再展延至 114 年 12 月 31 日提出。
- 8、114 年 12 月 31 日第 187 次專技會議，有關建築能效釋疑申請，統包商設計單位於 114 年 12 月 22 日以 E-mail 提供建築中心辦理後續，本日(12/31)會中統包設計單位說明，因揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式認定，尚未收到建築中心確認資訊，故初步評估資料預計需再展延至 115 年 1 月 31 日提出。
- 9、115 年 1 月 29 日第 191 次專技會議，統包設計單位說明，經電話聯繫建築中心承辦，本案有納入 115 年 1 月 22 日內部會

議討論，惟未取得結論，另建築中心建議發文予建研所協助確認，統包設計單位已於 115 年 1 月 28 日發文，持續因揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式認定，尚未收到建築中心確認資訊，故初步評估資料預計需再展延至 115 年 2 月 28 日提出。

- 10、115 年 2 月 26 日第 194 次專技會議，設計單位已於 115 年 1 月 28 日發文予建築中心、建研所協助確認，持續因揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式認定，尚未收到建築中心、建研所確認資訊，故初步評估資料預計需再展延至 115 年 3 月 31 日提出。
- 11、115 年 3 月 25 日第 198 次專技會議，持續因揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式認定，尚未收到建築中心、建研所確認資訊，故初步評估資料預計需再展延至 115 年 4 月 30 日提出。
- 12、115 年 4 月 1 日第 199 次專技會議，關於建築能效評估辦理進度已聯繫上建研所，預計建研所將於月中旬正式發文，但根據過往經驗評估，提議待未來正式函文下達後，再依據其具體建議進行調整與修正。
- 13、115 年 4 月 29 日第 203 次專技會議，建研所 115 年 4 月 28 日建研環字第 1157638324 號函指示 PEB 之 Qc 計算方式，設計單位將依照該函指示進行相關作業辦理，會盡快提供預定完成日期在專技會議說明。
- 14、115 年 5 月 7 日第 204 次專技會議，係回應前次會議紀錄追蹤事項。經設計單位說明，目前建築能效評估仍辦理中，預計於 115 年 8 月中完成。惟專管監造單位於會議中表示，若評估完成時程落於 8 月中，恐壓縮統包商後續現場設備相關作業期程，爰設計單位回應，將於下週第 205 次專技會議 09:30 由機電技師到場說明，並進一步釐清建築能效評估後續辦理期程及相關配合作業。
- 15、115 年 5 月 14 日第 205 次專技會議，設計單位報告，依建研所 115 年 4 月 28 日建研環字第 1157638324 號函指示事項辦理，預計於 115 年 5 月 31 日前完成機電檢討及圖說調整作業，並提送修正資料供建築能效評估顧問檢討；另預計於 116 年 2 月 28 日取得候選證書。惟實際辦理時程仍可能依主管機關審查進度調整，前述時程僅供會議追蹤管控。
- 16、115 年 6 月 10 日，第 209 次專技會議，設計單位回報建築能

效依照 P43、44 頁進度，盡量於七月底八月初前確認，是否影響結構施工，第 210 次專技會議持續追蹤進度。

- 17、115 年 6 月 25 日，第 211 次專技會議，機關詢問建築能效目前實際辦理進度，並表示先前所提出之期程為 7 月底至 8 月初完成相關圖說及資料整合，惟目前每週會議紀錄僅記載「持續檢討」或「設計單位辦理中」，無法掌握各項工作之實際完成程度，亦無法確認原訂期程是否可能延誤。
- 18、115 年 7 月 2 日第 212 次專技會議，設計單位說明目前建築能效作業已進入第二階段，辦理報告書撰寫、資料檢討及彙整作業，預計於 115 年 7 月底取得第一版評估資料；如受假日或作業影響，可能順延至 8 月初提供。
- 19、115 年 7 月 16 日第 214 次專技會議，設計單位林建築師語音遠端說明，目前建築能效進度截至 115 年 7 月 8 日空調、外殼等皆完成，預計 115 年 7 月 31 日(五)完成一版，115 年 8 月 4 日(二)前提供群組 1 版並開始啟動申請業主用印作業(詳細進度與日期，詳簡報 P39)。
- 20、115 年 7 月 22 日第 215 次專技會議，設計單位說明，目前建築能效進度截至 115 年 7 月 19 日空調、外殼、熱水皆完成，整體進度 73.8% (其他：用印文件、爐台設備、地下停車場送排風機、電梯、揚水泵 50%、照明節能 90%)預計 115 年 7 月 31 日(五)完成一版，115 年 8 月 4 日(二)前提供群組 1 版並開始啟動申請業主用印作業(詳簡報 P40)。
- 21、115 年 7 月 30 日第 216 次專技會議，設計單位說明，目前建築能效進度截至 7 月 29 日外殼、空調、照明、熱水、爐台、地下室停車場送排風機、電梯皆完成，整體進度 93.8% (其他進度：用印文件、揚水泵 50%)預計 115 年 7 月 31 日(五)完成一版，115 年 8 月 4 日(二)前提供群組 1 版並開始啟動申請業主用印作業(詳細進度與日期，詳簡報 P44)。
- 22、115 年 8 月 6 日第 217 次專技會議，設計單位說明統包團隊於 115 年 8 月 3 日以 115 宏工字第 1150004555 號函，檢送本工程候選建築能效評估申請所需之起造人用印文件。專管單位業於 115 年 8 月 5 日以亞新(工管)字第 1150046022 號函轉起造人，請其協助辦理用印。

- 23、115 年 8 月 18 日第 219 次專技會議，機關說明，起造人於 115 年 8 月 17 日國空人庶字第 1150192396 號發函通知，已完成鈐印(專管監造單位於 8 月 19 日收文)，後續由設計單位接續辦理掛件及審查作業。
- 24、115 年 9 月 2 日第 221 次專技會議，設計單位說明，建築中心已確認收受紙本申請資料，惟尚待完成正式掛件收執並排入審查程序。主席考量以 116 年 3 月 31 日前取得候選證書為目標，整體辦理期程已較為緊迫，請設計單位主動向建築中心確認申請文件是否完整、有無須補正事項及正式掛件日期。設計單位表示，已持續主動追蹤掛件及缺件情形，惟建築中心內部尚有既定行政作業流程，仍須俟其正式書面通知；後續將持續追蹤辦理進度。
- 25、115 年 9 月 11 日第 222 次專技會議，設計單位說明，於 115 年 9 月 8 日 115 宏工字第 1150005238 號發函通知專管單位，建築中心已於 115 年 9 月 2 日收受申請資料、9 月 8 日通知繳納審查費新臺幣 10 萬 1,000 元及「發票抬頭確認文件」，前開審查費由設計單位先行墊付，後續再依程序向機關辦理請款。專管單位於 115 年 9 月 11 日亞新(工管)字第 1150055188 號發函請空軍辦理文件用印，並請於用印完成後逕交統包商接續辦理。俟完成繳費及文件補正後，始得正式掛件，俟完成繳費及補件後始得正式掛件；預估行政作業約需 2 週，可能至 10 月初進入審查，考量後續審查約需 4 個月，116 年 3 月 31 日前取得候選證書已有期程風險。另目前能效估算 92.59 分，已達 1+ 級，後續將以提升瓦斯熱水器能效、調整電梯系統及增設電力回生裝置補足分數，相關變更費用尚待確認。
- 26、115 年 9 月 17 日第 223 次專技會議，設計單位說明，有關建築能效評估辦理進度，已於 115 年 9 月 14 日完成繳費作業；另空軍司令部人事軍務處已於 115 年 9 月 14 日以國空人庶字第 1150216081 號函辦理相關用印事項。俟用印文件完成後，續由設計單位提送財團法人台灣建築中心辦理正式掛件程序，續予列管。
- 27、115 年 9 月 24 日第 224 次專技會議，設計單位說明，有關建

築能效評估辦理進度，空軍端用印完成後，資料於 9 月 21 日上傳；9 月 23 日建築中心已有初步審查意見。

28、115 年 9 月 30 日第 225 次專技會議，設計單位說明，有關建築能效評估辦理進度，預計於 115 年 10 月 2 日（五）前依建築中心意見完成修正並重新提送。

(1) 有關建築能效評估方案(揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式)：

1、114 年 9 月 11 日第 171 次專技會議，統包商簡報 P41~P46，有關能效評估統包商於會議中說明，經核算目前為 2 級，要達 1+級，預計調整空調、照明、揚水泵、瓦斯爐、電梯，針對統包商調整項目專管單位意見資料，請統包商針對專管單位意見於下週專技會議時，列表回復及說明。另施工單位於會議中表示，建築能效調整之項目後續恐影響施工單位材料設備發包作業執行，請統包團隊相互加緊評估速度。

2、114 年 10 月 9 日第 175 次專技會議，統包團隊提出建築能效評估簡報，惟提出之初步評估資料尚須修正，並須新增建築能效方案評估表等表單(至少包括原細設方案、都審方案、其他符合 1+級之調整方案)，照明應提供照度模擬圖、發光效率、配光曲線、相關參數設定等說明；揚水泵調整不能影響使用需求，請補充相關說明。請統包團隊建築能效顧問與專管單位顧問於下週先行討論合宜方案，於 114 年 10 月 23 日專技會議提出方案予使用單位於會議中討論，並於 114 年 10 月底前提出確定方案予工營中心。

3、114 年 11 月 6 日第 179 次專技會議，於王正源建築師事務所另召開建築能效檢討會議：

(A)揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式建議依所在基地之自來水公司規定計算，請統包商再釐清。

(B)相關方案以不影響原設計(空間)面積調整為原則；請補充設備單價差異，俾利空軍(使用單位)能據以抉擇方案。

4、114 年 11 月 13 日第 180 次專技會議，有關建築能效評估資料說明如后：

(A) 因 114 年 11 月 6 日協同專管相關顧問召開建築能效討

論會議之意見統包設計單位尚未調整完妥，於本次會議說明預計於 114 年 11 月 27 日專技會議提出方案討論，屆時請統包設計單位於 114 年 11 月 25 日前先行將方案上傳 LINE 大群供專管及工營中心、空軍審視。

(B) 請統包設計單位盡速跟建築中心釐清揚水泵 PEB 之 Q_c 計算方式。

5、114 年 12 月 11 日第 184 次專技會議，統包商簡報 P36~42，有關建築能效評估資料說明如后：

(A) 統包設計單位於會中說明，目前將依據上週專技會議(12/4)結論，提送建築能效評估方案資料(詳統包商簡報 P42)，請統包團隊務必檢附完整計算附件、報價單等相關資料，以利審查。

(B) 有關揚水泵 PEB 之 Q_c 計算方式，設計單位於會中提出，需請專管單位協助提供一日用水量(V_d)= 62.37 M^3 及揚水管垂直長度(L)= 70.4 M 之計算方式，此部分於 114 年 11 月 6 日第一次建築能效研討會議已有研討，且差異不是在(V_d)及(L)，而是依據能效規範說明揚水口徑應符合 30 分鐘充滿一日用水量($0.1v_d/30 \times 60$ ；30 分鐘流量值之兩倍)，專管機電顧問也說明 114 年 12 月 9 日已電話回覆統包商。由於建築能效檢討為統包商之設計規劃責任，專管單位無權踰矩，請統包商儘速與設計機電技師確認揚水泵 PEB 值(涉及台北自來水事業處相關定)以利後續。

6、114 年 12 月 18 日第 185 次專技會議說明如后：

(A) 再次說明有關揚水泵 PEB 之 Q_c 計算方式，114 年 11 月 6 日第一次建築能效研討會議已有研討，且差異不是在(V_d)及(L)，而是依據能效規範說明揚水口徑應符合 30 分鐘充滿一日用水量($0.1v_d/30 \times 60$ ；30 分鐘流量值之兩倍)，專管機電顧問也說明 114 年 12 月 9 日已電話回覆統包商。由於建築能效檢討為統包商之設計規劃責任，專管單位無權踰矩，請統包商儘速與設計機電技師確認揚水泵 PEB 值(涉及台北自來水事業處相關定)以利後續。

(B) 統包商簡報 P46，方案 1~方案 3 經顧問審視內容皆尚屬合理，方案 02 得分不足 90 不考慮，對業主比較有利為方案 01，若統包團隊機電技師算出來的值與專管單位計算接近，基本上能取得建築能效 1+級，若考量分數接近門檻委員書審分數不足，建議可將電梯調整修正為永磁馬達搭配電能回收模組，增加保險的分數。會後於 Line 群組請統包商提供 IH 爐用電量計算，以利專管協助檢核相關電力容量。

7、114 年 12 月 24 日第 186 次專技會議說明如后(統包商簡報 P36~P61)：

(A) 於 114 年 12 月 4 日第 183 次專技會議，會議結論建議統包設計單位先將各類初步評估方案，函送專管單位審查，並審轉使用單位審查確認，以縮短內部陳核及確認時程部分，本週(12/24)統包商於會中回復，已持續與使用單位確認各方案內容，會後將再詢問提送方式，另請協助於下週專技會議回報。

(B) 本週(12/24)會議統包商於會中說明，有關建築能效釋疑已於 114 年 12 月 22 日以 E-mail 提供建築中心辦理後續，請統包團隊協助持續追蹤。

8、114 年 12 月 31 日第 187 次專技會議，統包設計單位說明各類初步評估方案，經詢問使用單位，係建議揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式認定，等建築中心確認後，再行發文提送。

9、115 年 1 月 8 日第 188 次專技會議說明如后：

(A) 統包商簡報 P41、P56，經檢視電梯能效評估部分，永磁馬達未搭配電能回收模組(電力回生裝置)，會中設計單位回覆，因分數差異不大，故未使用。專管單位仍建議電梯搭配電能回收模組(電力回生裝置)，以增加保險分數。

(B) 統包商簡報 P55~56，有關方案 4 揚水泵 PEB 值為 2.31 部分，正常標準以 1 為原則，後續若經建築中心釋疑回復以方案 4 方式做計算，將會請統包團隊釐清調整機電給水設備並檢討選用節能有效率的揚水泵。

(C) 有關揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式認定，請統包團隊持

續向建築中心追蹤。本次會議統包商說明機電技師計算揚水泵 PEB 值接近專管機電技師計算值約 0.6~0.7，並表達待建築中心回覆計算方式後，才能檢討其永磁馬達搭配電能回收模組(電力回生裝置)等檢討說明。再次提醒建築能效調整之項目後續恐影響施工單位材料設備發包作業執行，請統包團隊相互加緊速度。

- 10、115 年 1 月 29 日第 191 次專技會議，統包設計單位說明，本工程揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式認定釋疑部分，有納入建築中心 115 年 1 月 22 日內部會議討論，惟未取得結論，另建築中心建議發文予建研所協助確認，統包設計單位於 115 年 1 月 28 日以王師復興崗字第 1150128001 號函，函請建研所及建築中心惠復。
- 11、115 年 4 月 29 日第 203 次專技會議，建研所 115 年 4 月 28 日建研環字第 1157638324 號函指示，請設計單位依照該函指示進行相關作業辦理。
- 12、115 年 6 月 4 日第 208 次專技會議，會中指出建築能效涉及燈具、IH 設備、揚水泵、用電容量、線徑、管線位置、電盤及部分地下室管線配置，若未及早釐清，恐影響筏基、大底及後續地下室結構施工，請設計單位於下週專技會議機電技師到場，就建築能效評估、機電容量、管線路徑、線徑、電盤、揚水泵及是否影響地下室施工逐項說明，並提出需業主或統包商確認之事項。

7. 第二次變更設計暨新增需求作業(「新設圍牆校方側排水工程」及「建築能效」)：

- (1) 115 年 2 月 13 日專管單位以亞新(工管一)字第 1150008788 號函，審轉第二次變更設計「校方側(基地外側)排水計畫書圖文件(第一版 修訂 2 次)」。
- (2) 北工處 115 年 3 月 24 日備北工營字第 1150002388 號函催辦「建築能效」相關期程及圖說資料，俾與基地外側排水計畫併案辦理第二次變更設計暨新增需求作業。
- (3) 第 208 次專技會議，專管單位詢問統包商有關「新設圍牆校方

側排水工程」原經機關指示納入第二次設計變更辦理，惟仍應先行評估該項工程是否影響施工要徑，並確認是否有需先行施工之必要。統包商於會中回覆，本項排水工程原則上會影響新設圍牆、瓦斯管線及污水管線等相關施工界面；惟該排水係銜接至原設箱涵，對主體結構體施工原則上尚無重大影響。另考量現階段未先行辦理，後續再行施作水溝時，相關施工界面恐較為複雜，仍需就排水銜接、管線界面及施工順序再予釐清。鑑於機關已指示本項排水工程併入第二次設計變更一併討論，故後續俟第二次設計變更程序完成後，再行啟動相關作業。

- (4) 115/6/24 統包商以 115 宏工字第 1150003767 號函提送第二次變更設計基地外側排水計畫事宜，專管單位原則無附加意見，並已於 115 年 6 月 30 日以亞新（工管一）字第 1150036796 號函請機關核示。
- (5) 機關已於 115 年 7 月 15 日備北營字第 1150005962 號函文，請依照函文內容指示辦理。（專管監造單位於 115 年 7 月 20 日收文）
- (6) 115 年 7 月 24 日專管單位發函北工處，亞新（工管）字第 1150042978 號，請求同意針對第二次變更設計基地外側排水計畫與建築能效評估之拆案或併案辦理方式，將於 7/30 第 216 專技會議內討論，將於 8/7 前回覆機關指示。
- (7) 115 年 7 月 30 日第 216 次專技會議，針對「新設圍牆校方側（基地外側）排水工程」與建築能效評估採拆案或併案辦理進行討論。會中考量本項排水工程與新設圍牆、景觀及瓦斯管線之施工界面密切，原則朝納入本案第二次變更設計辦理方向研議；另請統包商補充提供圍牆、景觀及排水工程之工期及細部施工排程，供專管單位彙整後續函復機關。
- (8) 115 年 8 月 6 日第 217 次專技會議，專管單位於 115 年 7 月 24 日以亞新（工管）字第 1150042978 號函，申請將本案回覆期限展延至 115 年 8 月 7 日；惟為加速案件辦理，專管單位仍於展延期限屆至前，於 115 年 8 月 4 日以亞新（工管）字第 1150046353 號函完成函復。機關嗣於 115 年 8 月 5 日以備北工營字第 1150006762 號函，同意前述展延申請。專管單位於函復內容中說明，綜合考量整體排水功能、施工順序、工程界面、權責劃分及工期管控等因素，為避免後續拆除、復舊及重複施工，造

成公帑浪費，不宜將基地外側排水工程自本次變更設計排除而僅先行施作新設圍牆。爰建議將基地外側排水工程納入本案第二次變更設計先行辦理；建築能效相關變更項目則與基地外側排水工程分案辦理，俟候選證書及相關變更內容確認後，再依程序續辦。

- (9) 115 年 8 月 13 日第 218 次專技會議，專管單位說明，基地外側排水與建築能效分案辦理之相關資料已循程序陳報，後續俟機關核示；會中並就第二次變更設計推動情形進行討論，請統包團隊與機關持續溝通協調，以利加速後續變更設計作業。
- (10) 115 年 8 月 18 日第 219 次專技會議，專管單位說明，前述基地外側排水工程與建築能效分案辦理建議已循程序陳報機關，現階段仍俟機關核示。
- (11) 115 年 9 月 2 日第 221 次專技會議，會議就基地外側排水、景觀、新設圍牆、瓦斯管線及主體工程之施工界面進行討論。統包商說明，基地外側排水與新設圍牆、瓦斯管線及流出抑制設施銜接具有先後關係，如未儘早確認，恐增加後續拆除、復舊及施工界面處理。經會議討論，現階段統包商希望優先推動基地外側排水第二次變更設計的進行，建築能效及其他項目另案辦理；專管單位依機關審查意見修正相關分析資料，另請統包商補充排水、景觀、圍牆及瓦斯管線之施工順序、銜接節點與影響說明，作為機關審議及後續工期檢討參考；所涉經費及工期俟機關同意辦理變更設計後，再依契約程序議定。
- (12) 115 年 9 月 11 日第 222 次專技會議，專管監造單位希望統包商提出基地外側排水、新設圍牆、景觀及瓦斯管線之施工進度、工序與界面影響資料。統包商表示可提供其他資料說明施工順序及界面影響；雙方對資料呈現方式尚待協調；所涉工期及經費待成案後，再依契約程序檢討。
- (13) 115 年 9 月 17 日第 223 次專技會議，專管單位說明，機關於 115 年 9 月 9 日及 9 月 10 日共發出 3 份與第二次變更設計相關之函文，專管單位於 115 年 9 月 15 日收訖，機關並要求於 115 年 9 月 25 日前完成回覆。考量後續尚需辦理資料彙整、函稿簽核及適逢假日等因素，爰請統包商原則於 115 年 9 月 21 日前提供相關資料或正式回覆，以利專管監造單位彙整辦理。另會中指

出，前開函文所涉基地外側排水、景觀、新設圍牆、瓦斯管線及主體工程施工界面等議題，前兩次專技會議已進行討論，部分審查意見亦已先行提供統包商。經會議討論，請統包商依機關函文及專管意見，釐清各工項目前施工進度、施工界面、辦理順序及對施工要徑之影響，並依限提出具體說明及相關資料，供後續第二次變更設計檢討及函復機關辦理。

(14) 115 年 9 月 24 日第 224 次專技會議，有關第二次變更設計基地外側排水工程，統包商說明，已於 115 年 9 月 21 日以 115 宏工字第 1150005452 號函檢送相關資料予專管單位，並於會中表示，考量現階段施工進度，以及後續景觀、新設圍牆、瓦斯管線及主體工程等施工界面，基地外側排水工程與相關工項之施工順序及界面銜接密切相關，爰建議儘速啟動第二次變更設計程序。經會議討論，原則同意先行啟動第二次變更設計相關作業，至統包商所提工期調整部分，另依實際影響情形及相關佐證資料續予檢討。另機關說明，基地外側積水區及排水設施涉及原計畫範圍外之新增需求，相關程序仍須持續辦理。請專管單位依本次會議討論結果彙整相關資料，於 115 年 9 月 29 日前提供機關，俾利機關於 115 年 9 月 30 日辦理後續函文作業。

(15) 115 年 9 月 30 日第 225 次專技會議，專管單位說明，已依前次會議決議彙整相關資料，並於 115 年 9 月 29 日以亞新（工管）字第 1150058339 號函送北工處辦理。

8. 有關北投醫院借地期限至 114 年 12 月 31 日止，經北工處初步協調待通知後再行歸還，這段期間原則都可以使用，另統包商於 114 年 12 月 16 日以 114 宏工字第 1140008668 號函說明，俟收到通知後再行歸還北投醫院用地。115 年 8 月 28 日第 220 次專技會議，有關地面樓層混凝土澆置借道政戰學院校地事宜，統包商說明既有借道及隔離設施方案前已提送，且本工程與政戰學院無契約關係，仍須由機關協助協調。經會議討論，原則以北投分院工程上網公告作為預先準備節點，並以決標作為正式啟動借道及還地協調之節點，也請相關單位持續留意北投分院工程招標及決標進度，並於正式啟動前儘早與政戰學院確認借道動線、隔離設施及交通維持措施。（歷經第 176 次~225 專技會議，未完成）

9. 統包商簡報：

- A. 整體進度說明(P4)，依照 4 月 20 日北工處於 115 年 4 月 20 日依備北工營字第 1150003386 號核定施工網圖規劃。
- B. 歷次展延/不計工期管控表(P5~12)：累計免計 258 天、累計展延 205 天。
- C. 追加訴求(P13)：統包團隊先行整理追加金額及工期列表。
- D. 估驗計畫進度及施工進度表(P14)：預定進度 28.198%、實際進度 28.252%，超前 0.054%。
- E. 建管行政流程進度控管表(P15)：地下一樓勘驗暫訂 10 月 11 日，後續仍可能調整。
- F. 地下 1 樓版勘驗文件清單(P16)：目前相關資料除監造簽認資訊其餘已備妥。
- G. 三月及三周預定進度表(P18~19)：第三層支撐拆除作業已完成，現場正進行 B2F 柱牆相關作業。
- H. 施工進度說明(P21)：統計至 115 年 9 月 27 日，已用工期 1373 天，剩餘 487 日。B2F
- I. 施工進度說明(P21)：B2F 施工圖，A 棟-柱 90%、牆 10%；B 棟-柱 90%；C 棟-柱 100%；D 棟-柱 100%。
- J. 施工進度說明(P22)：B2F 柱牆放樣配管施工進度圖：放樣進度 40%、配管進度 40%。
- K. 安全觀測報告(P23~24)：統包商說明，截至 9 月 27 日附上 9/21 及 9/23 安全監測報告；各項監測數值與前監測數值相比無異常變動，均在安全範圍內。
- L. 現場施工照(P25)：第三層支撐拆除、B2F 柱續接器及 T 頭進場、B2F 柱牆鋼筋進場、B2F 柱鋼筋綁紮、B2F 柱鋼筋綁紮、B2F 柱鋼筋綁紮，截至 115 年 9 月 27 日。
- M. 外部稽查單位統計(P26)：稽查次數總計 267 次。
本月份外部單位稽查：9/1 環保局例行性稽查、9/3 勞檢例行性稽查、9/3 環保局例行性稽查、9/8 環保局例行性稽查、9/11 環保局稽查(施工噪音)、9/12 環保局例行性稽查、9/15 環保局例行性稽查、9/17 環保局例行性稽查、9/22 環保局例行性稽查、9/24 環保局例行性稽查、9/26 環保局例行性稽查、9/27 環保局例行性稽查。
- N. 送審材料文件管制表(建築)(P28~32)：目前皆在預定時間內

提送。

0. 送審材料文件管制表(機電)(P33~36)：目前皆在預定時間內提送。

二、北工處

1. 有關工程施工進度，機關關切地下室相關作業，請統包商持續加強進度管控，依核定施工網圖推動各項作業。
2. 有關第二次變更設計案，請專管單位提出優劣分析表，供後續審議參考。

三、統包廠商：

1. 有關細部設計報告書工期檢討澄復、細部設計各階段工期檢討，預計 115 年 6 月提出檢討資料，115 年 11 月完成計價作業，115 年 7 月 1 日 115 宏工字第 1150003877 號函送細部設計不可歸責乙方原因相關事宜，專管監造單位業於 115 年 7 月 8 日以亞新（工管）字第 1150038465 號函檢附審查意見函送機關，後續俟機關核示辦理。工營中心於 115 年 7 月 20 日以備工建規字第 1150009197 號函復有關細部設計不可歸責於乙方事由之審查事宜，並同意給予專管監造單位文到後 30 日作業時間。該函專管單位於 115 年 7 月 22 日收文，專管監造單位將依函示辦理；如自收文次日（115 年 7 月 23 日）起算，30 日期限至 115 年 8 月 21 日止。115 年 8 月 28 日第 220 次專技會議，專管單位說明，機關前以 115 年 7 月 20 日備工建規字第 1150009197 號函示應於 115 年 8 月 21 日前完成審查；專管單位已於 115 年 8 月 21 日函請機關同意將審查期限展延 30 日。115 年 9 月 1 日，工營中心以備工建規字第 1150011371 號函，同意將專管監造單位辦理前開不可歸責事由檢討之審查期限展延至 115 年 9 月 21 日。115 年 9 月 21 日專管單位已亞新（工管）字第 1150055010 號發函，敬請機關展延工作天 15 日。
2. 有關建築能效評估部分：
 - A. 115 年 5 月 14 日第 205 次專技會議，有關建築能效評估辦理進度一案，設計單位報告，依建研所 115 年 4 月 28 日建研環字第 1157638324 號函指示事項辦理，預計於 115 年 5 月 31 日前完成機電檢討及圖說調整作業，並提送修正資料供建築能效評估顧問檢討；另預計於 116 年 2 月 28 日取得候選證書。惟實際辦理時程仍可能依主管機關審查進度調整，前述時程僅供會議追

蹤管控。

- B. 115 年 6 月 25 日第 211 次專技會議，設計單位說明，建築能效相關作業主要分為基礎資料彙整及能效檢討兩階段。現階段原設計單位已將大部分基礎資料提供予建築能效顧問辦理計算，惟尚有部分承諾文件及費用作業程序待完成。後續俟顧問提出初步計算結果後，將依檢討結果辦理圖面調整、資料補充及相關內容確認。
- C. 115 年 7 月 2 日，第 212 次專技會議，設計單位說明目前建築能效作業已進入第二階段，辦理報告書撰寫、資料檢討及彙整作業，預計於 115 年 7 月底取得第一版評估資料；如受假日或作業影響，可能順延至 8 月初提供。
- D. 115 年 7 月 9 日第 213 次專技會議，設計單位說明，截至 115 年 7 月 8 日空調 外殼 皆完成，預計 115 年 7 月 31 日(五)完成一版，115 年 8 月 4 日(二)前提供群組 1 版並開始啟動申請業主用印作業(詳細進度與日期，詳簡報 P41)
- E. 115 年 7 月 16 日第 214 次專技會議，由設計單位林建築師語音遠端說明，目前建築能效進度，截至 115 年 7 月 8 日空調、外殼等皆完成，預計 115 年 7 月 31 日(五)完成一版，115 年 8 月 4 日(二)前提供群組 1 版並開始啟動申請業主用印作業(詳細進度與日期，詳簡報 P39)。
- F. 115 年 7 月 22 日第 215 次專技會議，設計單位說明，目前建築能效進度截至 115 年 7 月 19 日空調、外殼、熱水皆完成，整體進度 73.8% (其他進度：用印文件、爐台設備、地下停車場送排風機、電梯、揚水泵 50%、照明節能 90%)預計 115 年 7 月 31 日(五)完成一版，115 年 8 月 4 日(二)前提供群組 1 版並開始啟動申請業主用印作業(詳細進度與日期，詳簡報 P40)。
- G. 115 年 7 月 30 日第 216 次專技會議，設計單位說明，目前建築能效進度截至 115 年 7 月 29 日外殼、空調、照明、熱水、爐台、地下室停車場送排風機、電梯皆完成，整體進度 93.8% (其他進度：用印文件、揚水泵 50%)預計 115 年 7 月 31 日(五)完成一版，115 年 8 月 4 日(二)前提供群組 1 版並開始啟動申請業主用印作業(詳細進度與日期，詳簡報 P44)。
- H. 統包團隊於 115 年 8 月 3 日以 115 宏工字第 1150004555 號函，

檢送本工程候選建築能效評估申請所需之起造人用印文件。專管單位業於115年8月5日以亞新（工管）字第1150046022號函轉起造人，請其協助辦理用印。

- I. 115年8月13日第218次專技會議，設計單位說明，目前俟空軍完成建築能效申請文件用印，用印資料取得後即辦理掛件並進入正式審查程序；現階段整體作業尚在原規劃期程內。
- J. 115年8月18日第219次專技會議，機關說明，起造人於115年8月17日國空人庶字第1150192396號發函通知，已完成鈐印（專管監造單位於8月19日收文），後續由設計單位接續辦理掛件及審查作業。
- K. 115年8月28日第220次專技會議，設計單位說明，於115年8月19日取得起造人用印文件後即轉交建築能效顧問；因8月24日颱風南部停班，顧問於8月25日收到資料並於當日寄送掛件資料予建築中心。惟目前尚待確認建築中心實際收件及掛件情形，設計單位持續追蹤，並於下週專技會議明確說明掛件程序及審查進度。
- L. 115年9月2日第221次專技會議，設計單位說明，建築中心已確認收受紙本申請資料，惟尚待完成正式掛件收執並排入審查程序。主席考量以116年3月31日前取得候選證書為目標，整體辦理期程已較為緊迫，請設計單位主動向建築中心確認申請文件是否完整、有無須補正事項及正式掛件日期。設計單位表示，已持續主動追蹤掛件及缺件情形，惟建築中心內部尚有既定行政作業流程，仍須俟其正式書面通知；後續將持續追蹤辦理進度。
- M. 115年9月11日第222次專技會議，設計單位說明，於115年9月8日115宏工字第1150005238號發函通知專管單位，建築中心已於115年9月2日收受申請資料、9月8日通知繳納審查費新臺幣10萬1,000元及「發票抬頭確認文件」，前開審查費由設計單位先行墊付，後續再依程序向機關辦理請款。專管單位於115年9月11日亞新（工管）字第1150055188號發函請空軍辦理文件用印，並請於用印完成後逕交統包商接續辦理。俟完成繳費及文件補正後，始得正式掛件，俟完成繳費及補件後始得正式掛件；預估行政作業約需2週，可能至10月初

進入審查，考量後續審查約需 4 個月，116 年 3 月 31 日前取得候選證書已有期程風險。另目前能效估算 92.59 分，已達 1+ 級，後續將以提升瓦斯熱水器能效、調整電梯系統及增設電力回生裝置補足分數，相關變更費用尚待確認。

- N. 115 年 9 月 17 日第 223 次專技會議，設計單位說明，有關建築能效評估辦理進度，已於 115 年 9 月 14 日完成繳費作業；另空軍司令部人事軍務處已於 115 年 9 月 14 日以國空人庶字第 1150216081 號函辦理相關用印事項。俟用印文件完成後，續由設計單位提送財團法人台灣建築中心辦理正式掛件程序，續予列管。
 - O. 115 年 9 月 24 日第 224 次專技會議，設計單位說明，有關建築能效評估辦理進度，空軍端用印完成後，資料於 9 月 21 日上傳；9 月 23 日建築中心已有初步審查意見。
 - P. 115 年 9 月 30 日第 225 次專技會議，設計單位說明，有關建築能效評估辦理進度，預計於 115 年 10 月 2 日（五）前依建築中心意見完成修正並重新提送。
- 1. 第 2 次建照報備：
 - A. 115 年 6 月 4 日第 208 次專技會議，就專管單位說明辦理圖說釋疑及相關程序釐清。設計單位於會中說明，本項係因 B 棟 1 樓排煙窗及天花板高度等內容，於第二次報備變更送審過程中配合消防審查意見辦理調整，致部分內容與原細設圖說不符；惟相關調整內容已納入第二次報備變更圖說、差異表及附件資料彙整。統包商考量現場施工期程及後續施作依據，請設計單位儘速釐清本項應以圖說釋疑、設計事宜或併同第二次報備變更方式辦理。
 - 2. 有關瓦斯管線遷移事宜，本公司自第 212 次專技會議起持續詢問辦理進度，並說明相關施工方式及費用代墊、歸墊程序，仍須由機關以正式函文確認，俾利本公司辦理內部程序及後續作業。於 115 年 8 月 7 日第 217 次專技會議中，機關表示將另函通知本公司配合辦理；本公司後續將俟機關函文送達後，依函示內容及契約程序續辦，115 年 8 月 13 日第 218 次專技會議就後續辦理方式再行討論，因相關執行方式尚待與機關協調確認，本公司後續仍將依機關正式函文及契約程序辦理。

3. 115 年 9 月 17 日第 223 次專技會議，統包商就鼠類防治作業提出相關意見及契約變更需求，統包商表示，待結構體完成後，將依實際需求及執行內容正式提出相關費用依據。
4. 目前地下層結構工程作業，現場進行 B2F 柱牆鋼筋綁紮作業，整體施工進度尚在預定節點控制內。

四、臨時動議(P40)：

1. 屋頂水箱排水：統包商說明，原設計採 6 吋排水管穿越頂樓住宅餐廳並接入管道間，現場檢討有管道間淨空不足及室內明管等施工疑義，爰建議調整排水方式，會中針對管道間淨空不足、屋頂明管配置及統包需求書所定「直接排水」原則進行討論，並就管線局部轉向後再行排放之方式是否仍符合需求書規定交換意見。另考量後續使用及維護需求，相關方案仍須確認使用單位之接受程度；本案尚未形成定案，後續由機關再與監造及相關單位研議確認辦理方式。

貳、會議結論：

- 一、細部設計各階段逾期不可歸責之檢討(自第 101 次~225 次專技會議，未完成)：114 年 5 月 22 日經與機關及統包商研討確認，納入計價請款時之設計工期檢討，統包商說明預計第二期設計費後辦理。工營中心 114 年 11 月 26 日已完成第二期設計費計價。
 1. 統包商 115 年 7 月 1 日 115 宏工字第 1150003877 號函送細部設計不可歸責乙方原因相關事宜。
 2. 專管監造單位業於 115 年 7 月 8 日以亞新（工管）字第 1150038465 號函檢附審查意見函送機關，後續俟機關核示辦理。
 3. 機關於 115 年 7 月 20 日備工建規字第 1150009197 號函覆審查意見請專管監造單位續辦中。
 4. 專管單位已於 115 年 8 月 21 日亞新（工管）字第 1150050877 號函請機關同意將審查期限展延 30 日。
 5. 工營中心 115 年 9 月 1 日以備工建規字第 1150011371 號函，同意將專管監造單位辦理前開不可歸責事由檢討之審查期限展延至 115 年 9 月 21 日。
 6. 115 年 9 月 21 日專管單位已亞新（工管）字第 1150055010 號發函，敬請機關展延工作天 15 日。（本項次持續列管）
 7. 細部設計報告書(含工期檢討)：114 年 8 月 28 日工營中心說明針對專

管所提送逾期檢討，倘有不可歸責乙方原因，請統包商提出澄復意見及相關佐證資料儘速函送專管及本中心審認。統包商 115 年 7 月 1 日 115 宏工字第 1150003877 號函送細部設計不可歸責乙方原因相關事宜，專管監造單位業於 115 年 7 月 8 日以亞新（工管）字第 1150038465 號函檢附審查意見函送機關。（本項次併前項管制）

二、建照第 2 次報備圖說與原核准細設圖差異：專管單位於 115 年 5 月 12 日以亞新（工管一）字第 1150025040 號函文機關，同意廠商以設計釋疑辦理。115 年 6 月 4 日第 208 次專技會議，專管單位請統包商儘速辦理圖說釋疑。設計單位說明，本項主要係因 B 棟 1 樓排煙窗及天花板高度等內容，於第二次報備變更送審過程中配合消防審查意見辦理調整，致部分內容與原細設圖說不符。另第二次報備變更相關圖說、差異表及附件資料均已完成彙整，經會議討論，本項原則併入第二次建照變更一併辦理；惟如現場施工時程不及，得先以圖說釋疑或設計釋疑方式先行釐清，後續再併同第二次建照變更程序辦理。專管提醒倘涉及建築法第 39 條變更設計要件，應先行辦理變更設計程序後再行施工，請避免先行施工情事再發生。（本項次持續列管）

三、第 1 次五大管線變更設計：（本項次持續列管）

1. 五大管線審查進度：115 年 7 月 30 日第 216 次專技會議，設計單位報告。
 - (1)消防局轉消防大隊於 7 月 2 日審圖，臺北市政府消防局於 115 年 7 月 3 日發函重新檢討，7 月 17 日修正後送審，7 月 21 日進入審查階段，於 7 月 29 日收到核准函。
 - (2)給水於 115 年 3 月 19 日掛件、6 月 10 日清圖階段、6 月 16 日核准。
 - (3)電力於 115 年 4 月 10 日掛件、6 月 10 日清圖階段、7 月 14 日製作副本、7 月 15 日取得核准。
 - (4)電信於 115 年 3 月 23 日掛件、5 月 21 日取得核准。
2. 115 年 8 月 6 日第 217 次專技會議，設計單位說明統包團隊於 115 年 8 月 3 日以 115 宏工字第 1150004554 號函，檢送本工程經各權責機關審查核定之五大管線第一次設計變更核准圖說資料；專管單位已於 115 年 8 月 5 日函轉工營中心備查。
3. 115 年 8 月 13 日第 218 次專技會議，就五管變更與核定的細設圖進行差異比較，經會議討論，為利後續變更設計及圖說調整有所依據，原則仍請統包設計單位正式函文提送，後續依程序辦理。

4. 115 年 8 月 18 日第 219 次專技會議，統包團隊前於 115 年 8 月 3 日以 115 宏工字第 1150004554 號函提送五大管線第一次設計變更核准圖說資料，專管單位並於 115 年 8 月 5 日函轉工營中心辦理；另依前次會議結論，統包團隊已就五管第一次變更核准圖說與核定細部設計圖說辦理差異比較，並於 115 年 8 月 17 日以 115 宏工字第 1150004815 號函正式提送相關資料，後續由專管單位依程序辦理審查。
5. 115 年 8 月 28 日第 220 次專技會議，專管單位說明，已於 115 年 8 月 25 日以亞新（工管）字第 1150049670 號函陳報機關，建請機關同意將本案納入後續變更設計程序辦理。
6. 115 年 9 月 2 日第 221 次專技會議，有關五管消防變更後 B、C 棟公共空間防煙垂壁替代方案，設計單位說明消防變更的部分，B 棟 1 樓公共空間門上方皆有 50CM 以上的不燃材，C 棟 1 樓無障礙廁所、男廁、女廁及茶水間天花高度由 240 公分調整為 270 公分之內容，以設計釋疑程序確認，並於竣工前完成相關圖說報備。
7. 115 年 9 月 17 日（專管 9/18 收文），北工處發函備北工營字第 1150007909 號，請專管單位配合五大管線第一次變更設計核准，檢附業管機關核准證明，並依契約規定完成設計疏責、同等品及工期增減等相關檢討後再行提送，俾利本處憑辦。115 年 9 月 23 日，專管單位發函回覆北工處發函備北工營字第 1150007909 號，建請機關以第 220 次專業技術協調會議說明，將本案納入後續變更設計程序辦理（**本項次持續列管**）

四、流出抑制計畫與施工作業期程影響（歷經第 164 次~225 次專技會議，未完成）：114 年 9 月 4 日第 170 次專技會議，統包商說明排水滯洪規劃之滯洪量依臺北市政府工務局水利工程處核定之流出抑制設施排水計畫辦理，無須辦理變更。114 年 10 月 2 日第 174 次專技會議，經水利技師及工地確認後流出抑制須辦理變更設計，變更時程最遲需於使照請領前 6 個月辦理相關作業。（**本項次持續列管**）

五、建築能效評估（歷經第 163 次~225 次專技會議，未完成）：臺北市政府都市發展局於 114 年 7 月 14 日北市都授建字第 1143048016 號函已說明本工程建築能效應達第 1+ 級。工營中心 114 年 7 月 28 日備工建管字第 1140010618 號函說明四略以「另針對建築能效評估乙案，…釐清本案後續適用規定、原核定細設內容須配合調整項目、是否涉及其他契約變更等初步檢討，於 114 年 8 月 8 日前提送本中心，……」。

1. 有關建築能效初步評估展延部分(本項次持續列管)

- (1) 工營中心於114年8月18日函同意展延至114年8月25日。
- (2) 114年9月4日第170次專技會議設計單位說明展延至114年9月18日。
- (3) 114年9月18日第172次專技會議統包團隊說明需再展延至114年10月9日提出初步評估資料，專管單位提醒，統包團隊欲展延日期在不影響現場工進前提下無意見，建築能效初步評估若因統包團隊持續延宕，進而影響材料設備發包作業執行或現場工進，仍屬統包團隊責任。
- (4) 114年10月9日第175次專技會議工營中心要求114年10月底前提出確定方案予工營中心。
- (5) 統包團隊未依據第175、177次專技會議結論調整合宜方案，致無法於第178次專技會議提出方案予使用單位在會議中討論，無法依工營中心要求於114年10月31日前提出確定方案，需再展延日期請統包商於下週專技會議回報。114年11月13日第180次專技會議，統包設計單位於會議中說明，114年11月6日協同專管相關顧問召開建築能效討論會議之意見尚未調整完妥，預計於114年11月27日專技會議提出方案討論，並預定114年12月5日前提出初步評估資料。
- (6) 114年11月27日第182次專技會議，因揚水泵PEB之Qc計算方式認定問題，統包設計單位諮詢建築中心，目前建築中心討論中，初步評估資料恐無法於114年12月5日提出。114年12月4日第183次專技會議，統包設計單位回復因揚水泵PEB之Qc計算方式認定問題尚未確認，初步評估資料需再展延至114年12月31日提出。
- (7) 114年12月31日第187次專技會議，統包商設計單位於114年12月22日以E-mail提供建築中心辦理後續，本日(12/31)會中統包設計單位說明，因揚水泵PEB之Qc計算方式認定，尚未收到建築中心確認資訊，故初步評估資料預計需再展延至115年1月31日提出。
- (8) 115年1月29日第191次專技會議，統包設計單位說明，經電話聯繫建築中心承辦，本案有納入115年1月22日內部會議討論，惟未取得結論，另建築中心建議發文予建研所協助確認，統包設計單位已於115年1月28日發文，持續因揚水泵PEB之Qc計算方式認定，尚未收到建築中心確認資訊，故初步評估資料預計需再展延至

115 年 2 月 28 日提出。

- (9) 115 年 2 月 26 日第 194 次專技會議，統包設計單位已於 115 年 1 月 28 日發文予建築中心、建研所協助確認，持續因揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式認定，尚未收到建築中心確認資訊，故初步評估資料預計需再展延至 115 年 3 月 31 日提出。
- (10) 115 年 3 月 25 日第 198 次專技會議，有關建築能效釋疑申請，持續因揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式認定，尚未收到建築中心、建研所確認資訊，故初步評估資料預計需再展延至 115 年 4 月 30 日提出。
- (11) 115 年 4 月 29 日第 203 次專技會議，建研所 115 年 4 月 28 日建研環字第 1157638324 號函指示 PEB 之 Qc 計算方式，設計單位將依該函指示進行相關作業，會盡快提供預定完成日期在專技會議說明。
- (12) 115 年 5 月 7 日第 204 次專技會議，設計單位說明預計 115 年 8 月中完成。惟專管監造單位於會議中表示，若評估完成時程落於 8 月中，恐壓縮統包商後續現場設備相關作業期程，爰設計單位回應，將於下週第 205 次專技會議前 09:30 由機電技師到場說明，並進一步釐清建築能效評估後續辦理期程及相關配合作業。
- (13) 115 年 5 月 14 日第 205 次專技會議，設計單位報告預計於 115 年 5 月 31 日前完成機電檢討及圖說調整作業，並提送修正資料供建築能效評估顧問檢討；另預計於 116 年 2 月 28 日取得候選證書。惟實際辦理時程仍可能依主管機關審查進度調整，前述時程僅供會議追蹤管控。
- (14) 115 年 6 月 10 日第 209 次專技會議，設計單位回報建築能效依照 P43、44 頁進度，盡量於七月底八月初前確認，是否影響結構施工，第 210 次專技會議持續追蹤進度。
- (15) 115 年 6 月 25 日，第 211 次專技會議，機關詢問建築能效目前實際辦理進度，並表示先前所提出之期程為 7 月底至 8 月初完成相關圖說及資料整合，惟目前每週會議紀錄僅記載「持續檢討」或「設計單位辦理中」，無法掌握各項工作之實際完成程度，亦無法確認原訂期程是否可能延誤。
- (16) 115 年 7 月 2 日，第 212 次專技會議，設計單位說明預計於 115 年 7 月底取得第一版評估資料；如受假日或作業影響，可能順延至 8 月初提供。
- (17) 115 年 7 月 2 日第 212 次專技會議，為釐清機關對整體辦理期程之

疑慮，請設計單位儘量協調建築能效顧問或相關技師，於 115 年 7 月 16 日前之專技會議到會或以線上方式說明 目前辦理進度、後續作業及預定完成期程。

- (18) 115 年 7 月 16 日第 214 次專技會議，設計單位林建築師語音遠端說明，截至 115 年 7 月 8 日空調、外殼等皆完成，預計 115 年 7 月 31 日(五)完成一版，115 年 8 月 4 日(二)前提供群組 1 版並開始啟動申請業主用印作業(詳細進度與日期，詳簡報 P39)。
- (19) 統包團隊於 115 年 8 月 3 日以 115 宏工字第 1150004555 號函檢送本工程候選建築能效評估申請所需之起造人用印文件。專管單位業於 115 年 8 月 5 日以亞新(工管)字第 1150046022 號函轉起造人，請其協助辦理用印。起造人於 115 年 8 月 17 日國空人庶字第 1150192396 號發函通知，已完成鈐印(專管監造單位於 8 月 19 日收文)，後續由設計單位接續辦理掛件及審查作業。115 年 8 月 19 日取得起造人用印文件後即轉交建築能效顧問；因 8 月 24 日颱風南部停班，顧問於 8 月 25 日收到資料並於當日寄送掛件資料予建築中心。
- (20) 115 年 9 月 2 日第 221 次專技會議，設計單位說明，建築中心已確認收受紙本申請資料，惟尚待完成正式掛件收執並排入審查程序。主席考量以 116 年 3 月 31 日前取得候選證書為目標，整體辦理期程已較為緊迫，請設計單位主動向建築中心確認申請文件是否完整、有無須補正事項及正式掛件日期。設計單位表示，已持續主動追蹤掛件及缺件情形，惟建築中心內部尚有既定行政作業流程，仍須俟其正式書面通知；後續將持續追蹤辦理進度。
- (21) 115 年 9 月 11 日第 222 次專技會議，設計單位說明，於 115 年 9 月 8 日 115 宏工字第 1150005238 號發函通知專管單位，建築中心已於 115 年 9 月 2 日收受申請資料、9 月 8 日通知繳納審查費新臺幣 10 萬 1,000 元及「發票抬頭確認文件」，前開審查費由設計單位先行墊付，後續再依程序向機關辦理請款。專管單位於 115 年 9 月 11 日亞新(工管)字第 1150055188 號發函請空軍辦理文件用印，並請於用印完成後逕交統包商接續辦理。俟完成繳費及文件補正後，始得正式掛件，俟完成繳費及補件後始得正式掛件；預估行政作業約需 2 週，可能至 10 月初進入審查，考量後續審查約需 4 個月，116 年 3 月 31 日前取得候選證書已有期程風險。另目前能效估算

92.59 分，已達 1+級，後續將以提升瓦斯熱水器能效、調整電梯系統及增設電力回生裝置補足分數，相關變更費用尚待確認。

(22)115 年 9 月 17 日第 223 次專技會議，設計單位說明，有關建築能效評估辦理進度，已於 115 年 9 月 14 日完成繳費作業；另空軍司令部人事軍務處已於 115 年 9 月 14 日以國空人庶字第 1150216081 號函辦理相關用印事項。俟用印文件完成後，續由設計單位提送財團法人台灣建築中心辦理正式掛件程序，續予列管。

(23)115 年 9 月 24 日第 224 次專技會議，設計單位說明，有關建築能效評估辦理進度，空軍端用印完成後，資料於 9 月 21 日上傳；9 月 23 日建築中心已有初步審查意見。

(24)115 年 9 月 30 日第 225 次專技會議，設計單位說明，有關建築能效評估辦理進度，預計於 115 年 10 月 2 日（五）前依建築中心意見完成修正並重新提送。

2. 有關建築能效設備調整部分，如瓦斯爐調整為 IH 爐，恐影響結構體施作期間之配管配線或設備採購作業等，請統包團隊釐清，因應需取得建築能效 1+級，所變更的相關設備，現場須先行配合預埋各類管線設施項目。
3. 建築能效申請是否涉及建管勘驗時程：請以「一樓版勘驗前」取得候選證書為目標，避免因送審作業延誤影響後續工程執行。統包商團隊於第 178 次專技會議中明確說明候選綠建築證書已取得，雖未取得建築能效(1+級)，**確認不會影響一樓版勘驗**；專管單位、工營中心及北工處於會議中一再提醒倘若因此而耽誤工程進度，因屬統包商責任將無法展延(或免計)工期。114 年 11 月 6 日第 179 次專技會議，**專管單位提醒「建築能效標示」雖未影響建管勘驗，但仍可能涉及現場設備及其配管配線之位置，請統包廠商應預估材料設備採購之作業時間，推估「建築能效標示」應取得之時間，避免後續細設變更而影響工進。**

六、第二次變更設計暨新增需求作業(「新設圍牆校方側排水工程」及「建築能效」)：(本項次持續列管)

1. 北工處 115 年 3 月 24 日備北工營字第 1150002388 號函催辦「建築能效」相關期程及圖說資料，俾與基地外側排水計畫併案辦理第二次變更設計暨新增需求作業。
2. 115 年 6 月 4 日第 208 次專技會議，請統包廠商評估「新設圍牆校方側

排水工程」是否影響要徑需要先行施工？統包商於會中回覆，本項排水工程原則上會影響新設圍牆、瓦斯管線及污水管線等相關施工界面；惟該排水係銜接至原設箱涵，對主體結構體施工原則上尚無重大影響。另考量若現階段未先行辦理，後續再行施作水溝時，相關施工界面恐較為複雜，仍需就排水銜接、管線界面及施工順序再予釐清。鑑於機關已指示本項排水工程併入第二次設計變更一併討論，故後續俟第二次設計變更程序完成後，再行啟動相關作業。

3. 115/6/24 統包商以 115 宏工字第 1150003767 號函提送第二次變更設計基地外側排水計畫事宜，專管單位原則無附加意見，並已於 115 年 6 月 30 日以亞新（工管一）字第 1150036796 號函請機關核示。
4. 機關已於 115 年 7 月 15 日備北營字第 1150005962 號函文，請依照函文內容指示辦理。（專管監造單位於 115 年 7 月 20 日收文）
5. 115 年 7 月 30 日第 216 次專技會議，針對「新設圍牆校方側（基地外側）排水工程」與建築能效評估採拆案或併案辦理進行討論。會中考量本項排水工程與新設圍牆、景觀及瓦斯管線之施工界面密切，原則朝納入本案第二次變更設計辦理方向研議；另請統包商補充提供圍牆、景觀及排水工程之工期及細部施工排程，供專管單位彙整後續函復機關。
6. 115 年 8 月 6 日第 217 次專技會議，專管單位於 115 年 7 月 24 日以亞新（工管）字第 1150042978 號函，申請將本案回覆期限展延至 115 年 8 月 7 日；惟為加速案件辦理，專管單位仍於展延期限屆至前，於 115 年 8 月 4 日以亞新（工管）字第 1150046353 號函完成函復。機關嗣於 115 年 8 月 5 日以備北工營字第 1150006762 號函，同意前述展延申請。專管單位於函復內容中說明，綜合考量整體排水功能、施工順序、工程界面、權責劃分及工期管控等因素，為避免後續拆除、復舊及重複施工，造成公帑浪費，不宜將基地外側排水工程自本次變更設計排除而僅先行施作新設圍牆。爰建議將基地外側排水工程納入本案第二次變更設計先行辦理；建築能效相關變更項目則與基地外側排水工程分案辦理，俟候選證書及相關變更內容確認後，再依程序續辦。
7. 115 年 8 月 13 日第 218 次專技會議，專管單位說明，基地外側排水與建築能效分案辦理之相關資料已循程序陳報，後續俟機關核示。
8. 115 年 9 月 2 日第 221 次專技會議，會議就基地外側排水、景觀、新設圍牆、瓦斯管線及主體工程之施工界面進行討論。統包商說明，基地

外側排水與新設圍牆、瓦斯管線及流出抑制設施銜接具有先後關係，如未儘早確認，恐增加後續拆除、復舊及施工界面處理。經會議討論，現階段統包商希望優先推動基地外側排水第二次變更設計的進行，建築能效及其他項目另案辦理；機關及專管單位則要求統包商提出更明確的施工順序、銜接節點及影響說明，不能僅以口頭表示會影響工期，須有具體資料供機關，作為機關審議及後續工期檢討參考；所涉經費及工期俟機關同意辦理變更設計後，再依契約程序議定。

9. 115 年 9 月 11 日第 222 次專技會議，專管監造單位希望統包商提出基地外側排水、新設圍牆、景觀及瓦斯管線之施工進度、工序與界面影響資料。統包商表示可提供其他資料說明施工順序及界面影響；雙方對資料呈現方式尚待協調；所涉工期及經費待成案後，再依約檢討。
10. 115 年 9 月 17 日第 223 次專技會議，有關第二次變更設計，本機關已於 115 年 9 月 9 日及 9 月 10 日分別函請專管監造單位辦理相關事項，並要求於 115 年 9 月 25 日前完成回覆。考量專管單位尚需辦理資料彙整、函稿簽核及適逢假日等因素，請統包商原則於 115 年 9 月 21 日前完成相關資料整理及正式回覆，以利專管單位依限彙整函復。前開議題於前兩次專技會議均已有討論，部分審查意見亦已先行提供統包商，請統包商依相關意見及期限儘速辦理，避免影響後續第二次變更設計作業。
11. 115 年 9 月 24 日第 224 次專技會議，有關第二次變更設計基地外側排水工程，統包商說明，已於 115 年 9 月 21 日以 115 宏工字第 1150005452 號函檢送相關資料予專管單位，並於會中表示，考量現階段施工進度，以及後續景觀、新設圍牆、瓦斯管線及主體工程等施工界面，基地外側排水工程與相關工項之施工順序及界面銜接密切相關，爰建議儘速啟動第二次變更設計程序。經會議討論，原則同意先行啟動第二次變更設計相關作業，至統包商所提工期調整部分，另依實際影響情形及相關佐證資料續予檢討。另機關說明，基地外側積水區及排水設施涉及原計畫範圍外之新增需求，相關程序仍須持續辦理。請專管單位依本次會議討論結果彙整相關資料，於 115 年 9 月 29 日前提供機關，俾利機關於 115 年 9 月 30 日辦理後續函文作業。
12. 115 年 9 月 30 日第 225 次專技會議，專管單位說明，已依前次會議決議彙整相關資料，並於 115 年 9 月 29 日以亞新（工管）字第 1150058339 號函送北工處辦理。

- 七、有關北投醫院借地期限至 114 年 12 月 31 日止，因北投醫院借地期程掌握不確定，經北工處初步協調，待通知後再行歸還，這段期間原則都可以使用。另統包商於 114 年 12 月 16 日以 114 宏工字第 1140008668 號函說明，俟收到通知後再行歸還北投醫院用地。115 年 8 月 28 日第 220 次專技會議，有關地面樓層混凝土澆置借道政戰學院校地事宜，統包商說明既有借道及隔離設施方案前已提送，且本工程與政戰學院無契約關係，仍須由機關協助協調。經會議討論，原則以北投分院工程上網公告作為預先準備節點，並以決標作為正式啟動借道及還地協調之節點，也請相關單位持續留意北投分院工程招標及決標進度，並於正式啟動前儘早與政戰學院確認借道動線、隔離設施及交通維持措施。(歷經第 176 次~225 次專技會議，未完成)。(本項次持續列管)
- 八、 114 年 11 月 27 日第 182 次專技會議，統包商簡報 P37，有關本工程與北投醫院界面高程，減作擋土牆不可行原因，經統包商依專業立場提供高程降挖之優劣分析，恐影響流出抑制變更、五大管線變更、建照變更或報備、已核定之細部設計變更設計等，影響層面過多，且不利本案後續工進，不建議辦理調整，請統包商發文提送專管監造單位，以利機關函轉北投分院憑辦；114 年 12 月 4 日第 183 次專技會議，北工處說明已將上週(114 年 11 月 27 日)專技會議紀錄結論提供北投醫院承辦供參。統包商於 114 年 12 月 16 日以 114 宏工字第 1140008668 號函，檢送與北投分院工程界面調整高程(減作擋土牆)優劣分析資料，專管單位於 114 年 12 月 19 日以亞新(工管一)字第 1140074315 號函，審轉機關核示。(本項次持續列管)
- 九、 有關瓦斯改管部分：
1. 115 年 6 月 17 日第 210 次專技會議，有關瓦斯管線相關事宜，瓦斯公司提供 115 年 6 月 22 日至 26 日之可配合時段，機關原則上於 6 月 23 日至 25 日期間均可配合參與出席，會後確認已訂 115/06/25 上午 9：30 相關單位(機關、專管監造及統包商)往訪瓦斯公司。
 2. 115 年 6 月 25 日第 211 次專技會議，有關瓦斯管線遷移事宜，經會議討論，遷移工程與後續瓦斯表裝設費用原則分案辦理；考量瓦斯公司須先行繳費始得派工，而機關須於工程完成查驗後始能付款，請統包商就先行代墊遷移費用之可行性提請公司內部研議。
 3. 115 年 7 月 9 日第 213 次專技會議，有關瓦斯管線遷移費用代墊須由機關發文指示一節，機關承辦表示刻正辦理相關發文作業，後續俟機關

函文送達後，請統包商依函示內容及契約程序續辦。（本項次持續列管）

4. 115 年 8 月 6 日第 217 次專技會議，有關瓦斯管線遷移事宜，自 115 年 6 月 17 日第 210 次專技會議起研議，並於同年 6 月 25 日邀集專管監造單位及統包商共同往訪瓦斯公司研商。嗣於第 211 次專技會議，考量瓦斯公司須完成繳費後始得派工，而本處須俟遷移工程完成並經查驗確認後始得辦理付款，爰請統包商研議先行代墊費用之可行性，並於第 212 次至第 216 次專技會議持續列管。經本次會議確認，前開遷移費用得依統包契約規費相關規定辦理；為避免影響後續工程進度，請統包商先行代墊，俟工程完成並經查驗確認後，檢附瓦斯公司繳費通知、付款證明、完工及查驗資料等文件，依契約程序函報本處審核歸墊。本項結論納入本次會議紀錄，並由本處另函通知統包商辦理。
5. 115 年 8 月 13 日第 218 次專技會議，有關瓦斯管線遷移費用及後續辦理方式，因統包商與機關仍有需協調確認事項，後續依正式函文及契約程序辦理。
6. 115 年 8 月 18 日第 219 次專技會議，有關瓦斯管線於本日 14:00 招集相關單位進行現場會勘，過程詳有關瓦斯管線現場會勘紀錄。
7. 115 年 8 月 21 日北工處以備北工營字第 1150007635 號發函會勘紀錄給相關單位。
- 十、 115 年 9 月 17 日第 223 次專技會議，有關結構體模板工法調整附約草案：統包商說明，有關專管單位所提審查意見，除第三、四項尚有疑義外，其餘項次將依意見辦理回覆。經會議討論，第三項所涉假設工程、鋼筋實作數量、支撐及機電等相關項目，如前述已有釋疑單、函文或相關備查資料，請統包商於審查意見回覆中敘明辦理依據及納入原因；第四項新增單價部分，原則就系統模板及隔熱塗料等新增項目補充三家報價或相關價格佐證資料。請統包商依本次會議討論結果儘速完成審查意見回覆，以利後續附約審查作業。
- 十一、有關泵浦類材料送審日期，與建築能效揚水泵未確認相關，請統包商再行檢討預定送審日期合理性。統包商於 115 年 3 月 25 日第 198 次專技會議說明，送審文件(材料)管制表，後續將俟北工處核定預定進度網圖後，再依最新網圖調整預訂送審時程，115 年 4 月 20 日機關北工處於 115 年 4 月 20 日依備北工營字第 1150003386 號函，核定施工網圖。（本項次持續列管）

- 十二、有關屋頂水箱排水：統包商說明，原設計採6吋排水管穿越頂樓住宅餐廳並接入管道間，現場檢討有管道間淨空不足及室內明管等施工疑義，爰建議調整排水方式。設計單位說明統包需求書規定水箱應採間接排水並以直接配管排入雨水回收池，會議中請統包設計單位會同使用單位及原規劃設計人員確認需求，檢討改採公共空間或其他直接配管路徑之可行性，並以設計事宜程序辦理。
- 十三、統包商簡報 P54~P64 每週會議結論追蹤事項辦況，請統包商確實依據會議結論填寫符合之辦況說明；另欲解列事項務必詳實說明及提供佐證資料，會議記錄結論標註「本項次持續列管」，才須納入追蹤事項。
- 十四、有關統包商提及辦理變更追加減調整流用程序及範例、選色選樣陳核範例，北工處確認後回復。
- 十五、目前地下層結構 B2F 柱牆鋼筋綁紮作業。
- 附件一、會議簽到表。
- 附件二、待辦事項追蹤表。
- 附件三、專管團隊簡報資料。
- 附件四、統包廠商簡報資料。
- 附件五、設計建築師、專案經理請假單。

參、會議結束及下週會議時間：

一、散會：9月30日上午10時00分。

二、下次會議時間地點：

1. 會議時間：10月08日上09時30分。
2. 會議地點：工地1樓會議室
3. 會議時間及地點如有異動將於 LINE 大群通知。

復興崗營區職務宿舍新建工程專案管及監造委託技術服務案

「復興崗營區職務宿舍新建統包工程」

第 225 次專業技術協調會議簽到表

壹、時間：中華民國 115 年 9 月 30 日(星期三)上午 09 時 30 分

貳、地點：工地 1 樓會議室

參、出(列)席人員：

單位	級職	簽名	級職	簽名
國防部 空軍司令部				
國防部軍備局 工程營產中心				
營產中心北部地 區工程營產處		許富哲		
專案管理團隊 亞新工程顧問股 份有限公司/ 王正源建築師事 務所		周宗仁		
		王正源		
		蔣孟儒		
統包團隊 宏昇營造股份有 限公司/ 王騰建築師事務 所		戴祥榮代		
		黃銘雄		鄭永亭
		黃雅婷		

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
1-5	第 126 次專業技術協調會	細部設計報告書(含工期檢討)					▣ 113/9/19 統包商 113 宏工字第 1130005538 號檢送細部設計報告書(第一版)事宜。 ▣ 113/10/08 專管單位以 1131008 亞新(工管一)字第 1130049496 號函審退細部設計報告書(第一版)。 ▣ 113/10/16 工營中心以備工建規字第 1130015907 號函說明係報設計報告書相關事宜。 ▣ 113/10/22 統包商以 113 宏工字第 1130006266 號函檢送細部設計報告書(第一版，修訂 1 次)，未見付附件紙本及電子檔。 ▣ 113/10/23 統包商以 113 宏工字第 1130006284 號函重新檢送細部設計報告書(第一版，修訂 1 次)。 ▣ 113/10/30 統包商以 113 宏工字第 1130006458 號函復關於「細部設計報告書」提送期程是否逾期及申請細部設計作業免計工期等相關事 ▣ 113/11/12 專管單位以亞新(工管一)字第 1130056191 號函，審退統包商檢送細部設計報告書(第一版)。 ▣ 113/11/26 統包商 113 宏工字第 1130007131 號函轉統包團隊設計單位所提送本案細部設計報告書(第一版，修訂 2 次)。 ▣ 113/12/16 亞新(工管一)字第 1130063087 號函有關統包商檢送細部設計報告書(第一版修訂 1 次)相關事宜。 ▣ 113/12/24 工營中心以備工建規字第 1130020314 號函，說明暫停細設報告書提	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							送，俟全案細部設計核定後，另案通知細部設計報告書提送審查。 ▣ 114/5/26 工營中心以備工建規字第 1140007169 號函，請統包商提送第四、五階段細部設計附約」草案文件暨「細部設計報告書(114/6/10 前提送)」。 ▣ 114/6/10 統包商以 114 宏工字第 1140004013 號函，檢送細部設計報告書(第一版，修訂 3 次)。 ▣ 114/6/23 專管單位以亞新(工管一)字第 1140031335 號函，檢退細部設計報告書(第一版修訂 2 次)。 ▣ 114/6/26 專管單位尚未收到統包商完修圖資，提醒統包商會有逾期狀況發生，建議即刻送審，統包商說明除一階細設配合釋疑單調整修正之意見未完成外，其他列管意見也尚未完成修正，目前刻正辦理修正作業，並預計 114 年 6 月 30 日完成修正。另有關統包商說明涉及北工處意見之一階細設項目數量差異調整納五階細設附約辦理簽訂內容需依契約。 ▣ 114/7/2 統包商以 114 宏工字第 1140004621 號函，函轉設計單位細部設計報告書(第一版，修訂 4 次)版次有誤。 ▣ 114/07/16 專管單位亞新(工管一)字第 1140036350 號函同意有條件審定轉工營中心(第一版，修訂 3 次)。 ▣ 114/7/30 工營中心以備工建管字第 1140010617 號函，核定細部設計報告書(第一版修訂 4 次)，惟依函文說明三略以「有關本項作業	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							提送版次，.....，請專管單位依約督導統包商盡速完成本項作業工期檢討，...」， ▣ 114/8/7 專管單位預定 114 年 8 月 8 日發文並將請統包商於文到 7 日內提送。 ▣ 114/8/8 專管單位以亞新（工管一）字第 1140044064 號函，請統包商於文到 7 日內提送工期檢討表。 ▣ 114/8/15 統包商以 114 宏工字第 140005738 號函，轉統包設計團隊國防部軍備局工程營產中心核定細部設計報告書工期檢討事宜。 ▣ 114/8/21 專管單位以亞新（工管一）字第 1140047295 號函，審轉有關細部設計報告書（第一版修訂 4 次）工期計算檢討案。 ▣ 114/8/28 工營中心以備工建管字第 1140012472 號函，有關細部設計報告工期檢討，說明針對專管所提送逾期檢討，倘有不可歸責乙方原因，請統包商提出澄復意見及相關佐證資料儘速函送專管及本中心審認。 ▣ 114/9/11 第 171 次專技會議，統包商說明細部設計報告書工期檢討澄復，內部尚在檢討中，俟檢討完妥後盡速提送。 ▣ 114/11/26 工營中心以備工建規字第 1140017534 號函，檢送第 2 期設計費計價資料予營改基金。 ▣ 115/3/11 第 196 次專技會議，統包商設計單位說明，預計 115 年 6 月提出檢討資料。 ▣ 自 114 年 9 月 16 日第 171 次專技會議至 115 年 7 月 2 日第 212 次專技會議，統包商仍辦理中。 ▣ 統包商 115/7/1 發函 115 宏工字第 1150003877	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							號函送細部設計不可歸責乙方原因相關事宜，專管監造單位業於 115 年 7 月 8 日以亞新（工管）字第 1150038465 號函檢附審查意見函送機關，後續俟機關核示辦理。 ▣ 115/7/20 工營中心發函，備工建規字第 1150009197 號，細部設計不可歸責乙方原因，函文回覆指示，並同意給予專管監造單位文到後 30 日作業時間。該函專管單位於 115 年 7 月 22 日收文，專管監造單位將依函示辦理；如自收文次日（115 年 7 月 23 日）起算，30 日期限至 115 年 8 月 21 日止專管監造單位將依指示進行辦理。 ▣ 115/08/21(五)專管監造單位以亞新（工管）字第 1150050877 號函請機關申請展延 30 天。 ▣ 115/9/1 工營中心以備工建規字第 1150011371 號函，同意將專管監造單位辦理前開不可歸責事由檢討之審查期限展延至 115 年 9 月 21 日。 ▣ 115/9/21 專管單位已亞新（工管）字第 1150055010 號發函，敬請機關展延工作天 15 日。	
1-6		新作 RC 圍牆、排水溝(校區內)及既有排水系統銜接等規畫調整為「新設圍牆校方側排水工程」	1120815		統包商		▣ 原 RC 圍牆外排水功能及區域水文納本案全區整體排水系統設置檢討(工營中心 111.07.28 函轉國防大學 111.07.07 用地計畫及現勘結果管辦事項)。 ▣ 1.提供初稿：預計 112.05.09 未提供。 ▣ 2.再管制提供初稿：112.05.25。 ▣ 3.專管提供審查意見：112.05.30。 ▣ 4.提送：112.06.20 延至 112.07.04。 ▣ 5.審退：112.07.11。(審查意見共 19 項)	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							▣ (1)RC 圍牆結構圖說、計算與技師簽署。 ▣ (2)RC 圍牆、排水溝、排水管及集水井衝突未檢討。 ▣ (3)陰井、排水溝、排水管之開挖擋土未檢討。 ▣ 6.管制 112.08.11 提送：未提送。 ▣ 7.再管制：112.08.24 未提送。 ▣ 8.再管制：112.08.30 未提送。 ▣ 9.再管制：112.09.18。 ▣ 112/9/18 統包商提送新作 RC 圍牆位置(基礎)及校方側(基地外側)排水計畫。(112 宏工字第 1120003651 號) ▣ 112/9/19 統包商提送排水計畫。(112 宏工字第 1120003680 號) ▣ 112/9/25 專管 9 月 25 日發函新作 RC 圍牆位置(基礎)及校方側(基地外側)排水計畫(第一版修訂 1 次)審查意見(112 年 9 月 25 日亞新(工管一)字第 1120075068 號) ▣ 112/9/26 專管 9 月 26 日發函排水計畫(第一版修訂 1 次)審查意見(112 年 9 月 26 日亞新(工管一)字第 1120075208 號) ▣ 112/10/12 待受保護樹木編號 3778 褐根病文化局現勘結論調整後提送。 ▣ 112/11/22 統包商承諾 11 月 29 日提送。 ▣ 112/11/29 統包商提送新作 RC 圍牆位置(基礎)及校方側(基地外側)排水計畫(第一版，修訂 2 次)。(112 宏工字第 1120004895 號)。 ▣ 112/12/6 專管發函排水計畫(第一版修訂 2 次)審查意見(112 年 12 月 6 日亞新(工管一)字第 1120088296 號)。 ▣ 112/12/12 統包商預計 12/22 提送。	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							▣ 112/12/26 統包商預計 1/10 提送。 ▣ 113/1/19 專管發函新作 RC 圍牆位置（基礎）及校方側（基地外側）排水計畫（第一版，修訂 3 次），提醒時程問題。(113 年 1 月 19 日亞新(工管一) 字第 1130002539 號) ▣ 專技會議說明：113.01.25 未提出。 ▣ 提送(第一版 V4):預計 113.01.31 延至 113.02.19 ▣ 113/03/19 統包商提送新作 RC 圍牆位置(基礎)及校方側(基地外側)排水計畫(第一版，修訂 4 次)。(113 宏工字第 1130001432 號)。 ▣ 113/3/27 專管發函新作 RC 圍牆位置（基礎）及校方側（基地外側）排水計畫（第一版修訂 4 次） 審查意見。(113 年 3 月 27 日亞新（工管一）字第 1130014049 號) ▣ 113/04/08 預計 04/15 提送修正版。 ▣ 113/4/17 提送(第一版 V5)：預計 113.04.25 ▣ 113/4/25 預計 4/30 提送修正版。 ▣ 113/5/3 預計 5 月份提出修正版。 ▣ 113/5/7 本次會議簡報 P.45-47 提出，請依各單位所提意見修正。 ▣ 113/5/16 統包商提送新作 RC 圍牆位置(基礎)及校方側(基地外側)排水計畫(第一版，修訂 5 次)。(113 宏工字第 1130002774 號)。 ▣ 113/5/22 專管發函新作 RC 圍牆位置（基礎）及校方側（基地外側）排水計畫（第一版修訂 5 次） 審查意見。(亞新（工管一）字第 1130025143 號) ▣ 113/6/12 檢送新作 RC 圍牆位置(基礎)及校方側(基地外側)排水計畫(第一版，修訂 6 次)。	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							(113 宏工字第 1130003367 號) ▣ 113/6/18 專管發函新作 RC 圍牆位置（基礎）及校方側（基地外側）排水計畫（第一版修訂 6 次） 審查意見。(亞新（工管一）字第 1130030365 號) ▣ 113/7/3 檢送新作 RC 圍牆位置(基礎)及校方側(基地外側)排水計畫(第一版，修訂 7 次)。(113 宏工字第 1130003842 號) ▣ 113/7/10 專管發函新作 RC 圍牆位置（基礎）及校方側（基地外側）排水計畫（第一版修訂 7 次） 審查意見。(亞新（工管一）字第 1130034436 號) ▣ 113/7/29 檢送新作 RC 圍牆位置(基礎)及校方側(基地外側)排水計畫(第一版，修訂 8 次)。(113 宏工字第 1130004327 號) ▣ 113/8/6 專管發函新作 RC 圍牆位置（基礎）及校方側（基地外側）排水計畫（第一版修訂 8 次） 審查意見。(亞新（工管一）字第 1130039023 號)。 ▣ 113/10/11 統包商說明相關內容已不盡相同，工營中心遂指示不需再進版，改以另案重新提送方式辦理。 ▣ 113/10/30 113 年 10 月執行進度管制會議(113 年 10 月 30 日)，機關請統包商於 2 周內提供完整資料未提供。 ▣ 113/11/13 依機關說明以另案重新提送，統包商未提供。 ▣ 113/12/26 第 135 次專技機關同意於第五階段細部設計審定後再行辦理。	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							▣ 114/1/7 之 1 月進度管制會議，主席裁示儘速提出 RC 圍牆外排水設施完整設計圖說及相關預算，以利專管協助檢核並提供使用單位檢討參辦。 ▣ 114/3/27 至第 147 次專技會議未提供，機關同意待細設告一段落後辦理。 ▣ 114/5/12 第五階段細部設計機關於 114 年 5 月 12 日有條件核定，請統包商盡速提送。 ▣ 114/5/16 目前第五階段細部設計機關於 114 年 5 月 12 日有條件核定，請統包商盡速提送。 ▣ 114/6/12 統包商於本日專技會議說明，本案與會人員無法代公司決定，會攜回再與公司高層溝通，仍請統包商盡速協助提送。 ▣ 自 114/3/27 第 147 次至 114/7/3 第 161 次專技追蹤，尚未辦理，請儘速提供以利與政院說明銜接界面辦理方式。 ▣ 114/7/17 設計單位提出勞務費預算，請設計單位一併提出建造預估預算。 ▣ 114/7/24 設計單位於會中說明，將依照 113 年 7 月 29 日討論後圖說，預計於 114 年 8 月 8 日前提出建造預估費用與設計規畫費用。 ▣ 114/7/31 之前會議設計單位之前已列出設計之勞務費用，一直提醒後續工程費用需要一並提出，北工處才能幫忙與使用單位爭取預算，統包商於會中說明，目前清圖中需要再些時間；上週(7/24)專技會議統包商預計於 114 年 8 月 8 日前提出，請依時限辦理。另本項未解除列管，請統包商商納入每週專技會議簡報項目並更新辦況。	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							▣ 114/8/6 第 166 次專技會議，統包商說明目前正依圖說檢討數量中。 ▣ 114/8/14 第 167 次專技會議，統包商說明內部仍依圖說檢討數量中，因部分工法及界面需再研討，預計 114 年 8 月 28 日前提出初步數量及預算。 ▣ 114/8/21 第 168 次專技會議，統包商簡報 P14~P15，統包商於會議中提供施工數量計算並轉設計單位編列預算及修正圖說，前次會議列管於 114 年 8 月 28 日前提出初步數量及預算請統包團隊務必依時限提供。 ▣ 114/8/28 統包商於會議中說明，已於 114 年 8 月 21 日第 168 次專技會議提供一版數量計算資料，預計 114 年 8 月 29 日前提出初步預算，請統包商於內部討論整合後，於下週專技會議回報。 ▣ 114/9/4 第 170 次專技會議，統包商未依上週(114 年 8 月 28 日)專技會議預計時限提，統包商說明，預算內部仍在討論中，內容待整合，預定提出時間於下週專技會議回報。 ▣ 114/9/11 統包商預定 114 年 9 月 26 日前提出預算資料。 ▣ 114/9/24 第 173 次專技會議，統包商簡報 P38，統包商提供第二次變更設計項目內預估預算金額約需 1,261 萬。 ▣ 114/10/9 第 175 次專技會議，統包商說明預計 114 年 10 月 23 日召開圖研會。專管單位提醒統包商盡快正式發文提送相關圖說、預算。	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							▣ 114/10/17 北工處召開第 2 次變更設計需求研討會議，請依決議辦理後續。 ▣ 114/10/20 專管單位以亞新(工管一)字第 1140060637 號函，檢送有關第二次變更設計審查意見。 ▣ 114/10/23 專管單位已於 114 年 10 月 20 日函送審查意見，請統包商盡速依審查意見修正後重新提送。 ▣ 114/11/6 第 179 次專技會議有關 RC 圍牆排水，專管單位未落實管制並掌握統包商修正情形，專案經理未全般瞭解執行室礙及修正進度，並無法於會議詳實說明，請確依技服契約規定，秉契約專案管理之責，掌握辦理情形並於下次會議說明。專管單位於會前通知統包商，審查意見修正有疑義，可先行協調。 ▣ 114/11/13 第 180 次專技會議，有關統包商提及部分區外管線於前階段並未進行調查，故提供剖面圖說有困難；建議統包團隊邀集相關管線單位辦理會勘，取得各單位管線位置資訊，以利審查意見修正及確認。 ▣ 114/11/20 第 181 次專技會議，統包團隊於會議中說明，目前內部仍修正圖說及預算中，請統包商加速修正，以利北工處辦理後續變更協調事宜。 ▣ 114/11/27 第 182 次專技會議，統包團隊於會議中說明，目前內部仍修正圖說及預算中，另統包商於 114 年 11 月 11 日提供電子檔複審，因圖說、預算仍在修正，影響專管單位	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							審查，請專管單位實質審查之困難，需於專技會議說明清楚，以利北工處進行協調；請統包商加速修正，以利北工處辦理後續變更協調事宜。 ▣ 114/12/1 專管單位以亞新(工管一)字第 1140070057 號函，催辦有關第 2 次變更設計需求研討會議結論辦理情形。 ▣ 114/12/3 統包商以 114 宏工字第 1140008315 號函，檢送第二次變更設計相關文件及資料，並確認原「新作 RC 圍牆位置(基礎)及校方側(基地外側)排水計畫」調整為「校方側(基地外側)之排水計畫圖說」，且圖說上已有交代鄰近排水溝之區外既有各類管路佈設狀況，會後也立即拍照說明目前已知管路概況及高壓管遷階段之管路調整如變電箱及電管調整位置。 ▣ 114/12/11 第 184 次專技會議，本案係屬契約外新增項目變更設設計，機關請統包團隊務必於將圖說、預算完善規劃(含工期檢討、釐清各項衝突檢討),於完成變更設計程序後，由統包團隊全權負責。 ▣ 114/12/11 專管單位以亞新(工管一)字第 1140071346 號函，審退第二次變更設計(新設圍牆校方側排水工程修正一版)。 ▣ 114/12/18 第 185 次專技會議，有關「新設圍牆校方側排水工程修正一版」，目前統包商修正中，本案於會中協議預計 114 年 12 月 24 日召開合署會議，統包商允諾 114 年 12 月 22 日先提供部分審查意見回復資料供複	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							審，另請統包商務必於 114 年 12 月 23 日中午前提供完整回復資料供複審，以利合署作業執行。 ▣ 114/12/24 第 186 次專技會議，原訂 114 年 12 月 24 日於月成果會議後，召開新設圍牆校方側排水工程修正一版合署會議，因北工處考量月成果會議還需討論其他議題，經協調延至 115 年 1 月 8 日的召開合署會議。另截至 114 年 12 月 24 日統包商尚未提供完整回復之相關資料供複審，為利合署作業執行請統包商務必於 115 年 1 月 2 日中午前提供。 ▣ 114/12/24 北工處以備北工營字第 1140012134 號函，請統包商盡速依專管審查意見，完成變更設計圖說及預算等相關資料修正後送複審；針對統包商研提展延工期 240 天部分，請統包商將相關工項納入預定進度表排程並研提施工網圖等相關資料，以佐證影響要徑天數。 ▣ 114/12/30、115/1/5 統包團隊於 Line 大群提供第二次變更設計之「新設圍牆校方側排水工程」相關資料供專管單位複審。 ▣ 115/1/8 第 188 次專技會議會後合署辦公及充分溝通，並經機關於 114 年 12 月 11 日第 184 次專技會議說明，第二次變更設計之「新設圍牆校方側排水工程」應完善檢討變更設計圖說、預算(包含釐清各項衝突檢討、工期檢討)，於完成變更設計程序後，將由統包團隊全權負責。若統包商對於本次變更設計僅能提供初步圖說及預算(無法量化)，則請	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							統包商發文機關說明。請統包商依合署意見於 115 年 2 月 6 日提供修正圖說及預算(需量化)供專管單位預審。 ▣ 115/1/22 第 190 次專技會議，統包團隊於會議中提及，預定 115 年 1 月 26 日前提供修正圖說及預算供專管單位預審，並請專管單位協助再召開合署會議部分，請統包團隊務必於前述日期內，提供完整之修正圖說及預算(需量化)予專管單位預審，以利後續召開合署會議。 ▣ 115/1/29 校方側(基地外側)之排水計畫合署會議紀錄，專管單位將另案發文，屆時請統包團隊依會議結論辦理修正作業。 ▣ 115/2/2 專管單位以亞新(工管一)字第 1150006739 號函，檢送 115 年 1 月 29 日第二次變更設計之新設圍牆校方側排水工程合署辦公會議紀錄。 ▣ 115/2/3 統包團隊於 Line 大群提供第二次變更設計之「新設圍牆校方側排水工程」相關資料供專管單位預審。 ▣ 115/2/4 再次召開校方側(基地外側)之排水計畫合署會議。 ▣ 115/2/6 統包商於 LINE 大群提供複審資料。 ▣ 115/2/10 統包商以 115 宏工字第 1150000980 號函，檢送第二次變更設計「校方側(基地外側)排水計畫書圖文件(第一版修訂 2 次)。 ▣ 115/2/11 第 193 次專技會議，因北工處預計農曆年後召開聯審作業，為避免因審查意見審退公文往返，花費過多時程，專管單位第二	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							次變更設計審查意見暨回覆表將於聯審會議時提出。 ▣ 115/2/13 專管單位以亞新(工管一)字第 1150008788 號函，審轉第二次變更設計「校方側（基地外側）排水計畫書圖文件（第一版修訂 2 次）予北工處協助續辦。 ▣ 115/2/26 第 194 次專技會議，有關第二次變更設計「校方側（基地外側）排水計畫書圖文件，北工處原訂於 115 年 3 月 4 日召開聯審會議，於本日(2/26)月成果會議，主席裁示由專管單位提供意見即可，後續北工處提報工營中心。專管單位審查意見皆列項於審查意見暨回覆表並於 115 年 2 月 13 日審轉北工處。 ▣ 115/3/11 第 196 次專技會議，北工處說明工期展延 240 日曆天，恐難以同意，預定 3 月召開聯審作業。 ▣ 115/3/18 第 197 次專技會議，北工處說明原預定 3 月召開聯審作業將取消，工營中心將直接陳核空軍確認需求，另後續新設圍牆校方側排水工程及建築能效將移並函請空軍確認需求，再請統包團隊依需求修正相關資料。 ▣ 115/3/24 北工處以備北工營字第 1150002388 號函催辦「建築能效」相關期程及圖算資料，俾與基地外側排水計畫併案辦理第二次變更設計暨新增需求作業。 ▣ 自 114 年 3 月 25 日第 198 次專技會議至 115 年 5 月 28 日第 207 次專技會議，統包商仍辦理	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							中。 ▣ 115 年 5 月 28 日第 207 次專技會議，請統包廠商評估「新設圍牆校方側排水工程」是否影響要徑需要先行施工？ ▣ 115 年 6 月 4 日第 208 次專技會議，統包商於會中回覆，本項排水工程原則上會影響新設圍牆、瓦斯管線及污水管線等相關施工界面；惟該排水係銜接至原設箱涵，對主體結構體施工原則上尚無重大影響。另考量若現階段未先行辦理，後續再行施作水溝時，相關施工界面恐較為複雜，仍需就排水銜接、管線界面及施工順序再予釐清。鑑於機關已指示本項排水工程併入第二次設計變更一併討論，故後續俟第二次設計變更程序完成後，再行啟動相關作業。 ▣ 115/6/24 統包商以 115 宏工字第 1150003767 號函提送第二次變更設計基地外側排水計畫事宜，專管單位原則無附加意見，並已於 115 年 6 月 30 日以亞新（工管一）字第 1150036796 號函請機關核示。 ▣ 115/7/16 第 214 次專技會議，有關第二次變更設計基地外側排水計畫與建築能效評估之拆案或併案辦理方式，依現有資料難以判斷拆案辦理之必要性，請統包商及專管單位儘速提出拆案及併案辦理之優劣分析，俾供機關後續決策。 ▣ 115/7/20 有關第二次變更設計基地外側排水計畫與建築能效評估之拆案或併案辦理方式，機關已經在 115 年 7 月 15 日備北營字	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							第 1150005962 號函文，請依照函文內容指示辦理。(專管監造單位於 115 年 7 月 20 日收文) ▣ 115/7/24 專管單位發文北工處，亞新（工管）字第 1150042978 號，請求同意針對第二次變更設計基地外側排水計畫與建築能效評估之拆案或併案辦理方式，將於 7/30 第 216 專技會議內討論，將於 8/7 前回覆機關指示。 ▣ 115 年 7 月 30 日第 216 次專技會議，針對「新設圍牆校方側（基地外側）排水工程」與建築能效評估採拆案或併案辦理進行討論。會中考量本項排水工程與新設圍牆、景觀及瓦斯管線之施工界面密切，原則朝納入本案第二次變更設計辦理方向研議；另請統包商補充提供圍牆、景觀及排水工程之工期及細部施工排程，供專管單位彙整後續函復機關。 ▣ 115/8/6 第 217 次專技會議，專管單位於 115 年 7 月 24 日以亞新（工管）字第 1150042978 號函，申請將本案回覆期限展延至 115 年 8 月 7 日；惟為加速案件辦理，專管單位仍於展延期限屆至前，於 115 年 8 月 4 日以亞新（工管）字第 1150046353 號函完成函復。機關嗣於 115 年 8 月 5 日以備北工營字第 1150006762 號函，同意前述展延申請。專管單位於函復內容中說明，綜合考量整體排水功能、施工順序、工程界面、權責劃分及工期管控等因素，為避免後續拆除、復舊及重複施工，造成公帑浪費，不宜將基地外側排水工程自本次變更設計排除而僅先行施作	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							新設圍牆。爰建議將基地外側排水工程納入本案第二次變更設計先行辦理；建築能效相關變更項目則與基地外側排水工程分案辦理，俟候選證書及相關變更內容確認後，再依程序續辦。 ▣ 115/8/18 截至第 218~220 次專技會議，專管單位說明，基地外側排水與建築能效分案辦理之相關資料已循程序陳報，後續俟機關核示。 ▣ 115/9/2 第 221 次專技會議，會議就基地外側排水、景觀、新設圍牆、瓦斯管線及主體工程之施工界面進行討論。統包商說明，基地外側排水與新設圍牆、瓦斯管線及流出抑制設施銜接具有先後關係，如未儘早確認，恐增加後續拆除、復舊及施工界面處理。經會議討論，現階段統包商希望優先推動基地外側排水第二次變更設計的進行，建築能效及其他項目另案辦理；專管單位依機關審查意見修正相關分析資料，另請統包商補充排水、景觀、圍牆及瓦斯管線之施工順序、銜接節點與影響說明，作為機關審議及後續工期檢討參考；所涉經費及工期俟機關同意辦理變更設計後，再依契約程序議定。 ▣ 115 年 9 月 11 日第 222 次專技會議，專管監造單位希望統包商提出基地外側排水、新設圍牆、景觀及瓦斯管線之施工進度、工序與界面影響資料。統包商表示可提供其他資料說明施工順序及界面影響；雙方對資料呈現方式尚待協調；所涉工期及經費待成案後，再	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							依契約程序檢討。 ▣ 115 年 9 月 17 日第 223 次專技會議，專管單位說明，機關於 115 年 9 月 9 日及 9 月 10 日共發出 3 份與第二次變更設計相關之函文，專管單位於 115 年 9 月 15 日收訖，機關並要求於 115 年 9 月 25 日前完成回覆。考量後續尚需辦理資料彙整、函稿簽核及適逢假日等因素，爰請統包商原則於 115 年 9 月 21 日前提供相關資料或正式回覆，以利專管監造單位彙整辦理。另會中指出，前開函文所涉基地外側排水、景觀、新設圍牆、瓦斯管線及主體工程施工界面等議題，前兩次專技會議已進行討論，部分審查意見亦已先行提供統包商。經會議討論，請統包商依機關函文及專管意見，釐清各工項目前施工進度、施工界面、辦理順序及對施工要徑之影響，並依限提出具體說明及相關資料，供後續第二次變更設計檢討及函復機關辦理。 ▣ 115/9/24 第 224 次專技會議，有關第二次變更設計基地外側排水工程，統包商說明，已於 115 年 9 月 21 日以 115 宏工字第 1150005452 號函檢送相關資料予專管單位，並於會中表示，考量現階段施工進度，以及後續景觀、新設圍牆、瓦斯管線及主體工程等施工界面，基地外側排水工程與相關工項之施工順序及界面銜接密切相關，爰建議儘速啟動第二次變更設計程序。經會議討論，原則同意先行啟動第二次變更設計相關作業，至統包商所提工期調整部分，另依實際影響情形及	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							相關佐證資料續予檢討。另機關說明，基地外側積水區及排水設施涉及原計畫範圍外之新增需求，相關程序仍須持續辦理。請專管單位依本次會議討論結果彙整相關資料，於 115 年 9 月 29 日前提供機關，俾利機關於 115 年 9 月 30 日辦理後續函文作業， ▣ 115 年 9 月 30 日第 225 次專技會議，專管單位說明，已依前次會議決議彙整相關資料，並於 115 年 9 月 29 日以亞新（工管）字第 1150058339 號函送北工處辦理。	
1-7		五大管線(含電力、電信、自來水、污水、消防)(外管線引進點高程/位置)、變更設計	1120829		統包商		▣ 1.台電預審：原管制 9 月底未完成 ▣ 2.統包商延至 112.10.05 取得初步審查意見 ▣ 3.台電預審資料：管制 112.10.18 未提供 ▣ 3.再管制：112.10.16、112.10.18 掛件未辦理 ▣ 4.再管制：10.30 掛件。 ▣ 5.1121031 統包商預計 11.03 提送。 ▣ 6.112.11.08 環工技師現勘。 ▣ 112/11/21 提出基地五大管線調查申請。(112 宏工字第 1120004764 號) ▣ 112/11/22 本次會議提出污水外管路徑方案。 ▣ 112/11/22 臺北自來水事業處發函檢送臺北市北投區秀山段二小段 694 地號等 7 筆自來水管線圖。(112 年 11 月 22 日北市水陽明營字第 1126026226 號) ▣ 112/11/22 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處發函經查無本處施工中及計畫新設輸電管線。(112 年 11 月 22 日北區字第 1123494374 號) ▣ 112/11/23 臺北市政府工務局水利工程處發函	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							附近雨水下水道管線資料案。(112 年 11 月 23 日北市工水下字第 1126064151 號) ▣ 112/11/23 臺北市政府工務局衛生下水道工程處發函經查該基地內有既有污水管渠通過。(112 年 11 月 22 日北市工衛營字第 1123052023 號) ▣ 112/11/24 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處發函管線套繪案，經查基地範圍內無本處管線。(112 年 11 月 24 日北供字第 1122622729 號) ▣ 112/11/27 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處發函經查該工區範圍無本處管線、路樹等公共設施，後續如有遷移需求請依相關規定申請辦理。(112 年 11 月 27 日北市工公護字第 1123066828 號) ▣ 112/11/27 中華電信股份有限公司台北營運處發函附近周邊之電信管線套繪圖乙份。(112 年 11 月 27 日台北七客字第 1120000789 號) ▣ 112/11/30 污水及自來水部分已依照 1128 專技會議內容修正。依照台電意見修正中，下次會議前會提供給龍泉。 ▣ 112/12/07 台電預審 ▣ 112/12/11 台電預審完畢。 ▣ 112/12/19 檢送台電預審圖資。(112 宏工字第 1120005265 號) ▣ 112/12/25 專管發函業經主管機關預審通過之台電預審圖資，無附加意見。(112 年 12 月 25 日亞新（工管一）字第 1120092305 號) ▣ 113/1/3 工營中心發函台電配電場所預審圖資	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							案同意備查。(113 年 1 月 2 日備工建規字第 1120021781 號) ▣ 113/1/8 專管發函台電配電場所預審圖資同意備查相關事宜，請統包商納入鈿部設計及建造執照送審圖資。(113 年 1 月 8 日亞新（工管一）字第 1130000384 號) ▣ 113/3/4 預計於建造執照取得後，113/3/18 開始送審期程。 ▣ 113/3/20 建造執照取得後，113/3/18 開始送審期程。 ▣ 113/4/8 預計於建照取得後辦理 ▣ 113/4/17 請先提供用印資料予專管：113.04.12 提供電子檔資料不全，缺漏台電及衛工相關表單。 ▣ 113/6/12 預計本周提送業主用印文件 ▣ 113/6/17 檢送流出抑制申請書及切結書、排水設施新設、改道或廢止排水計畫相關文件、綠建築及智慧建築相關文件及五大管線用印文件等各乙式(113 宏工字第 1130003440 號) ▣ 113/6/19 空軍完成用印(國空人庶字第 1130146240 號)。 ▣ 113/6/20 用印文件轉各專業技師申請使用。 ▣ 113/6/5 台電(電氣)掛件 ▣ 113/6/13 污水掛件 ▣ 113/7/3 自來水(給水)掛件 (申請編號:202407030462) ▣ 113/7/8 電信掛件 ▣ 113/7/10 消防掛件	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							▣ 113/8/1 消防日前已審退，管制今天(8/1)再掛件複審請持續追辦。 ▣ 113/8/5」(五管)污水審查修正內容(副本製作)與起造人代表人變更之申請用印文 ▣ 113/8/9 五大管線引進位置及規格相關事宜(113 宏工字第 1130004653 號) ▣ 113/8/12(五管)汙水審查修正內容即請造人變更等申請文件鈐印(國空人庶字第 1130195348 號) ▣ 113/8/23 止，污水及電氣已審訖，NCC 待建築師繳費，消防第 4 次掛件中，給水因設戶 1 戶有誤，需與自來水公司協商。 ▣ NCC 預計 9/27 拿到副本圖 ▣ 預計 9/23 業管機關通知 清圖 預計 9/26 修正完成後提送 自來水公司 ▣ 於 122 次專技說明於 113 年 9 月 23 日業管機關通知清圖及 113 年 9 月 26 日完成修正並重新提送審查 ▣ 113/10/9 工營中心於 113 年 10 月 9 日轉送空軍確認，空軍已於 113 年 10 月 9 日回函確認相關戶數。請統包團隊接續辦理五大管線變更設計前置作業。 ▣ 113/10/16 五大管線已審迄之圖說及相關資料，歷次會議已催辦多次，請統包商儘速依契約規定提送備查。 ▣ 113/11/1 五大管線已審迄之圖說及相關資料尚未提送備查。 ▣ 113/11/21 有關細部設計與基本設計、都審、建照圖等不一致及建照戶 1 戶不符統需書等，	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							須辦理建照變更設計後之五大管線變更設計。 ▣ 113/11/21 113 年 10 月 18 日第四次送審，113 年 11 月 5 日至自來水公司對圖，預計 113 年 11 月 15 日再次與承辦對圖，第 130 次專技說明預計 113 年 11 月底審訖。 ▣ 113/11/22 統包商以 113 宏工字第 1130007084 號函，檢送五大管線報備相關事宜(電氣、電信、污水及消防)。 ▣ 113/11/27 專管單位以亞新(工管一)字第 1130062541 號函，檢退五大管線報備資料案。 ▣ 114/1/15 統包商以 114 宏工字第 1140000316 號函，檢送五大管線報備相關事宜。 ▣ 114/1/16 五大管線變更設計：後續請配合細部設計內容及建照變更設計，續辦五大管線變更設計作業。 ▣ 114/1/20 專管單位以亞新(工管一)字第 1140002862 號函，函轉權責機關審迄之五大管線圖說資料與機關備查。 ▣ 114/2/4 工營中心以備工建規字第 1140001264 號函，備查權責機關審訖之五大管線及消防設備圖說資料提送案。 ▣ 114/2/21 統包商說明待雜並建後辦理，另請確認送建管圖資為機電可用圖資。 ▣ 114/2/27 專管單位提醒務必先行辦理前置作業(台電、消防、等圖資應與雜並建照一致(含變更設計))。 ▣ 114/3/6 統包商說明不納入地面層之變更設計	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							內容，使致影響五大管線後續變更設計送審內容僅限於地下室及戶數變更，恐影響地面層以上送審內容需再次辦理變更設計或報備，請控管自身送審時程與工程進度相符。 ▣ 114/3/13 統包商說明第一次建照變更設計後，交由各技師辦理受電室、自來水戶數、消防等變更，依執照變更核准後備註事項辦理。 ▣ 114/4/2 專管單位持續建議統包商提前檢討，以利縮短後續行政程序。 ▣ 114/4/10 專管單位提醒送審內容僅限於地下室及戶數變更，恐影響地面層以上送審內容需再次辦理變更設計或報備，統包商說明預計於 114 年 4 月 17 日專技會議說明建管列管放勘、基礎版、一樓版之勘驗應完成五大管線與施工進度之時程影響，專管單位並請統包商控管送審時程與工程進度相符。 ▣ 114/4/24 專管單位再次提醒第一次建照變更設計涉及消防調整未作變更，是否影響消防送審內容，請統包商釐清。 ▣ 114/4/30 專管單位再次提醒第一次建照變更設計涉及消防調整未作變更，是否影響消防送審內容，請統包商釐清，請避免導致後續需配合細設圖說再次辦理變更設計或報備，影響工進。 ▣ 114/5/8 有關第一次建照變更設計涉及消防調整未完成變更(如防火區劃、消防栓箱位置調整)，統包商 114 年 5 月 8 日說明先以既有消防設備審核完成辦理放樣勘驗，待放勘後，再辦理消防變更設計。	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							▣ 114/5/29 宏昇提出，預計 114 年底開始地下室施工，基礎版勘驗預計 114 年 9 月 30 日，第二次建照變更設計期程預計 114 年 11 月 30 日完成，五大管線第一次變更設計時程恐影響現場工進，請統包團隊確認及回報五大管線第一次變更設計最晚完成時間，以利控管。 ▣ 114/6/12 第 158 次專技會議，統包商說明原放樣勘驗日期 114 年 5 月 15 日，因第一次建照變更尚未完妥，放樣勘驗日期調修為 114 年 6 月 30 日，五大管線變更設計調修為 114 年 7 月 31 日前完成。 ▣ 114/7/3 第 161 次專技會議，統包商於會議說明因第一次建照變更附表未說明須辦理五管變更，故目前暫不辦理。第一次建照變更內容包含消防，依消防相關規定監造消防設備師須至現場辦理查驗，若未完成消防變更設計，恐影響現場查驗執行。北工處說明下週(7/10)專技會議專管及監造單位、統包商邀集消防設備師或消防相關人員與會，以利釐清相關事宜。 ▣ 114/07/10 第 162 次專技會議結論，請統包商將消防勘驗及監造消防設備師查驗，依五管勘驗施工時程表列項，並納入每週專技會議簡報，以利管制。 ▣ 114/7/15 工營中心備工建管字第 1140009573 號函說明三要求統包商於文到乙週，將須納入第 2 次建照變更、五大管線變更內容與預訂送審掛件時間提送專管單位審查。	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							▣ 114/7/17 設計單位說明將於建照第二次變更完成後提送變更。 ▣ 114/7/24 統包商以 114 宏工字第 1140005208 號函，函轉設計單位第 2 次建照變更及五大管線變更事宜(預計掛件時程)。 ▣ 114/7/30 專管單位以亞新(工管一)字第 1140041729 號函，審退第 2 次建照變更及五大管線變更，並要求文到 7 日內函覆。 ▣ 114/7/31 第 165 次專技會議，專管單位提醒統包商第 2 次建照變更及五大管線變更資料依函文時限提送。 ▣ 114/8/7 第 166 次專技會議，專管單位於 114 年 7 月 30 日審退第 2 次建照變更及五大管線變更資料(變更內容與預訂送審掛件時間)，並要求文到 7 日內函覆，目前尚未收到統包商提送資料，恐已逾要求期限，請統包商盡速於 114 年 8 月 8 日前函送。 ▣ 114/8/14 第 167 次專技會議說明，有關專管單位於 114 年 7 月 30 日審退第 2 次建照變更及五大管線變更資料(變更內容與預訂送審掛件時間)，並要求文到 7 日內函覆，目前尚未收到統包商提送資料，已逾要求期限，統包商於本週專技會(8/14)，近期辦理第 2 次建照變更比要文件用印作業，待確定取得用印文件、順利掛件後預計 114 年 8 月 28 日前再行提送；專管單位審退已要求文到 7 日內函覆，專管單位將另案函文催辦。另依據北工處 114 年 7 月 30 日備北工營字第 1140007195 號函說明二/(三)略以「消防變更	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							部分，……，目前無系統性變更，暫不影響相關勘驗，請再次確認後續變更項目是否涉及系統性調整，以避免影響工進；……」。 ▣ 114/8/18 專管單位以亞新（工管一）字第 1140047546 號函，催辦有關第 2 次建照變更及五大管線變更資料延遲提送案。 ▣ 114/8/25 統包商提送第 2 次建照變更、五大管線變更內容與預訂送審掛件時間資料(五大管線變更作業管制 115 年 1 月 16 日掛件審查)，專管單位預計 114 年 8 月 29 日審轉工營中心及北工處。 ▣ 114/8/29 專管單位以亞新（工管一）字第 1140049249 號函，審轉有關第二次建照變更及五大管線第一次變更預定掛件時程案與工營中心。 ▣ 114/10/9 第 175 次專技會議，統包商說明實際以建照第二次變更設計取得後的時間作為五管實際掛件之時程依據。(建照第 2 次變更管制於 114 年 12 月 15 日) ▣ 114/12/24 第 186 次專技會議，第 2 次建照變更即將辦理副本核對作業，請統包團隊開始彙整五大管線第 1 次變更之前置作業，以利盡速辦理五大管線變更掛件。 ▣ 114/12/30 北工處以備北工營字第 1140012237 號函，提醒有關第二次建照變更設計相關事宜及先行辦理五大管線變更資料整備作業，於建照變更核准後，即時向各主管機關辦理掛件。 ▣ 115/1/15 第 189 次專技會議，統包商簡報 P5，	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							五大管線第一次變更掛件日期預定為 115 年 1 月 16 日，因目前第二次建照變更尚未核准，請統包商重新檢討掛件日期。 ▣ 115/1/22 第 190 次專技會議，經統包團隊重新檢討五大管線第一次變更掛件日期，調整為 115 年 3 月辦理。另因第 2 次建照變更之建築物概要表 3 數值誤植(第 2 次變更設計最終加總無誤)，將造成消防管線無法掛件，須再辦理建照變更報備，統包商團隊預定 115 年 1 月 23 日發文申請用印。 ▣ 115/1/26 專管單位以亞新(工管一)字第 1150005222 號函，提醒統包團隊有關配合第二次建照變更設計之五大管線變更設計相關事宜。 ▣ 115/1/29 第 191 次專技會議，統包商簡報 P31，污排水、給水、電氣(台電)、電信，統包團隊預定 115 年 3 月 2 日掛件，相關作業期程應避免影響現場工進，請統包團隊加速五大管線變更資料整備作業。消防變更部分，俟建照報備完成後辦理，預計 115 年 5 月 4 日消防掛件。 ▣ 115/2/26 統包商以 115 宏工字第 1150001204 號函，檢送五大管線變更(不含消防系統)申請用印文件(僅電力及電信系統)。 ▣ 115/3/3 專管單位以亞新(工管一)字第 1150010834 號函，檢送有關申請辦理電力及電信工程系統，第一次變更設計資料予空軍辦理用印事宜。 ▣ 115/3/4 第 195 次專技會議，統包商簡報 P31	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							五管變更預定時程，請新增實際掛件及取得時間欄位，另統包設計單位於會議說明，污水系統不需辦理變更設計，請於「註」補充說明。 ▣ 115/3/11 統包商設計單位說明，已於 115 年 3 月 10 日取得人軍處電力及電信工程系統用印資料，115 年 3 月 11 日轉給機電複委託廠商，預計 115 年 3 月 19 日辦理電力、電信、給水工程系統第一次變更設計掛件。 五管第一次變更設計於 114 年 12 月 24 日第 186 次專技會議，請統包團隊開始彙整五大管線第 1 次變更之前置作業，以利盡速辦理五大管線變更掛件，配合第 2 次建照報備作業自 115 年 1 月 22 日第 190 次專技會議調整管制至 115 年 3 月 2 日辦理掛件，於 115 年 3 月 10 日取得空軍用印完妥資料，需再延遲至 115 年 3 月 19 日辦理電力、電信、給水工程系統第一次變更設計掛件，請統包團隊務必依管制日期前，提早備妥權責機關所需相關資料及辦理用印事宜。 ▣ 115/3/18 第 197 次專技會議，統包商簡報 P32 五管變更預計時程表，請新增施工之管制日期節點，以避免影響現場施工作業。 ▣ 115/3/25 第 198 次專技會議，原訂 115 年 3 月 19 日辦理電力、電信、給水工程系統第一次變更設計掛件，依設計單位說明僅給水系統依期程完成掛件，電信於 115 年 3 月 23 日掛件、電力再次調整於 115 年 3 月 25 日掛件，下週專技會議請統包商於提供電力、電	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							信、給水工程系統權責機關完成掛件之收條或佐證資料。再次提醒請統包團隊務必依管制日期前，提早備妥權責機關所需相關資料，以利盡速辦理五大管線變更掛件。 前次會議請統包商新增施工之管制日期節點(本次統包商簡報 P31)，本次未修正。 ▣ 115/4/01 第 199 次專技會議，原訂 115 年 3 月 19 日辦理電力、電信、給水工程系統第一次變更設計掛件，設計單位說明電力目前尚未正式掛件，於 3 月 24 日電聯承辦機關，獲得將於掛件資料需先提供給工會，待工會回覆後方可進行掛件作業，資料已於昨日下午由工會回覆，預計明天或下週正式進行掛件，給水於 115 年 3 月 19 日掛件、電信於 115 年 3 月 23 日掛件，消防目前已取得報備資料，預計在下週就會先將資料送出，再次提醒請統包團隊務必依管制日期前，提早備妥權責機關所需相關資料，以利盡速辦理五大管線變更掛件。 ▣ 115/04/09 第 200 次專技會議，設計單位回覆，電力 4 月 8 日(三)已將資料寄至台電，確認後會完成掛件，消防預計 4 月 10 日(五)發文申請文件用印，給水於 115 年 3 月 19 日掛件，電信於 115 年 3 月 23 日掛件。 ▣ 115/04/16 第 201 次專技會議，設計單位回覆，預計 4 月 24 日(五)發文申請文件用印，專管單位於 4 月 14 日發函機關協助用印，亞新(工管一)字第 1150019136 號，電力於 4 月 10 日掛件、給水於 115 年 3 月 19 日掛件、	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							電信於 115 年 3 月 23 日掛件，再次提醒請統包團隊務必依管制日期前，提早備妥權責機關所需相關資料，以利盡速辦理五大管線變更掛件。 ▣ 115/04/24 第 202 次專技會議，設計單位回覆，消防預計於 4 月 24 日掛件、電力於 4 月 10 日掛件、給水於 115 年 3 月 19 日掛件、電信於 115 年 3 月 23 日掛件。 ▣ 115/04/29 第 203 次專技會議，設計單位回覆，消防於 4 月 24 日掛件、電力於 4 月 10 日掛件、給水於 115 年 3 月 19 日掛件、電信於 115 年 3 月 23 日掛件。 ▣ 115/05/07 第 204 次專技會議，設計單位回覆，消防原先於 4 月 24 日掛件，目前依審查意見補正完成，於 115 年 5 月 4 日再次掛件，電力於 115 年 4 月 10 日掛件、給水於 115 年 3 月 19 日掛件、電信於 115 年 3 月 23 日掛件，再次提醒統包團隊務必依管制日期前，提早備妥權責機關所需相關資料，以利盡速辦理五大管線變更掛件。 ▣ 115/05/28 歷經第 205 次至第 208 次專技會議，消防、電力、給水、電信都已掛件，皆在準備審圖作業。 ▣ 115/06/10 第 209 次專技會議：115 年 6 月 10 日第 209 次專技會議，目前五管變更的進度，電信階段性完成、給排水及電氣在清圖階段、消防持續審查中，預計七月初完成。 ▣ 115/06/17 第 210 次專技會議，設計單位報告業管機關審圖作業持續進行。	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							▣ 115/06/25 第 211 次專技會議，115 年 6 月 25 日第 211 次專技會議，設計單位報告審圖作業持續進行，而針對五管變更是否會影響現場施作事宜，回覆如下：1.地下室管線原規劃均採樑下施作，並無設計穿樑，不涉結構體脂開孔或破壞。2.金屬(鐵)管部分採明管吊架施作，僅 2 吋以下 PVC 管為暗埋施作，且該暗埋管路均敷設於樓版或牆內，未穿越樑柱結構。3.綜上，本次圖說變更應不涉穿樑及埋柱等影響結構強度之情形，故應不影響結構施工。 ▣ 115/7/2 第 212 次專技會議，設計單位說明，消防因消防局換消防大隊審查，預計 115/7/2 審圖、給水 116/6/15 核准、電氣持續審圖中、電信 115/5/21 核准，歷經第 211 次~第 212 次專技會議持續追蹤。 ▣ 115/7/9 第 213 次專技會議： 1.消防局轉消防大隊於 7 月 2 日審圖，臺北市政府消防局於 115 年 7 月 3 日發函，北市消大四字第 1153002349 號，函文內容請重新檢討。 2.電力於 115 年 4 月 10 日掛件、6 月 10 日清圖階段、預計 7 月 14 日製作副本。 3.給水於 115 年 3 月 19 日掛件、6 月 10 日清圖階段、6 月 16 日核准。 4.電信於 115 年 3 月 23 日掛件、5 月 21 日核准。 再次提醒統包團隊務必依管制日期前，提早備妥權責機關所需相關資料，以利盡速辦理	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							五大管線變更掛件。 ▣ 115/7/16 第 214 次專技會議，設計單位報告消防已依照消防大隊函文內容進行修正，預計於近日重新掛件送審，除消防圖說尚在審查及修正階段外，給排水、電氣及電信等三項管線圖說已陸續取得核准。於取得核准圖說掃描檔後，儘速彙整提送。 ▣ 115/7/22 第 215 次專技會議，設計單位報告，消防局轉消防大隊於 7 月 2 日審圖，臺北市政府消防局於 115 年 7 月 3 日發函重新檢討，7 月 17 日修正後送審，7 月 21 日進入審查階段。給水於 115 年 3 月 19 日掛件、6 月 10 日清圖階段、6 月 16 日核准。電力於 115 年 4 月 10 日掛件、6 月 10 日清圖階段、7 月 14 日製作副本、7 月 15 日取得核准。電信於 115 年 3 月 23 日掛件、5 月 21 日取得核准。 ▣ 115/7/30 第 216 次專技會議，設計單位報告。消防局轉消防大隊於 7 月 2 日審圖，臺北市政府消防局於 115 年 7 月 3 日發函重新檢討，7 月 17 日修正後送審，7 月 21 日進入審查階段，於 7 月 29 日收到核准函。給水於 115 年 3 月 19 日掛件、6 月 10 日清圖階段、6 月 16 日核准。電力於 115 年 4 月 10 日掛件、6 月 10 日清圖階段、7 月 14 日製作副本、7 月 15 日取得核准。電信於 115 年 3 月 23 日掛件、5 月 21 日取得核准。 ▣ 115/8/6 第 217 次專技會議，設計單位說明統包團隊於 115 年 8 月 3 日以 115 宏工字第	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							1150004554 號函，檢送本工程經各權責機關審查核定之五大管線第一次設計變更核准圖說資料；專管單位已於 115 年 8 月 5 日函轉工營中心備查。 ▣ 115/8/13 第 218 次專技會議，設計單位說明，五大管線第一次設計變更核准圖說已完成提送，目前俟機關核定；另就五管變更與核定的細設圖進行差異比較，經會議討論，為利後續變更設計及圖說調整有所依據，原則仍請統包設計單位正式函文提送，後續依程序辦理。 ▣ 115/8/18 第 219 次專技會議，設計單位說明，統包團隊前於 115 年 8 月 3 日以 115 宏工字第 1150004554 號函提送五大管線第一次設計變更核准圖說資料，專管單位並於 115 年 8 月 5 日函轉工營中心辦理；另依前次會議結論，統包團隊已就五管第一次變更核准圖說與核定細部設計圖說辦理差異比較，並於 115 年 8 月 17 日以 115 宏工字第 1150004815 號函正式提送相關資料，後續由專管單位依程序辦理審查及函轉作業。 ▣ 115/08/28 第 220 次專技會議，專管單位說明，已於 115 年 8 月 25 日以亞新（工管）字第 1150049670 號函陳報機關，建請機關同意將本案納入後續變更設計程序辦理。 ▣ 115/9/17 第 221 次~第 225 次專技會議，有關五管消防變更後 B、C 棟公共空間防煙垂壁替代方案，設計單位說明消防變更的部分，B 棟 1 樓公共空間門上方皆有 50CM 以上的不	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							燃材，C棟1樓無障礙廁所、男廁、女廁及茶水間天花高度由240公分調整為270公分之內容，以設計事宜程序確認，並於竣工前完成相關圖說報備。 ▣ 115/9/17(專管 9/18 收文)，北工處發函備北工營字第 1150007909 號，請專管單位配合五大管線第一次變更設計核准，檢附業管機關核准證明，並依契約規定完成設計疏責、同等品及工期增減等相關檢討後再行提送，俾利本處憑辦。	
一、建管及外審業務								
2-3	第 123 次專業技術協調會	上週會議請統包商依預劃建照放勘期程，回推本案建照變更及五大管線重新送審完成時間，本次會議未說明，請務必於下週會議提報以利列管。					▣ 截至 114/4/9 仍未提出。 ▣ 114/4/10 配合建照第 1 次變更，請於後續五大管線等變更送審作業項次填註預劃辦理及完成時間，本週會議統包商說明資料及時程預定日期多處已屆，請統包商重新修正。 ▣ 114/4/17 第一次執照變更後，尚有都審變更、五管變更(含消防)、第二次建照變更等，為不影響施工申報勘驗程序，請統包團隊下週專技會議提出連續壁施作完成後，各項勘驗需啟動日期，以利協調管制。 ▣ 114/4/24 第一次執照變更取得核可後後續作業時間管制表，依施工單位反映因建管承辦人更換需提前協調放勘作業，建議於 114 年 5 月 15 日前完成雜併建，請設計單位積極趕辦，俾利施工勘驗程序。 請統包團隊依於本週(4/24)專技會議施工單位建議建照變更完成及建管勘驗程序時間，擬定各項變更作業需啟動日期，以利協	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							調管制。 ▣ 114/4/30 請補充基礎版勘驗時程；另施工節點於預劃勘驗日期補上勘驗文字。統包商說明 114 年 5 月 15 日預計完成放樣勘驗(污水、消防、電信)及 115 年 2 月 28 完成一樓版勘驗(綠建築及智慧建築) ▣ 114/5/8 統包商說明預計 114 年 9 月 30 日完成基礎版勘驗(電力、避雷、給水、雨水儲留)。 ▣ 114/5/16 第一次執照變更後，尚有都審變更、五管變更(含消防)、第二次建照變更等，請統包團隊依於 114 年 4 月 24 日專技會議施工單位建議建照變更完成及建管勘驗程序時間，擬定各項變更作業需啟動日期，第一次建照變更、五大管線第一次變更預定掛件日期比預定勘驗日期晚，請重新檢討確認，以利協調管制。 統包商簡報 P6、專管簡報 P27，連續壁預定完成時間為 114 年 6 月 30 日，基礎版勘驗預定 114 年 9 月 30 日辦理，期間 3 個月內應完成土方開挖、安全支撐等勘驗前相關作業期程緊湊，另 3 個月內須完成第二次建照變更、第一次五大管線變更等作業，請統包商團隊務必積極辦理相關變更作業，以避免影響工進。 ▣ 114/5/29 第二次建照變更，設計設計單位預計 114 年 8 月啟動，114 年 11 月完成，行政作業流程 3 個月是否影響五大管線變更設計及建管勘驗期程，請統包團隊檢討；另第二階段建照變更之圖說修正檢討(立面)啟動時間?是否能先行完成。經 114/5/29(第 156 次)	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							至 114/6/5 專技會議皆未完成說明。 ▣ 114/6/12 第 158 次專技會議，統包商說明原放樣勘驗日期 114 年 5 月 15 日，因第一次建照變更尚未完妥，放樣勘驗日期調修為 114 年 6 月 30 日，五大管線變更設計調修為 114 年 7 月 31 日前完成。 ▣ 114/7/3 第 161 次專技會議，統包商於會議說明因第一次建照變更附表未說明須辦理五管變更，故目前暫不辦理。第一次建照變更內容包含消防，依消防相關規定監造消防設備師須至現場辦理查驗，若未完成消防變更設計，恐影響現場查驗執行。北工處說明下週(7/10)專技會議專管及監造單位、統包商邀集消防設備師或消防相關人員與會，以利釐清相關事宜。 ▣ 114/7/10 第 162 次專技會議，請設計單位於領使用執照前完成相關變更程序，五大管線變更設計涉及各業管單位審查期程，請統包商盡速辦理，以避免影響工進。 ▣ 114/07/17 設計單位說明將於建照第二次變更完成後提送五大管線變更。 ▣ 114/7/24 統包商以 114 宏工字第 1140005208 號函，函轉設計單位第 2 次建照變更及五大管線變更事宜。(預定掛件時間表) ▣ 114/7/30 專管單位以亞新(工管一)字第 1140041729 號函，審退有關第 2 次建照變更及五大管線變更，並要求文到 7 日內函覆。 ▣ 114/7/31 第 165 次專技會議，專管單位提醒統包商第 2 次建照變更及五大管線變更資料(變更內容與預訂送審掛件時間)依函文時限	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							提送。 ▣ 114/8/7 第 166 次專技會議，專管單位於 114 年 7 月 30 日審退第 2 次建照變更及五大管線變更資料(變更內容與預訂送審掛件時間)，並要求文到 7 日內函覆，目前尚未收到統包商提送資料，恐已逾要求期限，請統包商盡速於 114 年 8 月 8 日前函送。 ▣ 114/8/14 統包商簡報 P29，五管勘驗施工時程表項次 10、11，於會中統包商說明事業廢棄物清運、剩餘土石方計畫皆已取得，簡報將修正為文件取得時間，本週(8/14)專技會議仍修正，於下週專技會議簡報提交前修正。 ▣ 114/8/21 統包商簡報 P6，第一次建照變更設計取得核可後續作業時間管制表項次 2，五大管線第一次變更設計統包商以設定於第 2 次建照變更完成後辦理，第 167 次專技會議已請修正相關內容，其他未說明事項請統包商自行逐項檢視及修正，惟本週(8/21)仍未修正。 ▣ 114/8/28 統包商簡報 P6，第一次建照變更設計取得核可後續作業時間管制表項次 2，五大管線第一次變更設計統包商以設定於第 2 次建照變更完成後辦理，第 167~169 次專技會議已請修正相關內容，其他未說明事項請統包商自行逐項檢視及修正，惟本週(114 年 8 月 28 日)仍未修正。 ▣ 114/9/4 統包商簡報 P6，第 1 次建照變更設計取得核可後續作業時間管制表項次 2，五大管線第 1 次變更設計統包商已設定於第 2 次建照變更完成後辦理，第 167~170 次專技會	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							議已請修正相關內容，其他未說明事項請統包商自行逐項檢視及修正，惟本週(114 年 9 月 4 日)仍未修正。 ▣ 114/9/11 統包商簡報 P6，第 1 次建照變更設計取得核可後續作業時間管制表項次 2，五大管線第 1 次變更設計統包商已設定於第 2 次建照變更完成後辦理統包商已修正完妥。 ▣ 114/10/9 第 175 次專技會議，統包商說明實際以建照第二次變更設計取得後的時間作為五管實際掛件之時程依據。(建照第 2 次變更管制於 114 年 12 月 15 日) ▣ 114/12/16 專管單位以亞新(工管一)字第 1140074114 號函，提醒第二次建照變更設計相關事宜，請統包商加速辦理。 ▣ 114/12/18 另因第二次建照變更已逾原訂 114 年 12 月 15 日完成日期(詳統包商簡報 P5)，專管單位於 114 年 12 月 16 日以亞新(工管一)字第 1140074114 號函，提醒有關第二次建照變更設計請統包商加速辦理。 ▣ 114/12/30 北工處以備北工營字第 1140012237 號函，說明第二次建照變更設計已逾專技會議管制取得時程，請統包商盡速辦理相關作業及先行辦理五大管線變更資料整備作業，於建照變更核准後，即時向各主管機關辦理掛件。 ▣ 115/1/15 第 189 次專技會議，統包商簡報 P5，五大管線第一次變更掛件日期預定為 115 年 1 月 16 日，因目前第二次建照變更尚未核准，請統包商重新檢討掛件日期。 ▣ 115/1/22 第 190 次專技會議，經統包團隊重新	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							檢討五大管線第一次變更掛件日期，調整為 115 年 3 月辦理。 ▣ 115/1/29 第 191 次專技會議，統包商簡報 P31，污排水、給水、電氣(台電)、電信，統包團隊預定 115 年 3 月 2 日掛件，相關作業期程應避免影響現場工進。消防變更部分，俟建照報備完成後辦理，預計 115 年 5 月 4 日消防掛件。 ▣ 115/2/26 第 194 次專技會議，統包設計單位說明，預定 115 年 2 月 26 日發文提送電力、電信變更設計，需起造人用印之資料，請統包商務必於函文內說明用印緣由，以利陳核。 ▣ 115/3/4 統包商簡報 P5 第一次執照變更取得核可後後續作業時間管制表，請統包團隊將實際完成欄位往前調整(其餘請統包團隊自行斟酌修正方式)，並新增第 2 次建照報備及確實更新各列項辦況，統包商以完成修正。 ▣ 115/3/11 統包商簡報 P5 第一次執照變更取得核可後後續作業時間管制表，項次 2 之項目名稱請修正為第 2 次建照報備。另施工節點之一樓版勘驗日期與 P4 整體進度說明不一致，請修正。 ▣ 115/3/18 統包商簡報 P28 第二次執照變更取得核可後後續作業時間管制表(上週專技會議(3/11)簡報頁碼為 P5)說明如后： ■ 前次會議請統包商將項次 2 之項目名稱請修正為第 2 次建照報備，未修正。施工節點若不影響施工，請補充說明。 ■ 項次 3 五大管線第一次變更設計之施工節	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							點，請統包商團隊依施工網圖重新修正。 ▣ 115/3/25 統包商簡報 P27，第二次執照變更取得核可後後續作業時間管制表(上週專技會議(3/18)簡報頁碼為 P28)說明如后： ■ 前次會議請統包商將項次 2 之項目名稱請修正為第 2 次建照報備，未修正；施工節點若不影響施工，統包商已補充說明。 ■ 項次 3 五大管線第一次變更設計之施工節點，請統包商團隊依施工網圖重新修正；115 年 3 月 25 日第 198 次專技會議，統包團隊表示，五大管線第一次變更不影響基礎版勘驗，後續請統包商仍務必內控管制變更完成時程，以避免影響現場工進。 ▣ 115/7/16 第 214 次專技會議，115 年 7 月 16 日第 214 次專技會議，設計單位報告消防已依照消防大隊函文內容進行修正，預計於近日重新掛件送審，除消防圖說尚在審查及修正階段外，給排水、電氣及電信等三項管線圖說已陸續取得核准。於取得核准圖說掃描檔後，儘速彙整提送。 ▣ 115/7/22 第 215 次專技會議，設計單位報告，消防局轉消防大隊於 7 月 2 日審圖，臺北市政府消防局於 115 年 7 月 3 日發函重新檢討，7 月 17 日修正後送審，7 月 21 日進入審查階段。給水於 115 年 3 月 19 日掛件、6 月 10 日清圖階段、6 月 16 日核准。電力於 115 年 4 月 10 日掛件、6 月 10 日清圖階段、7 月 14 日製作副本、7 月 15 日取得核准。電信於 115 年 3 月 23 日掛件、5 月 21 日取得核准。	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							▣ 115/7/30 第 216 次專技會議，設計單位報告。消防局轉消防大隊於 7 月 2 日審圖，臺北市政府消防局於 115 年 7 月 3 日發函重新檢討，7 月 17 日修正後送審，7 月 21 日進入審查階段，於 7 月 29 日收到核准函。給水於 115 年 3 月 19 日掛件、6 月 10 日清圖階段、6 月 16 日核准。電力於 115 年 4 月 10 日掛件、6 月 10 日清圖階段、7 月 14 日製作副本、7 月 15 日取得核准。電信於 115 年 3 月 23 日掛件、5 月 21 日取得核准。 ▣ 115/8/6 第 217 次專技會議，設計單位說明統包團隊於 115 年 8 月 3 日以 115 宏工字第 1150004554 號函，檢送本工程經各權責機關審查核定之五大管線第一次設計變更核准圖說資料；專管單位已於 115 年 8 月 5 日函轉工營中心備查。 ▣ 115/8/13 第 218 次專技會議，設計單位說明，五大管線第一次設計變更核准圖說已完成提送，目前俟機關核定；另就五管變更與核定的細設圖進行差異比較，經會議討論，為利後續變更設計及圖說調整有所依據，原則仍請統包設計單位正式函文提送，後續依程序辦理。 ▣ 115/8/18 第 219 次專技會議，設計單位說明，統包團隊前於 115 年 8 月 3 日以 115 宏工字第 1150004554 號函提送五大管線第一次設計變更核准圖說資料，專管單位並於 115 年 8 月 5 日函轉工營中心辦理；另依前次會議結論，統包團隊已就五管第一次變更核准圖說與核定細部設計圖說辦理差異比較，並於	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							115 年 8 月 17 日以 115 宏工字第 1150004815 號函正式提送相關資料，後續由專管單位依程序辦理審查及函轉作業。 ▣ 115/08/28 第 220 次專技會議，專管單位說明，已於 115 年 8 月 25 日以亞新（工管）字第 1150049670 號函陳報機關，建請機關同意將本案納入後續變更設計程序辦理。 ▣ 115/9/17 第 221 次~第 224 次專技會議，有關五管消防變更後 B、C 棟公共空間防煙垂壁替代方案，設計單位說明消防變更的部分，B 棟 1 樓公共空間門上方皆有 50CM 以上的不燃材，C 棟 1 樓無障礙廁所、男廁、女廁及茶水間天花高度由 240 公分調整為 270 公分之內容，以設計事宜程序確認，並於竣工前完成相關圖說報備。 ▣ 115/9/17(專管 9/18 收文)，北工處發函備北工營字第 1150007909 號，請專管單位配合五大管線第一次變更設計核准，檢附業管機關核准證明，並依契約規定完成設計疏責、同等品及工期增減等相關檢討後再行提送，俾利本處憑辦。 ▣ 115/9/24 第 224 次專技會議，專管單位發函回覆北工處發函備北工營字第 1150007909 號，建請機關以第 220 次專業技術協調會議說明，將本案納入後續變更設計程序辦理。	
2-5	第 156、192 次專業技術協調會	建照第二次變更設計(114/8/7)併第 1 次建照變更抽查意見、建	114/5/29 115/2/4				▣ 114/3/14 統包商說明第二次建照變更預計 114 年 8 月啟動，包含 1F~14F 平面、立面、建築面積、樓地板面積、都發局核准內容等，專管單位提醒由於第一次變更設計未檢討	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
		照第 2 次建照報備					內容包含：容積率、建蔽率、開挖面積、防火區劃、建照棟距、高程、建築平、立、剖面(如：立面外觀、隔間變動、消防栓移位、…等)、消防車動線與新設大門及既有設施設備界面、流出抑制設施容量、景觀植栽種類及綠覆率、透水鋪面面積及詳圖、滲透測溝詳圖、太陽能板、黃網線、各類圍牆範圍及圍牆型式…等之調整，且需與機電、結構、水利完成套繪整合，建議儘速一併納入辦理 ▣ 114/5/22 依第 142~155 次專技會議-結構檢核：依施工單位檢討目前涉及結構修正部分，除管理員室週圍空間外是否還有他處?因攸關結構外審變更(報備)及建照變更設計期程，114 年 4 月 30 日~114 年 5 月 22 日第 152~155 次專技會議說明「目前」未涉及結構外審，請統包商釐清本案是否已無涉及結構外審作業，避免再次辦理業管單位程序影響工進。 ▣ 114/5/29 機電檢核：請統包商確實掌握五管變更設計與建照變更設計送審內容一致性，避免退回重審或多次作業，請儘速提出機電檢核結論未提供。 ▣ 114/6/5 有關第二次建照變更設計依據專管提及未檢討項目(如：容積率、建蔽率、開挖面積、防火區劃、高程等)製作對照表逐項檢討，經 114/5/22(第 155 次)至 114/6/26(第 160 次)專技會議追蹤，未見檢討說明，請於下週專技會議回報。 ▣ 114/7/3 統包商簡報 P34，有關第二次建照變更面積比較經向統包商確認為地上層初步面	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							積檢討，因多項面積變動(如：建築面積、樓地板面積、陽台面積等等)，請設計單位在不影響現場施工前提下，加速檢討時程並盡速辦理建照變更。 ▣ 114/7/15 工營中心備工建管字第 1140009573 號函說明三要求統包商於文到乙週，將須納入第 2 次建照變更、五大管線變更內容與預訂送審掛件時間提送專管單位審查。 ▣ 114/7/17 第 163 次專技會議，設計單位說明將於 114 年 8 月 8 日前提送變更。另設計單位於會議中說明，有關誤植「連續壁單元總數」將一併納入第二次建照變更辦理。 ▣ 114/7/24 統包商以 114 宏工字第 1140005208 號函，函轉設計單位第 2 次建照變更及五大管線變更事宜(預計掛件時程)。 ▣ 114/7/30 專管單位以亞新(工管一)字第 1140041729 號函，審退有關第 2 次建照變更及五大管線變更，並要求文到 7 日內函覆。 ▣ 114/7/31 第 165 次專技會議，專管單位提醒統包商第 2 次建照變更及五大管線變更資料依函文時限提送。 ▣ 114/8/6 統包商以 114 宏工字第 1140005518 號函，提送申領建築執照第二次變更設計需檢附之必要文件用印。 ▣ 114/8/7 第 166 次專技會議，統包商說明建築執照第二次變更設計需檢附之必要文件用印正本資料已送達專管單位，目前專管單位辦理用印中。另專管單位於 114 年 7 月 30 日審退第 2 次建照變更及五大管線變更資料(變更內容與預訂送審掛件時間)，並要求文	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							到 7 日內函覆，目前尚未收到統包商提送資料，恐已逾要求期限，請統包商盡速於 114 年 8 月 8 日前函送。 統包商未說明第 1 次建照變更抽查(建築師公會)有關應依實際設計容積檢討審查意見澄清方式，請於下週專技會議說明。(有關「第 1 次建照變更抽查意見」併第 2 次建照變更事項列管) ▣ 114/8/8 專管單位以(114)亞新復興崗(專管)字第 0058 號備忘錄，檢退申領建築執照第二次變更設計需檢附之必要文件用印。 ▣ 114/8/14 統包商以 114 宏工字第 1140005702 號函提送第 2 次建照變更設計資料用印。第 167 次專技會議，統包商說明第 1 次建照變更抽查(建築師公會)審查意見已由都發局發文，經電話詢問建築師公會，公會表示資料已給都發局，直接與都發局對口，故第 1 次建照變更抽查(建築師公會)意見已納入第 2 次建照變更及說明理由項目，無需另案函復。 ▣ 114/8/15 專管單位以亞新(工管一)字第 1140047190 號函，函轉有關申領建築執照第 2 次變更設計資料用印案。 ▣ 114/8/18 專管單位以亞新(工管一)字第 1140047546 號函，催辦有關第 2 次建照變更及五大管線變更資料延遲提送案。 ▣ 114/8/20 人軍處以國空人庶字第 1140197602 號函，檢送申領建築執照第 2 次變更設計資料鈐印案。 ▣ 114/8/25 統包商第二次建照變更掛件完成(掛	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							件號碼：114-3456-00)。 ▣ 114/8/25 統包商以 114 宏工字第 1140005964 號函，函轉統包設計團隊「第 2 次建照變更及五大管線變更。 ▣ 114/8/29 專管單位以亞新（工管一）字第 1140049249 號函，審轉有關第二次建照變更及五大管線第一次變更預定掛件時程案。 ▣ 114/9/4 統包商於 114 年 9 月 4 日第 170 次專技會議回報，預計 114 年 9 月 8 日與建管承辦對圖。 ▣ 114/9/11 第 171 次專技會議，統包商說明 114 年 9 月 8 日與建管承辦對圖尚有需修正處，專管單位經查執照申請案件進度，科長於 114 年 9 月 11 日審查退回，請統包商盡速與建管承辦聯繫，了解初步審查意見，並於下週專技會議會報及說明。 ▣ 114/9/18 第 172 次專技會議，統包商說明 114 年 9 月 12 日建管處擬退並通知設計單位補正，設計單位預定 114 年 9 月 24 日提送修正後資料，請設計單位盡速辦理修正。 ▣ 114/9/24 設計單位預定 114 年 9 月 24 日提送修正後資料(截至 114 年 9 月 24 日第 173 次專技會議仍在修正中)，請設計單位盡速辦理修正，並上傳建管單位申請系統。 ▣ 114/9/25 設計單位將修正後資料上傳建管執照申請案件進度系統。 ▣ 114/10/2 第 174 次專技會議，原設計單位預定 114 年 9 月 24 日提送修正後資料，後續設計單位遲於 114 年 9 月 25 日將修正後資料上傳建管執照申請案件進度系統。另設計單位	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							說明，於 114 年 9 月 30 日與建管承辦約對圖日期，預定訂於 114 年 10 月 7 日下午 2 時與建管承辦對圖。 ▣ 114/10/7 下午 2 時與建管承辦對圖。 ▣ 114/10/8 至 114/10/17 進行修正圖說文件。 ▣ 114/10/9 建管單位審查意見回復辦況，並製作意見回復對照表及修正圖面之相關簡報。 ▣ 114/10/17 第 176 次專技會議，統包商簡報 P34~P35，有關建管審查意見回復辦況。依統包商簡報，「各層面積」及「建築面積」似有增減，惟未見相關調整說明，請於下次會議補充相關圖說，並檢討是否符合需求面積。 ▣ 114/10/21 第 2 次建照變更修正資料，修正完成並上傳建管系統。 ▣ 114/10/23 第 177 次專技會議，統包商於會中說明，第 2 次建照變更修正資料已於 114 年 10 月 21 日修正完成並上傳建管系統。另有關「各層面積」及「建築面積」似有增減，惟未見相關調整說明部分，設計單位說明各樓層面積調整不影響容積率，仍請設計單位於下週專技會議說明細部設計各樓層面積資料與建照變更面積調整內容，並確認是否符合統需書要求。工營中心提醒目前建照變更所提送之「面積計算表」與細設核定之面積計算表已有所差異，應依程序辦理變更或釋疑，並函請空軍確認。 ▣ 114/10/28 下午 3 時與建管承辦核對圖說資料，尚須補說明文件。 ▣ 114/10/29 第 178 次專技會議，本次會議設計單	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							位無法說明缺件情況，請於下次會議說明補件狀況。「面積計算表」與細設核定之面積計算表已有所差異，應依程序辦理變更或釋疑，並函請空軍確認。 ▣ 114/11/6 第 179 次專技會議，114/10/30 設計單位說明 114 年 10 月 30 日已與承辦確認初步意見，尚須補說明文件，請統包商盡速提送。 ▣ 114/11/13 第 180 次專技會議，統包商說明截至 114 年 11 月 10 建管單位長官審查中。 ▣ 114/11/20 第 181 次專技會議，截至 114 年 11 月 12 日建管單位長官及行政審查中，目前積極聯繫建管承辦中(經專管單位查詢執照申請案件進度，截至 114 年 11 月 18 日建管單位審核中)。 ▣ 114/11/27 第 182 次專技會議，統包設計單位於會中說明，預計 114 年 12 月 1 日~114 年 12 月 5 日約建管承辦對資料，經專管單位於會中與統包設計單位確認，係因申請書與變更說明不一致，需再與建管承辦說明及核對。 ▣ 114/12/4 第 183 次專技會議，統包設計單位於會中說明，114 年 11 月 28 日申請書與變更說明不一致修正完成，114 年 12 月 4 日再次與建管承辦核對相關圖說。 ▣ 114/12/11 第 184 次專技會議，統包設計單位於會中說明，114 年 12 月 4 日與建管承辦完成對圖，截至 114 年 12 月 10 日建管單位正工程司審核中。 ▣ 114/12/16 專管單位以亞新(工管一)字第 1140074114 號函，提醒第二次建照變更設計相關事宜，請統包商加速辦理。	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							▣ 114/12/18 第 185 次專技會議，統包設計單位於會中說明，114 年 12 月 17 日建管處幫工程司驗收退回原因，預定本日向建管單位確認辦況，請統包設計單位向建管單位確認後於大群回報(至 114 年 12 月 19 日尚未回報)。 ▣ 114/12/24 第 186 次專技會議，統包設計單位於會中說明，目前核對副本相關資料準備中，預計 114 年 12 月 29 日前發文提送各單位用印；另請統包商於函文內務必說明申請用印緣由，以利審轉空軍協助用印。 ▣ 114/12/29 統包商以 114 宏工字第 1140008955 號函，提送建築執照第二次變更設計副本製作前用印文件。 ▣ 114/12/30 北工處以備北工營字第 1140012237 號函，說明第二次建照變更設計已逾專技會議管制取得時程，請統包商盡速辦理相關作業。 ▣ 114/12/31 專管單位以亞新(工管一)字第 1140076666 號函，審轉建築執照第二次變更設計副本製作用印文件予空軍。 ▣ 115/1/7 人軍處以國空人庶字第 1150001820 號函，申領建築執照第 2 次變更設計副本製作文件鈐印案。 ▣ 115/1/15 第 189 次專技會議統包設計單位於會中說明，預定 115 年 1 月 16 日上午 09:00 與建管單位核對副本，預定 115 年 1 月 23 日可完成第 2 次建照變更。另請統包設計單位明日(1/16)於 LINE 大群即時回報核對辦況。 ▣ 115/1/19 第 2 次建照變更核准。 ▣ 115/1/22 第 190 次專技會議，請統包團隊函送	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							第 2 次建照變更設計後完整執照及圖說(含往來文件)並確認本次變更後圖資與細設一致，若有差異依契約規定辦理後續，以利轉呈機關備查。另建議現場應有一本 A1 圖冊供長官查詢部分，統包商說明契約未規定須提供 A1 圖冊，後續提送備查時僅會以 A3 或 A4 紙本(含電子檔)。統包商簡報 P33，統包設計單位於會中說明，因第 2 次建照變更之建築物概要表 3 數值誤植(第 2 次變更設計最終加總無誤)，須再辦理建照變更報備，統包商團隊預定 115 年 1 月 23 日發文申請用印，並請務必於來函內說明緣由，以利簽辦。 ▣ 115/1/23 統包商以 115 宏工字第 1150000526 號函提送報備申請書用印。 ▣ 115/1/27 專管單位以亞新(工管一)字第 1150004884 號函審轉報備申請予空軍協作用印。另前開統包設計單位 115 年 1 月 23 日提送之報備申請書用印資料，僅說明建築物概要表 3 數值誤植(函附件)。 ▣ 115/1/29 統包商以 115 宏工字第 1150000697 號函，檢送第二次建造執照變更設計核准書圖文件相關事宜(附件紙本 115 年 1 月 30 日送達)。 ▣ 115/1/29 第 191 次專技會議，統包商以 115 宏工字第 1150000697 號函說明「面積計算表」雖有差異，但不影響實際施工數量，修正數值納入竣工圖說修正。 ▣ 115/1/29 第 191 次專技會議說明須新增 13~14F 梯廳排煙窗、B 棟幼兒園排煙窗尺寸及天花	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							板高程調整，並須一併納入本次建照報備項目，因與專管單位 115 年 1 月 27 日審轉空軍內容不一致，請統包團隊避免再次發生，以免增加建管報備程序時程。另請統包商釐清與原核准細設差異，並依契約規定辦理後續變更調整。 ▣ 115/2/2 人軍處以國空人庶字第 1150026423 號函檢送建築執照報備申請書鈐印資料予統包商。 ▣ 115/2/3 專管單位以亞新(工管一)字第 1150006250 號函，審轉第 2 次建造執照變更設計核准書圖文件予工營中心備查。 ▣ 115/2/4 第 192 次專技會議，統包商簡報 P41~P45，有關統包設計單位再次說明須新增 13~14F 梯廳排煙窗、B 棟幼兒園排煙窗尺寸及天花板高程調整，並一併納入 115 年 1 月 23 日 115 宏工字第 1150000526 號函提送報備申請書之建照報備項目辦理，請統包設計單位務必先向空軍單位說明，俟取得空軍用印資料時，請提供完整建照報備資料予專管單位存查。 ▣ 115/2/5 統包團隊取得人軍處用印文件。 ▣ 115/2/10 統包設計單位至建管處完成建照第 3 次變更設計(報備)掛件。 ▣ 115/2/11 第 193 次專技會議，有關建照變更所提送之「面積計算表」與細設核定之面積計算表已有所差異，應依程序辦理變更或釋疑，並函請空軍確認，本次專技會議統包商設計單位說明，預定建照第 3 次變更設計報備完成後 2 週內提送。	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							▣ 115/2/12 工營中心以備工建管字第 1150001866 號函同意備查第 2 次建造執照變更設計核准書圖文件。 ▣ 115/2/23 第 3 次建照變更設計(報備)，設計單位已於 115 年 2 月 23 日至建管單位繳費及核對圖說。 ▣ 115/2/26 第 194 次專技會議，統包設計單位說明，第 3 次建照變更設計(報備)，訂於 115 年 2 月 26 日下午 2 時再次至建管單位核對圖說。 ▣ 115/3/4 第 195 次專技會議，統包設計單位說明，本日(3/4)提送公會審查通過圖說至建管處；另因建照變更設計與報備之建管程序不同，本項次配合修正為建照第 2 次報備。 ▣ 115/3/11 第 196 次專技會議，統包設計單位說明，已於 115 年 3 月 4 日送公會審查通過圖說至建管處，目前待建管承辦審查中。 ▣ 115/3/18 第 197 次專技會議，統包設計單位說明，115 年 3 月 17 日上午 10 時至建管處完成對副本，俟取得建管單位核准函文後，一週內依據契約規定提送建照第 2 次報備資料予工營中心備查。 ▣ 115/3/18 臺北市政府都市發展局於 115 年 3 月 18 日以北市都授建字第 1156011468 號函同意備查。 ▣ 115/3/24 統包商以 115 宏工字第 1150001742 號函，檢送第二次建造執照報備核准資料相關事宜，目前專管單位審查中。 ▣ 115/3/30 專管單位函轉亞新（工管一）字第 1150015661 號，第 2 次建造執照變更報備核	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							准資料相關事宜，詳如說明，請機關備查。 ▣ 115/04/16 工營中心 115 年 4 月 13 日備工建管字第 1150004296 號函同意備查第二次建造執照報備核准資料。 ▣ 115/04/24 統包商提送建照第 2 次報備圖說與原核准細設圖差異，辦理細設圖說調整事宜，依 115 年 4 月 24 日 115 宏工字第 1150002456 號函提送細設及執照圖說差異比較資料，專管單位審查中。 ▣ 專管單位於 115 年 4 月 28 日亞新（工管一）字第 1150022994 號函回覆細部設計圖說與建造執照第二次變更差異比較資料相關事宜。 ▣ 115/4/29 第 203 次專技會議，設計單位在會議中回覆，細部設計圖說與建造執照第二次變更(報備)，因為時間差的問題,建築執照變更已調整為與細部設計核准圖一致為主，建造執照第二次報備，主要差異是在消防的部份，配合消防變更的檢討，B 棟_1 樓幼兒園之排煙窗及天花板高程調整，會盡快整理相關資料發函回覆。 ▣ 115/05/07 第 204 次專技會議，設計單位回覆以於 115 年 5 月 6 日以 115 宏工字第 115550002729 號函回覆，後續專管監造單位會儘速辦理審查，並依審查結果續行相關程序。 ▣ 115/05/14 第 205 次專技會議，專管單位於 115 年 5 月 12 日以亞新（工管一）字第 1150025040 號函文機關，同意廠商以設計釋疑辦理。 ▣ 115/05/28 第 206 次至第 207 專技會議，專管單	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							位說明請盡快辦理圖說釋疑。 ▣ 115/06/04 第 208 次專技會議，專管單位請統包商儘速辦理圖說釋疑。設計單位說明，本項主要係因 B 棟 1 樓排煙窗及天花板高度等內容，於第二次報備變更送審過程中配合消防審查意見辦理調整，致部分內容與原細設圖說不符。另第二次報備變更相關圖說、差異表及附件資料均已完成彙整，經會議討論，本項原則併入第二次建照變更一併辦理；惟如現場施工時程不及，得先以圖說釋疑或設計事宜方式先行釐清，後續再併同第二次建照變更程序辦理。 ▣ 115/06/17 第 210 次專技會議，專管提醒倘涉及建築法第 39 條變更設計要件，應先行辦理變更設計程序後再行施工，請避免先行施工情事再發生。 ▣ 115/9/17 第 211 次~225 次專技會議，設計單位報告審圖作業持續進行，而針對五管變更是否會影響現場施作事宜，回覆如下：1.地下室管線原規劃均採樑下施作，並無設計穿樑，不涉結構體脂開孔或破壞。2.金屬(鐵)管部分採用管吊架施作，僅 2 吋以下 PVC 管為暗埋施作，且該暗埋管路均敷設於樓版或牆內，未穿越樑柱結構。3.綜上，本次圖說變更應不涉穿樑及埋柱等影響結構強度之情形，故應不影響結構施工。	
2-6	第 156 次專業技術協調會	綠建築	114/5/29				▣ 114/3/4 完成 email 諮詢掛件。 ▣ 114/3/6 第 144 次專技會議，統包商說明檢討指標包含綠化量、基地保水、日常節能、二氧碳化減量及水資源，並提供總表結論。	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							▣ 114/3/13 日第 145 次專技會議，統包商說明依 113 年 9 月 10 日北工處核定預定進度表之管制時間於 115 年 2 月 23 日一樓板勘驗前取得綠建築候選證書，目前尚待建築中心通知 114 年 3 月 4 日掛件後諮詢之審查意見。另說明「室內環境指標」(屬室內健康與舒適度檢討)因無法取得通風環境項目得分，且非門檻項目未計入。機關請統包商補充說明為何不申請「污水及垃圾改善指標」、「生物多樣性指標」，並請統包商於 114 年 3 月 21 日專技會議補充說明。 ▣ 114/3/27 第 147 次專技會議統包商說明「污水及垃圾改善指標」、「生物多樣性指標」非門檻項目未計入。 ▣ 114/4/2 工營中心請統包商於 114 年 4 月 2 日第 148 次專技補充說明除門檻項目外之其他未納入項目說明未提供。 ▣ 114/4/9 綠建築完成正式掛件 ▣ 114/4/10 統包商未提供建築中心通知 114 年 3 月 4 日掛件後諮詢之審查意見，另說明目前申請項目包含「綠化量、基地保水、日常節能、CO2 減量、廢棄物減量、水資源、污水垃圾改善」等 7 項指標，其餘「生物多樣性」及「室內環境」指標不申請，並於 114 年 4 月 9 日完成掛件(未提供證明文件，經證實應為 114 年 4 月 14 日)。 ▣ 114/4/17 工營中心於 114 年 4 月 2 日請統包商提出「生物多樣性」不申請原因，至 114 年 4 月 10 日未提供，114 年 4 月 17 日說明已與機關確認不納入原因(惟未告知專管單	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							位)。 ☐ 114/4/29 綠建築完成繳費。 ☐ 114/5/2 綠建築完成正式掛件。 ☐ 114/5/5 建築中心提供審查意見，建議通過項目為基地保水指標及二氧化碳減量指標。 ☐ 114/5/20 統包商 Email 提送複審資料至建築中心。 ☐ 114/5/27 建築中心提供審查意見，建議通過項目為綠化量指標、日常節能指標、照明系統 EL、固定耗能設備、廢棄物減量指標、水資源指標、污水垃圾改善指標。 ☐ 114/5/29 統包商 Email 提送複審資料至建築中心。 ☐ 114/6/3 另為配合後續召開大會後之審查意見修正尚須補正時間，原 30 日作業時間，已使用約 17 日，設計單位以 114/6/3 王師復興崗字第 1140603001 號函，申請候選綠建築證書評定展延 30 日。 ☐ 114/6/4 專管單位以亞新(工管一)字第 1140029542 號函，函轉人軍處協助。 ☐ 114/6/6 建築中心召開評定會議，人軍處於大群 Line 提供綠建築審查意見。 ☐ 114/6/9 人軍處以國空人庶字第 1140131867 號函，提送候選綠建築證書評定申請展延案。 ☐ 114/6/11 設計單位完成委員意見補正，並 Email 至建築中心複審。 ☐ 114/6/13 建築中心第二次提供大會審查意見。 ☐ 114/6/13 財團法人建築中心以中建環字第 1143062514 號函，綠建築等級評定為銅級，評定通過。	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							▣ 114/6/18 設計單位完成第二次大會審查意見補正，並 Email 至建築中心複審。 ▣ 114/6/20 人軍處以國空人庶字第 1140143111 號函，函轉建築中心第 59 次評定會議會議紀錄(銅級評定通過)。 ▣ 114/6/26 第 160 次專技會議，統包商回報，目前尚未收到評定書相關資料，俟收到資料後續辦後續事宜。另請統商檢討綠建築各項指標(綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、水資源、污水垃圾改善)與細部設計差異性。 ▣ 114/7/3 第 161 次專技會議，統包商於會議說明，於 114 年 7 月 1 日提供本工程開工證明予建築中心，目前尚未收到建築中心相關通知。 ▣ 117/7/7 建築中心以中建環字第 11401624058 號函，寄出評定書 1 式 2 份。 ▣ 114/7/11 人軍處以國空人庶字第 1140162405 號函，檢送候選綠建除證書評定。 ▣ 114/7/17 第 163 次專技會議，設計單位說明依都發局函文回覆本案須達第 1+級，已請評定顧問評估照明減量及空調節能中。 ▣ 114/7/18 統包商以 114 宏工字第 1140005059 號函，檢送綠建築標章及建築能效標示審核認可申請書用印。 ▣ 114/7/21 專管單位以亞新(工管一)字第 1140040339 號函，綠建築標章及建築能效標示審核認可申請書用印函轉人軍處。 ▣ 114/7/23 人軍處以國空人庶字第 1140174189 號函，檢送綠建築標章及建築能效標示審核	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							認可申請書鈐印。 ▣ 114/7/28 統包商以 114 宏工字第 1140005267 號函申請候選綠建築證書評定規費。 ▣ 114/7/31 專管單位以亞新(工管一)字第 1140042380 號函，審退有關貴公司申請候選綠建築證書評定規費案。 ▣ 114/8/27 人軍處以國空人庶字第 1140203092 號函，函送申請候選綠建築證書(住宿類)，綠建築等級為銅級。 ▣ 114/8/29 統包商以 114 宏工字第 1140006085 號函申請候選綠建築證書評定規費(併 114/9/4 函文辦理申請)。 ▣ 114/9/2 工營中心以備工建管字第 1140012852 號函，請統包商盡速依契約規定提送核准之綠建築評定報告書備查(含與細部設計核定版差異比較說明)。 ▣ 114/9/4 統包商以 114 宏工字第 1140006253 號函，申領候選綠建築評定規費(含證書費及審查費)事宜。 ▣ 114/9/5 專管單位以亞新(工管一)字第 1140051894 號函，提送有關統包商申請候選綠建築證書評定規費及證書規費代墊款項核付事宜代墊款項核付事宜。 ▣ 114/9/11 請統包商依據工營中心 114 年 9 月 2 日備工建管字第 1140012852 號函，請統包商盡速依契約規定提送核准之綠建築評定報告書備查(含與細部設計核定版差異比較說明)。 ▣ 114/9/18 第 172 次專技會議，設計單位說明預定 114 年 10 月 3 日提送綠建築評定報告書	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							備查(含與細部設計核定版差異比較說明)。 ▣ 114/10/3 統包商以 114 宏工字第 1140006934 號函，檢送候選綠建築評定書及圖說與細部設計第五階段圖說差異事宜。 ▣ 114/10/9 專管單位以亞新(工管一)字第 1140058436 號函，審退候選綠建築評定書及圖說與細部設計第五階段圖說差異事宜。 ▣ 114/10/17 第 176 次專技會議，統包團隊說明：經查，綠建築評定報告書與細部設計圖說差異部分，後續併入綠建築標章階段辦理調整(候選綠建築無需辦理變更)。尊重統包商本階段暫不辦理變更，請統包商正式回覆說明並重新提送綠建築評定報告書及圖說與細部設計第五階段圖說差異表(表內容應詳列差異項目(PCM 意見)並列管於綠建築標章階段辦理)。 ▣ 114/10/23 統包商承諾 114 年 10 月 31 日前發文提送。 ▣ 114/10/31 統包商以 114 宏工字第 1140007481 號函，檢送候選綠建築評定書及圖說與細部設計第五階段圖說差異相關資料。 ▣ 114/11/6 專管單位以亞新(工管一)字第 1140064186 號函，檢送候選綠建築評定書及資料光碟予工營中心備查，另有關與細部設計第五階段圖說差異相關資料併入綠建築標章階段辦理調整。 ▣ 114/11/13 第 180 次專技會議，有關綠建築評定書與細設差異部分，請統包商先行評估目前若依已核定之細部設計圖進行施工，能否符合統需書規定須取得銅級標章，請於下週專	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							技說明何時能確認評估結果。 ▣ 114/11/14 工營中心以備工建規字第 1140016480 號函，備查經內政部准予認可之候選綠建築評定書，其有關候選綠建築評定書與細設差異部分，請專管單位持續督導統包商辦理調修，並納入每月成果會議管制定期回報辦況。 ▣ 114/11/20 第 181 次專技會議，統包設計單位於會中說明，預計 114 年 12 月 4 日專技會議回報依據細部設計圖進行施工，能否符合統需書規定須取得銅級標章之評估結果。 ▣ 114/11/26 北工處以備北工營字第 1140010907 號函，有關綠建築評定資料與細部設計或建築執照核定圖說尚未一致部分，請專管納入每週專技會議管制辦理，並於月成果會議回報辦況，以利後續作業。 ▣ 114/11/27 第 182 次專技會議，統包商簡報 P35~36 說明，有關候選綠建築評定報告書與細部設計圖說差異部分，尚不影響評定書內容，微調整項目後續併入綠建築標章階段辦理；仍請統包團隊評估目前若依已核定之細部設計圖進行施工，能否符合統需書規定須取得銅級標章，並依先前會議結論，預計 114 年 12 月 4 日專技會議回報。 ▣ 114/12/4 第 183 次專技會議，於 114 年 11 月 20 日第 181 次專技會議，統包設計單位於會中說明，預計 114 年 12 月 4 日專技會議回報依據細部設計圖進行施工，能否符合統需書規定須取得銅級標章之評估結果，惟 114 年 12 月 4 日專技會議未回報，請統包團隊	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							於下週專技會議回報。 ▣ 114/12/11 第 184 次專技會議，統包設計單位於會議中說明，於 114 年 12 月 3 日與顧問確認本次修改資料，例如陰影、停車格、高程標示等，均與綠建築無關，尚不影響得分；專管單位於會中再次向統包設計單位確認，若依已核定之細部設計圖進行施工，能否符合統需書規定須取得銅級標章，統包設計單位回復，原則不影響取得銅級標章，惟後續現場施工若因調整影響，屆時將配合辦理修正。	
2-7	第 156、195 次專業技術協調會	建築能效評估方案(揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式)	114/5/29 115/3/4				▣ 114/3/13 國防部軍備局工程營產中心北部地區工程營產處備北工營字第 1140002092 號函辦理。 ▣ 114/3/24 專管單位請統包商「...先行檢視契約規範及預算額度，...，先行評估相關內容，後續配合申辦進度辦理修約作業...。」及本案都市設計及土地使用開發許可審議報告書之附錄 P.37「本案屬公有建築物，目前尚未進入細部設計階段，未來會依綠建築手冊規定達建築能效評估標準 1 級。」內容，儘速檢討本案是否需申辦建築能效評估及倘需辦理之評估說明(含作業時機、時程及預算...等)。 ▣ 114/3/27 專技會議專管單位提醒本案之都市設計準則(統包商於附件十三審查意見回覆表說明：配合修正淨零排碳建築能效等級達 1 級)及都審報告書(第肆章 P.85 法令檢核之建築師簽證查核說明及附錄 P.37 說明：目前尚未進入細部設計階段，未來依綠建築手冊	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							規定達建築能效評估標準 1 級。)，統包商皆已承諾檢討並辦理，然統包商更正說明非達法令適用期不辦理，已與都審報告書內容違背，請統包商儘速函文國土署確認是否需要辦理，另由於為都審報告書承諾事項，若後續不辦理，請一併辦理都審變更報備，並依業管單位指示辦理後續。 ▣ 114/4/2 統包商說明已分別於 114 年 3 月 26 日發文臺北市政府都市發展局、114 年 3 月 28 日發文內政部國土管理署及內政部建築研究所詢問本案是否需辦理建築能效，尚待業管機關回覆。 ▣ 114/4/10 第 149 次專技會議統包商說明因詢問業管機關方式有誤被退回(未提供證明文件) ▣ 114/4/24 至 114 年 4 月 17、24 日尚未重新發文詢問業管機關，機關請統包商於 114 年 4 月 30 日前發文詢問未函詢。 ▣ 經 114/4/30(第 142 次)至 114/6/26(第 160 次)專技會議追蹤，統包商尚未辦理。 ▣ 114/4/30 第 152 次專技會議，統包商說明 114 年 5 月 2 日完成函詢。 ▣ 114/5/6 函詢內政部建築研究所、說明二(略以)：「都審另有規定者，得從其規定」，與統包商說明非達法令適用期不辦理不一致，則應一併於都審變更報備說明不辦理能效一級。 ▣ 114/6/12 第 158 次專技會議，設計單位說明都審報告書內提及之能效 1 級部分，不與都審報告書報備或變更併同辦理，將於 114 年 6 月 20 日前另案發文都發局；由於為都審報	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							告書承諾事項，請務必辦理變更報備，並依業管單位指示辦理後續。 ▣ 114/6/19 第 159 次專技會議，建築能效 1 級設計單位與會中調整於 114 年 6 月 27 日另案發文都發局。 ▣ 114/6/26 第 160 次專技會議，統包商說明預定 114 年 6 月 27 日前發文都發局辦理建築能效 1 級事宜；由於為都審報告書承諾事項，請務必辦理變更報備，並依業管單位指示辦理後續。 ▣ 114/6/27 統包商以師復興崗字第 1140627003 號函，辦理於申請綠建築標章時，得否需依規定辦理建築能效評估事宜。 ▣ 114/7/3 專管單位以亞新(工管一)字第 1140035428 號函，說明有關本案於申請綠建築標章時，得否需依規定辦理建築能效評估事宜。統包商發函臺北市政府都市發展局(簡稱：都發局)詢問本案於申請綠建築標章時，得否需依規定辦理建築能效評估事宜，卻未正面說明依附件 114 年 5 月 14 日內政部建築研究所函文說明二(略以)：「...都市設計審議等另有規定者，得從期規定。」及都市設計審議核准報告書 P.85、附錄十六 P.37 說明(略以)：「未來會依綠建築手冊規定達建築能效評估標準 1 級」之本案是否辦理建築能效評估提供相關澄清論述，恐影響都發局無法針對詢問事項給予直接回覆(如：不須辦理、...等說明)，及後續細部設計需再次配合辦理建照及五大管線變更設計或報備及相關期程往後延宕之變數。	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							▣ 114/7/17 第 163 次專技會議，設計單位說明依都發局函文回覆本案須達第 1+級，已請評定顧問評估照明減量及空調節能中。 ▣ 114/7/24 專管單位以亞新(工管一)字第 1140041746 號函，提醒有關綠建築標章及建築能效標示審核認可申請。(依據統包商 114/7/18 統包商以 114 宏工字第 1140005059 號函續辦) ▣ 114/7/24 第 164 次專技會議，專管單位於本日(7/24)發函提醒統包團隊依契約及法令規定辦理建築能效評估第 1+級。有關建築能效機關協助洽詢建研所，建研所建議比照民間住宅計算方式辦理較為妥適，另統包商於專技會議說明，統包團隊評定顧問初步建議之空調調整、燈具調整等，請統包團隊與顧問再次討論，並於下週專技會議提出說明。 ▣ 114/7/28 工營中心以備管建字第 1140010618 號函，送業管機關審查核准文件提送案，要求 114 年 8 月 8 日前提送建築能效評估初步檢討。 ▣ 114/7/31 第 165 次專技會議，有關建研所建議比照民間住宅計算方式，統包商說明因重新計算需要時間，預定 114 年 8 月 28 日於專技會議說明辦況。 ▣ 114/8/1 先行於 LINE 大群通知工營中心要求 114 年 8 月 8 日前提送建築能效評估初步檢討。 ▣ 114/8/4 專管單位以亞新(工管一)字第 1140043496 號函，有關送業管機關審查核准文件提送案，建築能效評估初步檢討，請貴	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							公司於 114 年 8 月 6 日前檢附相關資料函送專管單位審查。 ▣ 114/8/6 統包商以 114 宏工字第 1140005542 號函，有關建築能效評估為釐清本案後續適用規定，原核定細設內容須配合調整項目是否涉及其他契約變更等初步檢討作業時間展延事宜。 ▣ 114/8/8 專管單位以亞新（工管一）字第 1140045017 號函，審轉工營中心同意統包商展延至 114 年 8 月 25 日前提送建築能效評估初步檢討資料。 ▣ 114/8/14 第 167 次專技會議，統包商說明俟內政部建築研究所及財團法人台灣建築中心函覆建築能效評估適用版次及檢討類別確認後，再續辦建築能效評估相關事宜；專管單位提醒建築能效初步評估設計單位展延，經初步僅同意展延至 114 年 8 月 25 日，請統包團隊依時限辦理。 ▣ 114/8/21 第 168 次專技會議，因設計單位俟取得內政部建築研究所函覆確認後，再續辦建築能效評估相關事宜；另建築能效評估工營中心於 114 年 8 月 18 日備工建管字第 1140011754 號函送同意展延至 114 年 8 月 25 日，設計單位原預計 114 年 8 月 15 日前方能取得內政部建築研究所函覆，即可依原展延限提出，惟截至 114 年 8 月 21 日仍未收到內政部建築研究所函覆，另因目前暫不影響現場工進，設計單位預計再展延至取得內政部建築研究所函覆後 7 日提出初步計算資料部分，專管單位無意見，須請設計單位	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							於函送建築能效評估資料時，於函文內敘明延後提送緣由及考量，以利簽辦。 ▣ 114/8/28 第 169 次專技會議，請統包商依據 114 年 8 月 21 日第 168 次專技會議結論於取得內政部建築研究所函覆後 7 日提出初步計算資料予專管單位審查。 ▣ 114/9/4 第 170 次專技會議，有關建築能效初步評估設計單位於會中說明，目前能效評估顧問仍在計算中，因作業不及無法於原訂期限內提出初步評估資料，且試算後內容需再進行研討，故需再展延至 114 年 9 月 18 日，前述展延日期在不影響現場工進前提下，專管單與北工處無意見，仍須請設計單位於函送建築能效評估資料時，於函文內敘明延後提送緣由及考量，以利簽辦。 ▣ 114/9/11 統包商簡報 P41~P46，有關能效評估統包商於第 171 次專技會議中說明，經核算目前為 2 級，要達 1+ 級，預計調整空調、照明、揚水泵、瓦斯爐、電梯，針對統包商調整項目專管單位意見詳附件六資料，請統包商針對專管單位意見於下週專技會議時，列表回復及說明。另專管單位目前針對簡報內容提出欲調整項目之初步審查意見，後續仍需依統包商提送之建築能效評估資料審查意見為主。另施工單位於會議中表示，建築能效調整之項目後續恐影響施工單位材料設備發包作業執行，請統包團隊相互加緊評估速度。 ▣ 114/9/18 有關建築能效初步評估展延部分，第 172 次專技會議，統包團隊說明建築能效評	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							估目前內部仍持續討論中，預計需再展延至 114 年 10 月 9 日提出初步評估資料，專管單位提醒，統包團隊欲展延日期在不影響現場工進前提下無意見，建築能效初步評估若因統包團隊持續延宕，進而影響材料設備發包作業執行或現場工進，仍屬統包團隊責任。另專管單位目前針對簡報內容提出欲調整項目之初步審查意見，於會中統包商說明因評估資料尚在統合及內部討論，有關專管單位初步審查意見預定 114 年 10 月 2 日前於專技會議回報。 ▣ 114/9/24 第 173 次專技會議，設計單位於會中說明，目前照明及揚水系統包團隊仍討論中。 ▣ 114/10/2 第 174 次專技會議，設計單位於會中說明，目前評估之揚水泵可採緩啟動變頻式馬達(馬達揚水泵流量變小，馬力也會變小，泵浦數量不變，配管可維持原有尺寸)，另照明 W/M2 用電量上在計算中，另有關專管單位初步審查意見設計 114 年 10 月 2 日於專技會議回報，預定 114 年 10 月 9 日上午 09:30 於工地召開建築能效研討會議(含專技會議)，專管單位已於 LINE 先行通知，並請統包團對於 114 年 10 月 3 日提供建築能效相關資料及 114 年 10 月 7 日提供會議簡報，以利討論。 ▣ 114/10/9 第 175 次專技會議，統包團隊提出建築能效評估簡報，惟提出之初步評估資料尚須修正，並須新增建築能效方案評估表等表單(至少包括原細設方案、都審方案、其他	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							符合 1+級之調整方案)，照明應提供照度模擬圖、發光效率、配光曲線、相關參數設定等說明；揚水泵調整不能影響使用需求，請補充相關說明。請統包團隊建築能效顧問與專管單位顧問於下週先行討論合宜方案，於 114 年 10 月 23 日專技會議提出方案予使用單位於會議中討論，並於 114 年 10 月底前提出確定方案予工營中心。 ▣ 114/10/17 第 176 次專技會議，原要求統包團隊建築能效顧問與專管單位顧問於本週先行討論合宜方案，惟目前統包商持續評估中，而尚未討論。配合工營中心管制時程仍請統包商於 114 年 10 月 21 日前提供建築能效評估資料專管單位審視，以利於 114 年 10 月 23 日專技會議討論。 ▣ 114/10/23 第 177 次專技會議，統包團隊提出建築能效評估簡報及建築能效方案資料，經會中討論以方案 01、02 較為可行，請統包團隊方案 01 為原則，另依專管單位建議，調整烹飪設備為能效 1 級瓦斯爐與原 IH 爐得分差異。另請統包團隊提供各效能計算影響性、依據及配分權重之差異，以利決策參考。因仍有部分項目(燈具、揚水泵)尚未與專管單位討論，請統包團隊建築能效顧問、機電技師與專管單位顧問先行討論合宜方案，於 114 年 10 月 27 日前提出方案並上傳大群，另於 114 年 10 月 29 日下午 3 時 30 分專技會議討論，須於 114 年 10 月底前提出方案予工營中心。 有關照明部分，照度模擬不得低於統需書為	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							原則，若影響再檢討燈具發光效能等相關規格與檢討資料，並須檢討價差。 有關候選綠建築能效評估第 1+ 級，由建管單位函文要求，雖第 1 次建照變更附註未說明，目前仍辦理第 2 次變更中，恐將納入附註說明內之應辦事項，建議統包商團隊仍以 1 樓版勘驗前取得候選建築能效評估第 1+ 級證書為目標，避免影響建管勘驗程序延誤工進。 ▣ 114/10/29 第 178 次專技會議，本次會議統包團隊建築能效建築能效顧問未依據第 175、177 次專技會議結論，與專管單位顧問討論合宜方案，以致無法於專技會議提出方案予使用單位在會議中討論，無法依工營中心要求於 114 年 10 月 31 日前提出確定方案，需再展延，初步評估資料預計需再展延日期請統包商於下週專技會議回報，請統包團隊勿再拖延，以免影響現場工進。請下週五前(114 年 11 月 7 日)須與專案管顧問召開會議確認揚水泵及瓦斯爐方案，並請統包商於本週五(114 年 10 月 31 日)前確認下週可開會日期及時間，以利專管單位邀集顧問與會，並須於 114 年 11 月 13 日專技會議提出方案予使用單位於會議中討論。 就統包團隊簡報 P41~P46 燈具方案，依據統需書客餐廳照度需 300 LUX 以上，臥室及浴室需 200 LUX 以上；以四房型為例，臥室照度區間自 231~330 LUX(大於統需書需求)，客餐廳約 263 LUX(小於統需書需求)，請以上次會議結論(減少燈具數量，採用高	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							效能燈具，並應符合需求書照度規定及日後維管便利性)再調整，為符合建築能效之節能精神，臥室照度無須超量設計，而餐廳之照度應提高以符合需求書規定。 統包商團隊未依第 177 次專技會議結論提出方案檢討表，以原方案 01 為原則調整烹飪設備為能效 1 級瓦斯爐與原 IH 爐得分差異、揚水泵能源效率計算差異未釐清，亦未提出各設備單價差異，請設計單位盡速辦理。 統包商團隊於會議中明確說明候選綠建築證書已取得，雖未取得建築能效(1+級)，確認不會影響一樓版勘驗；專管單位、工營中心及北工處於會議中一再提醒倘若因此而耽誤工程進度，因屬統包商責任將無法展延(或免計)工期。 ▣ 114/11/6 統包商協同專管相關顧問召開建築能效討論會議。(另詳會議記錄)。 ▣ 114/11/6 第 179 次專技會議，經專管洽詢建管處，勘驗文件確依建照加註事項辦理，請注意本案建照變更設計後之建照加註事項是否有勾選。統包商說明本案尚未被要求一樓勘驗需取得「候建築能效證書」，需於竣工前取得「建築能效標示」。 ▣ 114/11/13 第 180 次專技會議，第 180 次專技會議，有關建築能效展延部分，統包設計單位於會議中說明，114 年 11 月 6 日協同專管相關顧問召開建築能效討論會議之意見尚未調整完妥，預計於 114 年 11 月 27 日專技會議提出方案討論，屆時請統包設計單位於	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							114 年 11 月 25 日前先行將方案上傳 LINE 大群供專管及工營中心、空軍審視，並預定 114 年 12 月 5 日前提出初步評估資料。請統包設計單位盡速跟建築中心釐清揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式。 114 年 11 月 6 日第 179 次專技會議，專管單位提醒「建築能效標示」雖未影響建管勘驗，但仍可能涉及現場設備及其配管配線之位置，請統包廠商應預估材料設備採購之作業時間，推估「建築能效標示」應取得之時間，避免後續細設變更而影響工進。 ▣ 114/11/20 第 181 次專技會議，統包設計單位於會議中說明，有關揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式認定問題，於 114 年 11 月 18 日已先諮詢建築中心，目前待建築中心回復。 ▣ 114/11/27 第 182 次專技會議，原預計於 114 年 11 月 27 日專技會議提出方案討論，並預定 114 年 12 月 5 日前提出初步評估資料，因揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式認定問題，統包設計單位諮詢建築中心，截至 114 年 11 月 25 日建築中心討論中，初步評估資料恐無法於 114 年 12 月 5 日提出。 專管單位簡報 P15，有關建築能效部分，經專管監造單位概估預計 115 年 12 月 11 日辦理 1 樓版勘驗，往前推估 6 個月預計 115 年 6 月 11 日為啟動辦理建築能效(1+級)作業，另請專管單位掌握第二次建照變更之項目勾選情形，並控管建築能效提早於 1 樓版勘驗前完成。 ▣ 114/12/4 第 183 次專技會議，統包設計單位回	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							復，因揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式認定問題尚未確認，初步評估資料預計需再展延至 114 年 12 月 31 日提出。 114 年 11 月 20、27 日、114 年 12 月 4、11 日第 181~184 次專技會議，統包設計單位於會議中說明，有關揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式認定問題，於 114 年 11 月 18 日資料已提供建築中心諮詢中，截至 114 年 12 月 3 日建築中心尚在討論中。 統包商簡報 P36、專管單位簡報 P16，有關建築能效部分，北工處建議統包設計單位先將各類初步評估方案，函送專管單位審查，並審轉使用單位審查確認，以縮短內部陳核及確認時程，後續若經建築中心審查尚有疑義或需修正，再行與使用單位溝通，統包商於會中回復，會後將先行與工營中心溝通提送方式。 ▣ 114/12/11 第 184 次專技會議，統包設計單位於會中說明，目前將依據上週專技會議(12/4)結論，提送建築能效評估方案資料(詳統包商簡報 P42)，請統包團隊務必檢附完整計算附件、報價單等相關資料，以利審查。 另有關揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式，統包設計單位於會中提出，需請專管單位協助提供一日用水量(Vd)=62.37 M3 及揚水管垂直長度(L)=70.4 M 之計算方式，此部分於 114 年 11 月 6 日第一次建築能效研討會議已有研討，且差異不是在(Vd)及(L)，而是依據能效規範說明揚水口徑應符合 30 分鐘充滿一日用水量(0.1vd/30*60；30 分鐘流量值之兩	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							倍)，專管機電顧問也說明 114 年 12 月 9 日已電話回覆統包商。由於建築能效檢討為統包商之設計規劃責任，專管單位無權踰矩，請統包商儘速與設計機電技師確認揚水泵 PEB 值(涉及台北自來水事業處相關定)以利後續。第 188 次專技會議，統包商回覆專管單位，有關機電技師計算揚水泵 PEB 值接近專管機電技師計算值約 0.6~0.7。 ▣ 114/12/18 統包商簡報 P46，方案 1~方案 3 經顧問審視內容皆尚屬合理，方案 02 得分不足 90 不考慮，對業主比較有利為方案 01，若統包團隊機電技師算出來的值與專管單位計算接近，基本上能取得建築能效 1+級，若考量分數接近門檻委員書審分數不足，建議可將電梯調整修正為永磁馬達搭配電能回收模組，增加保險的分數。會後於 Line 群組請統包商提供 IH 爐用電量計算，以利專管協助檢核相關電力容量。114 年 1 月 8 日第 188 次專技會議，統包商提供 IH 爐用電量計算(統包商簡報 P64)，專管無意見。 ▣ 114/12/22 建築能效釋疑申請統包商以 E-mail 提供建築中心辦理後續。 ▣ 114/12/24 第 186 次專技會議說明(統包商簡報 P36~P61)，於 114 年 12 月 4 日第 183 次專技會議，會議結論建議統包設計單位先將各類初步評估方案，函送專管單位審查，並審轉使用單位審查確認，以縮短內部陳核及確認時程部分，本週(12/24)統包商於會中回復，已持續與使用單位確認各方案內容，會後將再詢問提送方式，另請協助於下週專技	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							會議回報。會後請統包設計單位協助提供建築中心承辦人員資訊予北工處。 ▣ 114/12/31 第 187 次專技會議，有關建築能效釋疑申請，統包商設計單位於 114 年 12 月 22 日以 E-mail 提供建築中心辦理後續，本日 (12/31) 會中統包設計單位說明，因揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式認定，尚未收到建築中心確認資訊，故初步評估資料預計需再展延至 115 年 1 月 31 日提出。 統包設計單位說明，燈具調整配置方案使用單位已回復採用 A 方案(詳統包商簡報 P41 及 P71)。 統包設計單位說明各類初步評估方案，經詢問使用單位，係建議揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式認定，等建築中心確認後，再行發文提送。 ▣ 115/1/8 第 188 次專技會議，統包商提供 IH 爐用電量計算(統包商簡報 P64)，專管無意見。另統包設計單位說明未能聯繫上建築中心承辦，並表達待建築中心回覆計算方式後才能確認本案揚水泵 PEB 值(含 Qc 計算方式)及其他能效相關檢討，如:永磁馬達搭配電能回收模組(電力回生裝置)等檢討，並請統包商盡速追蹤回報建築中心承辦聯絡方式。 ▣ 115/1/15 第 189 次專技會議，統包設計單位於會中說明，有關揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式認定釋疑部分，經電話聯繫建築中心人員，本案尚未排進內部會議，俟內部會議確認後，才會到決策會議裁決，請統包團隊協助	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							持續追蹤。另北工處請統包商計單位於會後，提供目前建築中心之協助承辦人員聯繫方式，北工處以電聯拜訪承辦人員。 ▣ 115/1/22 第 190 次專技會議，統包設計單位於會中說明，經電話聯繫建築中心人員，本案有機會排進本日(1/22)內部會議，請統包團隊協助持續追蹤並於明日(1/23)於 LINE 大群回報辦況。 ▣ 115/1/23 統包設計單位於 LINE 大群回報有關於建築能效評估，昨天中心有排入會議討論，但還沒有結論。 ▣ 115/1/28 統包設計單位以王師復興崗字第 1150128001 號函，函請建研所及建築中心惠復。 ▣ 115/1/29 第 191 次專技會議： 有關建築能效釋疑申請，統包設計單位說明，經電話聯繫建築中心承辦，本案有納入 115 年 1 月 22 日內部會議討論，惟未取得結論，另建築中心建議發文予建研所協助確認，統包設計單位已於 115 年 1 月 28 日發文，持續因揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式認定，尚未收到建築中心確認資訊，故初步評估資料預計需再展延至 115 年 2 月 28 日提出。 統包設計單位說明，本工程揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式認定釋疑部分，有納入建築中心 115 年 1 月 22 日內部會議討論，惟未取得結論，另建築中心建議發文予建研所協助確認，統包設計單位於 115 年 1 月 28 日以王師復興崗字第 1150128001 號函，函請建	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							研所及建築中心惠復。 ▣ 115/2/11 第 193 次專技會議，統包設計單位說明，115 年 2 月 10 日經電話聯繫建研所承辦，承辦表示有機會於 2 月底或 3 月初函復，請統包團隊協助持續追蹤。 ▣ 115/2/26 第 194 次專技會議，有關建築能效釋疑申請，統包設計單位已於 115 年 1 月 28 日發文予建築中心、建研所協助確認，持續因揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式認定，尚未收到建築中心確認資訊，故初步評估資料預計需再展延至 115 年 3 月 31 日提出。 ▣ 115/3/4 第 195 次專技會議，統包設計單位說明，115 年 3 月 2 日電話聯繫建研所承辦，承辦休假未聯繫上，請統包團隊協助持續追蹤。 ▣ 115/3/11 第 196 次專技會議，統包設計單位說明，分別於 115 年 3 月 6、9 日致電建研所，建研所內部公文陳核中。另北工處請統包商於下週專技回報，建築能效需於何時辦理完成，才不會影響現場工進。且因建築能效仍須辦理變更設計，涉及整體預算變動，工營中心建議併案辦理，因目前建築能效尚未定案，請統包團隊除積極追蹤外，可事前彙整相關變更設計資料。 ▣ 115/3/18 第 197 次專技會議，統包設計單位說明，分別於 115 年 3 月 16、17 日致電建研所，未連繫上承辦，請統包團隊持續追蹤。有須請統包商務必於下週專技回報，建築能效需於何時辦理完成，才不會影響現場工進。	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							▣ 115/3/24 北工處以備北工營字第 1150002388 號函催辦「建築能效」相關期程及圖算資料，俾與基地外側排水計畫併案辦理第二次變更設計暨新增需求作業。 ▣ 115/3/25 第 198 次專技會議，有關建築能效釋疑申請，持續因揚水泵 PEB 之 Qc 計算方式認定，尚未收到建築中心、建研所確認資訊，故初步評估資料預計需再展延至 115 年 4 月 30 日提出。 設計單位 115 年 3 月 16、17、23 日致電建研所，未連繫上承辦，請統包團隊持續追蹤。須請統包商務必於下週專技回報，建築能效需於何時辦理完成，才不會影響現場工進。 ▣ 115/4/01 第 199 次專技會議，設計單位說明已聯繫上建研所並獲得持續針對相關資訊進行確認，預計建研所將於 4 月中旬正式發文，但根據過往經驗評估，提議待未來正式函文下達後，再依據其具體建議進行調整與修正。 ▣ 115/04/09 第 200 次專技會議，設計單位說明已於 4 月 7 日電聯聯繫上建研所承辦並獲得預計本周或下周建研所會發函回覆之資訊。 ▣ 115/04/16 第 201 次專技會議，有關建築能效評估之辦理進度，統包設計單位說明本週尚未接獲建研所來函，已於 4 月 14 日電洽承辦人員，惟承辦人員於 4 月 14 日至 15 日請假，後續將持續追蹤辦理進度。 ▣ 115/04/24 第 202 次專技會議，有關建築能效評估之辦理進度，統包設計單位說明 4 月 22	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							日電聯承辦未連繫上，4 月 23 日聯繫上承辦，承辦表示等待主管批示，預計本周五或下周一 4 月 27 日發文。 ▣ 115/04/29 第 203 次專技會議，有關建築能效評估之辦理進度，建研所 115 年 4 月 28 日建研環字第 1157638324 號函指示 PEB 之 Qc 計算方式，設計單位將依照該函指示進行相關作業辦理，會盡快提供預定完成日期在專技會議說明。 ▣ 115/05/07 第 204 次專技會議，有關建築能效評估辦理進度，係回應前次會議紀錄追蹤事項。經設計單位說明，目前建築能效評估仍辦理中，預計於 115 年 8 月中完成。惟專管監造單位於會議中表示，若評估完成時程落於 8 月中，恐壓縮統包商後續現場設備相關作業期程，爰設計單位回應，將於下週第 205 次專技會議前 09:30 由機電技師到場說明，並進一步釐清建築能效評估後續辦理期程及相關配合作業。 ▣ 115/5/14 第 205 次專技會議，有關建築能效評估辦理進度一案，設計單位報告，依建研所 115 年 4 月 28 日建研環字第 1157638324 號函指示事項辦理，預計於 115 年 5 月 31 日前完成機電檢討及圖說調整作業，並提送修正資料供建築能效評估顧問檢討；另預計於 116 年 2 月 28 日取得候選證書。惟實際辦理時程仍可能依主管機關審查進度調整，前述時程僅供會議追蹤管控。 ▣ 115/5/21 第 206 次專技會議，設計單位說明，相關作業持續辦理中，目前配合建研所指示	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							辦理能效計算及圖面調整作業。 ▣ 115/6/4 第 208 次專技會議，會中指出建築能效涉及燈具、IH 設備、揚水泵、用電容量、線徑、管線位置、電盤及部分地下室管線配置，若未及早釐清，恐影響筏基、大底及後續地下室結構施工，請設計單位於下週專技會議請機電技師到場，就建築能效評估、機電容量、管線路徑、線徑、電盤、揚水泵及是否影響地下室施工逐項說明，並提出需業主或統包商確認之事項。 ▣ 115/06/10 第 209 次專技會議，設計單位回報建築能效依照 P43、44 頁進度，盡量於七月底八月初前確認，是否影響結構施工。 ▣ 115/06/17 第 210 次專技會議，持續追蹤進度。 ▣ 115 年 6 月 25 日，第 211 次專技會議，機關詢問建築能效目前實際辦理進度，並表示先前所提出之期程為 7 月底至 8 月初完成相關圖說及資料整合，惟目前每週會議紀錄僅記載「持續檢討」或「設計單位辦理中」，無法掌握各項工作之實際完成程度，亦無法確認原訂期程是否可能延誤。 ▣ 115 年 7 月 2 日，第 212 次專技會議，設計單位說明目前建築能效作業已進入第二階段，辦理報告書撰寫、資料檢討及彙整作業，預計於 115 年 7 月底取得第一版評估資料；如受假日或作業影響，可能順延至 8 月初提供。 ▣ 115/7/9 第 213 次專技會議，設計單位說明，截至 115 年 7 月 8 日空調、外殼等皆完成，預計 115 年 7 月 31 日(五)完成一版，115 年 8	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							月 4 日(二)前提供群組 1 版並開始啟動申請業主用印作業(詳細進度與日期，詳簡報 P41)。 ▣ 115/7/16 第 214 次專技會議，設計單位林建築師語音遠端說明，截至 115 年 7 月 8 日空調、外殼等皆完成，預計 115 年 7 月 31 日(五)完成一版，115 年 8 月 4 日(二)前提供群組 1 版並開始啟動申請業主用印作業(詳細進度與日期，詳簡報 P39)。 ▣ 115/7/22 第 215 次專技會議，設計單位說明，目前建築能效進度截至 115 年 7 月 19 日空調、外殼、熱水皆完成，整體進度 73.8%(其他進度：用印文件、爐台設備、地下停車場送排風機、電梯、揚水泵 50%、照明節能 90%)預計 115 年 7 月 31 日(五)完成一版，115 年 8 月 4 日(二)前提供群組 1 版並開始啟動申請業主用印作業(詳細進度與日期，詳簡報 P40)。 ▣ 115/7/30 第 216 次專技會議，設計單位說明，目前建築能效進度截至 115 年 7 月 29 日外殼、空調、照明、熱水、爐台、地下室停車場送排風機、電梯皆完成，整體進度 93.8%(其他進度：用印文件、揚水泵 50%)預計 115 年 7 月 31 日(五)完成一版，115 年 8 月 4 日(二)前提供群組 1 版並開始啟動申請業主用印作業(詳細進度與日期，詳簡報 P44)。 ▣ 115/8/6 日 217 次專技會議，設計單位說明統包團隊於 115 年 8 月 3 日以 115 宏工字第 1150004555 號函，檢送本工程候選建築能效評估申請所需之起造人用印文件。專管單位	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							業於 115 年 8 月 5 日以亞新（工管）字第 1150046022 號函轉起造人，請其協助辦理用印。 ▣ 115/8/13 第 218 次專技會議，設計單位說明，目前俟空軍完成建築能效申請文件用印，待用印資料取得後即辦理掛件，正式進入審查程序；現階段整體作業尚在原規劃期程內。 ▣ 115/8/18 第 219 次專技會議，機關說明，起造人於 115 年 8 月 17 日國空人庶字第 1150192396 號發函通知，已完成鈐印(專管監造單位於 8 月 19 日收文)，後續由設計單位接續辦理掛件及審查作業。 ▣ 115/08/28 第 220 次專技會議，設計單位說明，於 115 年 8 月 19 日取得起造人用印文件後即轉交建築能效顧問；因 8 月 24 日颱風南部停班，顧問於 8 月 25 日收到資料並於當日寄送掛件資料予建築中心。惟目前尚待確認建築中心實際收件及掛件情形，設計單位持續追蹤，並於下週專技會議明確說明掛件程序及審查進度。 ▣ 115/9/2 第 221 次專技會議，設計單位說明，建築中心已確認收受紙本申請資料，惟尚待完成正式掛件收執並排入審查程序。主席考量以 116 年 3 月 31 日前取得候選證書為目標，整體辦理期程已較為緊迫，請設計單位主動向建築中心確認申請文件是否完整、有無須補正事項及正式掛件日期。設計單位表示，已持續主動追蹤掛件及缺件情形，惟建築中心內部尚有既定行政作業流程，仍須俟其正式書面通知；後續將持續追蹤辦理進度。	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							▣ 115/9/11 第 222 次專技會議，設計單位說明，於 115 年 9 月 8 日 115 宏工字第 1150005238 號發函通知專管單位，建築中心已於 115 年 9 月 2 日收受申請資料、9 月 8 日通知繳納審查費新臺幣 10 萬 1,000 元及「發票抬頭確認文件」，前開審查費由設計單位先行墊付，後續再依程序向機關辦理請款。專管單位於 115 年 9 月 11 日亞新（工管）字第 1150055188 號發函請空軍辦理文件用印，並請於用印完成後逕交統包商接續辦理。俟完成繳費及文件補正後，始得正式掛件，俟完成繳費及補件後始得正式掛件；預估行政作業約需 2 週，可能至 10 月初進入審查，考量後續審查約需 4 個月，116 年 3 月 31 日前取得候選證書已有期程風險。另目前能效估算 92.59 分，已達 1+ 級，後續將以提升瓦斯熱水器能效、調整電梯系統及增設電力回生裝置補足分數，相關變更費用尚待確認。 ▣ 115/9/17 第 223 次專技會議，設計單位說明，有關建築能效評估辦理進度，已於 115 年 9 月 14 日完成繳費作業；另空軍司令部人事軍務處已於 115 年 9 月 14 日以國空人庶字第 1150216081 號函辦理相關用印事項。俟用印文件完成後，續由設計單位提送財團法人台灣建築中心辦理正式掛件程序，續予列管。 ▣ 115/9/24 第 224 次專技會議，設計單位說明，有關建築能效評估辦理進度，空軍端用印完成後，資料於 9 月 21 日上傳；9 月 23 日建築中心已有初步審查意見。	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							115/9/30 第 225 次專技會議，設計單位說明，有關建築能效評估辦理進度，預計於 115 年 10 月 2 日（五）前依建築中心意見完成修正並重新提送。	
二、施工作業								
3-11		流出抑制計畫與施工作業期程影響	114/7/24				114/8/24 第 167 次專技會議，流出抑制計畫是否需要配合辦理變更？相關變更作業時程影響？排水滯洪規劃變更等。 114/9/4 第 170 次專技會議，統包商說明排水滯洪規劃之滯洪量依臺北市政府工務局水利工程處核定之流出抑制設施排水計畫辦理，無須辦理變更。另流出抑制部分統包商上週已完成清圖，細設圖與原核定流出抑制設施排水計畫不同部分，目前待水利技師及工地確認後於 114 年 9 月 30 日前回報是否辦理變更設計。 114/10/2 專技會議設計單位回報，經水利技師及工地確認後流出抑制須辦理變更設計，變更時程最遲需於使照請領前 6 個月辦理相關作業。(歷經第 164 次~225 次專技會議，未完成)	
3-20	第 180 技會議	有關瓦斯管線施作及遷移部分，請專管單位納入管辦事項追蹤，北工處再行與工營中心確認後續進行方式	114/11/13				114/11/20 第 181 次專技會議，有關瓦斯改管部分，因校方瓦斯管線遷移作業須配合於新作 RC 圍牆位置(基礎)及校方側(基地外側)排水前，先行完成施作，目前統包商預計 115 年 7 月進場施作，故需預估進場施作前 6 個月請校方向瓦斯公司提出改管申請。 114/11/27 第 182 次專技會議，有關瓦斯改管部分，因校方瓦斯管線遷移作業須配合於新作 RC 圍牆位置(基礎)及校方側(基地外側)排	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							水前，先行完成施作，目前統包商預計 115 年 7 月進場施作，故需預估進場施作前 6 個月請空軍司令部向瓦斯公司提出改管申請。 ▣ 114/12/4 第 183 次專技會議，統包商於 114 年 12 月 3 日提送第二次變更設計資料與專管單位審查，專管單位審定函送北工處時，請於函文內說明瓦斯公司提出改管申請事宜，以利北工處函送空軍辦理。 ▣ 115/1/22 第 190 次專技會議，本工程之景觀工程須先辦理樹木移植作業之先期作業，目前統包商暫訂 115 年第二季執行，惟因移植挖掘作業週遭臨近已知瓦斯地下管線，為利作業安全，建議主辦機關先行向管線單位申辦遷移作業，俾利施工順遂。 ▣ 115/3/4 第 195 次專技會議，專管單位於 115 年 2 月 13 日審轉第二次變更設計「校方側（基地外側）排水計畫書圖文件予北工處，北工處原訂於 115 年 3 月 4 日召開聯審會議，另於 115 年 2 月 26 日北工處月成果會議，主席裁示由專管單位提供意見即可，後續北工處依程序提報工營中心，故有關瓦斯改管申辦遷移作業須向空軍說明部分，由北工處協助函送工營中心時，於函文內說明，以利後續空軍辦理相關作業。 ▣ 115/3/11 第 196 次專技會議，有關瓦斯管線施作及遷移部分，會中統包商建議 115 年 5 月 31 日前空軍能向瓦斯公司申請遷移掛件作業，請統包商於下週專技會議說明，因瓦斯管線未遷移，導致那些工項無法進行並回報影響之時間點。	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							▣ 115/3/18 若瓦斯管線未遷移會導致那些工項無法進行並回報影響之時間點部分，於 115 年 3 月 18 日第 197 次專技會議，北工處說明空軍已在辦理中，且統包商表示依據目前預定進度表，景觀工程非今年必須完成之工項，需俟第二次變更設計辦理完成後再行討論。 ▣ 115/05/07 第 204 次專技會議，有關本案瓦斯管線協調事宜，統包商提及本案瓦斯單位為陽明山瓦斯公司，後續需另行約定時間討論。會議上決議請統包商主動發起協調會議，如涉及其他權責單位配合事項，視實際需求邀請相關單位共同參與。 ▣ 115/05/28 第 204 次至第 208 次專技會議，持續追蹤。 ▣ 115 年 6 月 10 日第 209 次專技會議，有關瓦斯管線相關事宜，依會中討論，本案涉及設計單位、瓦斯公司及相關單位間之管線配置、銜接方式及施工界面確認。為避免後續各單位反覆確認，致影響整體作業期程，建議後續由設計單位協助與瓦斯公司接洽，並邀集相關單位辦理現場會勘。現場會勘原則訂於下週，即 115 年 6 月 15 日至 6 月 18 日期間擇日舉行，俾利一併確認瓦斯管線配置及後續辦理方式。 ▣ 115/06/17 第 210 次專技會議，有關瓦斯管線相關事宜，瓦斯公司提供 115 年 6 月 22 日至 26 日之可配合時段，機關原則上於 6 月 23 日至 25 日期間均可配合參與出席，會後確認已訂 115/06/25 上午 9：30 相關單位（機關、專管監造及統包商）往訪瓦斯公司。	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							▣ 115/06/25 第 211 次專技會議，有關瓦斯管線遷移事宜，經會議討論，遷移工程與後續瓦斯表裝設費用原則分案辦理；考量瓦斯公司須先行繳費始得派工，而機關須於工程完成查驗後始能付款，請統包商就先行代墊遷移費用之可行性提請公司內部研議。 ▣ 115/7/9 第 213 次專技會議，有關瓦斯管線遷移費用代墊須由機關發文指示一節，機關承辦表示刻正辦理相關發文作業，後續俟機關函文送達後，請統包商依函示內容及契約程序續辦。 ▣ 115/7/9 第 213 次專技會議，針對統包商提出景觀區樹木移植事宜，經會議討論，因現場發現既有瓦斯管線與部分預定移植樹木位置有所衝突，本案涉及原設計內容調整及費用流用，請統包商檢附釋疑單、現場照片、圖說標示及相關佐證資料，依程序提送專管監造單位。前項 3 株樹木移植費用計 48,000 元，後續依契約及相關程序辦理流用。 ▣ 115/7/22 歷經第 214 次~第 216 次專技會議，持續追蹤。 ▣ 115/8/6 第 217 次專技會議，有關瓦斯管線遷移事宜，自 115 年 6 月 17 日第 210 次專技會議起研議，並於同年 6 月 25 日邀集專管監造單位及統包商共同往訪瓦斯公司研商。嗣於第 211 次專技會議，考量瓦斯公司須完成繳費後始得派工，而本處須俟遷移工程完成並經查驗確認後始得辦理付款，爰請統包商研議先行代墊費用之可行性，並於第 212 次至第 216 次專技會議持續列管。經本次會議	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							確認，前開遷移費用得依統包契約規費相關規定辦理；為避免影響後續工程進度，請統包商先行代墊，俟工程完成並經查驗確認後，檢附瓦斯公司繳費通知、付款證明、完工及查驗資料等文件，依契約程序函報本處審核歸墊。本項結論納入本次會議紀錄，並由本處另函通知統包商辦理。 ▣ 115/8/13 第 218 次專技會議，有關瓦斯管線遷移費用及後續辦理方式，因統包商與機關仍有需協調確認事項，後續依正式函文及契約程序辦理。 ▣ 115/8/18 第 219 次專技會議，有關瓦斯管線於本日 14:00 招集相關單位進行現場會勘，過程詳有關瓦斯管線現場會勘紀錄。 ▣ 有關瓦斯管線遷移事宜，統包商已於 115 年 8 月 20 日正式函報，並表示自樹木移植完成翌日起，已影響景觀區後續施工，且與靈甫樓周邊排水工程施工界面相關。115/8/26 專管單位發函亞新（工管）字第 1150050667 號提送由機關審議中，如機關認現有資料不足，請統包商配合補充施工網圖、總浮時及實際工期影響分析；本案目前尚無法訂定明確完成節點，下週持續列案討論。 ▣ 115 年 9 月 2 日第 221 次專技會議，會議就基地外側排水、景觀、新設圍牆、瓦斯管線及主體工程之施工界面進行討論。統包商說明，基地外側排水與新設圍牆、瓦斯管線及流出抑制設施銜接具有先後關係，如未儘早確認，恐增加後續拆除、復舊及施工界面處理。經會議討論，現階段統包商希望優先推	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							動基地外側排水第二次變更設計的進行，建築能效及其他項目另案辦理；專管單位依機關審查意見修正相關分析資料，另請統包商補充排水、景觀、圍牆及瓦斯管線之施工順序、銜接節點與影響說明，作為機關審議及後續工期檢討參考；所涉經費及工期俟機關同意辦理變更設計後，再依契約程序議定。 ▣ 115/9/11 第 222 次專技會議，專管監造單位希望統包商提出基地外側排水、新設圍牆、景觀及瓦斯管線之施工進度、工序與界面影響資料。統包商表示可提供其他資料說明施工順序及界面影響；雙方對資料呈現方式尚待協調；所涉工期及經費待成案後，再依契約程序檢討。 ▣ 115/9/17 第 223 次專技會議，專管單位說明，機關於 115 年 9 月 9 日及 9 月 10 日共發出 3 份與第二次變更設計相關之函文，專管單位於 115 年 9 月 15 日收訖，機關並要求於 115 年 9 月 25 日前完成回覆。考量後續尚需辦理資料彙整、函稿簽核及適逢假日等因素，爰請統包商原則於 115 年 9 月 21 日前提提供相關資料或正式回覆，以利專管監造單位彙整辦理。另會中指出，前開函文所涉基地外側排水、景觀、新設圍牆、瓦斯管線及主體工程施工界面等議題，前兩次專技會議已進行討論，部分審查意見亦已先行提供統包商。經會議討論，請統包商依機關函文及專管意見，釐清各工項目前施工進度、施工界面、辦理順序及對施工要徑之影響，並依限提出具體說明及相關資料，供後續第二次變	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							更設計檢討及函復機關辦理。 ▣ 115/9/24 第 224 次專技會議，有關第二次變更設計基地外側排水工程，統包商說明，已於 115 年 9 月 21 日以 115 宏工字第 1150005452 號函檢送相關資料予專管單位，並於會中表示，考量現階段施工進度，以及後續景觀、新設圍牆、瓦斯管線及主體工程等施工界面，基地外側排水工程與相關工項之施工順序及界面銜接密切相關，爰建議儘速啟動第二次變更設計程序。經會議討論，原則同意先行啟動第二次變更設計相關作業，至統包商所提工期調整部分，另依實際影響情形及相關佐證資料續予檢討。另機關說明，基地外側積水區及排水設施涉及原計畫範圍外之新增需求，相關程序仍須持續辦理。請專管單位依本次會議討論結果彙整相關資料，於 115 年 9 月 29 日前提提供機關，俾利機關於 115 年 9 月 30 日辦理後續函文作業。 ▣ 115 年 9 月 30 日第 225 次專技會議，專管單位說明，已依前次會議決議彙整相關資料，並於 115 年 9 月 29 日以亞新（工管）字第 1150058339 號函送北工處辦理。	
3-22	第 182 次專技會議	統包商簡報 P37，有關本工程與北投醫院界面高程，減作擋土牆不可行原因，經統包商依專業立場提供高程降挖之	114/11/27				▣ 114/10/17 有關北投醫院借地期限至 114 年 12 月 31 日止，請統包商盡速辦理展延相關作業。 ▣ 114/10/23 統包商於 114 年 10 月 23 日第 177 次專技會議說明，經初步了解應可再借至 115 年 6 月 30 日，依據統包商簡報 P27，後續開挖出土動線，由政院大門進，由北投醫院用地大門出，請統包商先行評估在北投醫院願	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
		優劣分析，恐影響流出抑制變更、五大管線變更、建照變更或報備、已核定之細部設計變更設計等，影響層面過多，且不利本案後續工進，不建議辦理調整，請統包商發文提送專管監造單位，以利機關函轉北投分院憑辦。					意借地至 115 年 6 月 30 日止，現場工進排序，可否完成出土作業或需有備用路線，仍請統包商盡速辦理展延相關作業。 ▣ 114/10/29 第 178 次專技會議，依據統包商簡報 P27，後續開挖出土動線，由政院大門進，由北投醫院用地大門出，請統包商先行評估在北投醫院願意借地至 115 年 6 月 30 日止，現場工進排序，可否完成出土作業或需有備用路線，仍請統包商盡速辦理展延相關作業。 ▣ 114/11/6 第 179 次專技會議，因北投醫院借地期程掌握不確定，經北工處初步協調，待通知後再行歸還，這段期間原則都可以使用，實際依據會等到北投下次召開會議納入紀錄辦理，請統包商針對相關議題於會議提出。另現場工進排序之出土作業期程評估或需有備用路線，請統包商屆時依北投醫院通知辦理展延相關作業。 ▣ 114/11/13 第 180 次專技會議，北投醫院預計 114 年 11 月 21 日召開協調會議，請統包商針對相關議題於會議提出。 ▣ 114/11/21 北投醫院召開協調會議。 ▣ 114/11/27 有關本工程與北投醫院界面高程，減作擋土牆不可行原因，經統包商依專業立場提供高程降挖之優劣分析，請統包商發文提送專管監造單位，以利機關函轉北投分院憑辦。 ▣ 114/12/4 第 183 次專技會議，北工處說明已將上週(11/27)專技會議紀錄結論提供北投醫院承辦供參，將在協助詢問北投醫院是否有	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							實質發文提送資料之需求。 ☒ 114/12/16 統包商以 114 宏工字第 1140008668 號函，檢送與北投分院工程界面調整高程（減作擋土牆）優劣分析資料，並說明俟收到通知後再行歸還北投醫院用地。 ☒ 114/12/19 專管單位以亞新(工管一)字第 1140074315 號函，審轉機關核示。	
3-23	第 208 次專技會議	有關民眾陳情一案(灌溉農渠水源汙染)	115/06/04				☒ 115/05/14 環保局至現場開立水污染罰單。 ☒ 115/06/01 民眾陳情：灌溉農渠水源污染。 ☒ 115/06/02 農田水利會：灌溉農渠水源污染。 ☒ 115/06/02 環保局：灌溉農渠水源污染。 ☒ 115/06/03 環保局：灌溉農渠水源污染。 ☒ 115/06/04 第 208 次專技會議，有關民眾陳情一案，統包商應持續維持攔砂、沉澱及排水防制措施，相關清淤、攔砂、抽淤及改善作業均應拍照留存，作為後續說明及責任釐清之佐證。 ☒ 115/06/05 環保局：灌溉農渠水源污染。 ☒ 115/06/05 環保局至現場開立水污染罰單。 ☒ 115/06/06 民眾陳情：灌溉農渠水源污染。 ☒ 115/06/08 環保局：灌溉農渠水源污染。 ☒ 115/06/09 環保局：灌溉農渠水源污染。 ☒ 115/06/10 第 209 次專技會議，有關近期民眾陳情及環保局稽查事宜，統包團隊說明，明日即 115 年 6 月 11 日將會同機關及豐原里里長至現場辦理會勘，釐清現場情形及相關需求。 ☒ 115/06/11 張斯綱議員為「復興崗營區職務宿舍新建統包工程（113 建字第 0110 號）工區長期排放污水，影響環境污染改善及農民權益	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							疑義案」召開協調會。 ▣ 115/06/11 議員：灌溉農渠水源污染。 ▣ 115/06/13 環保局：灌溉農渠水源污染。 ▣ 115/06/15 環保局例行性稽查。 ▣ 115/06/16 環保局：灌溉農渠水源污染。 ▣ 115/06/16 環保局：灌溉農渠水源污染。 ▣ 115/06/17 第 210 次專技會議，有關居民陳情工區排放廢水污染農作物之情形，專管監造單位說明，工區排水依核定之逕流廢水放流計畫辦理，請統包商持續落實沉砂、沉澱、水質管制及溝渠清淤等相關措施，確保排放水質符合相關規定，並妥善保存水質檢測、清淤及改善紀錄；後續如相關單位辦理會勘、採樣或檢測，請統包商持續配合辦理。 ▣ 115/06/17 環保局：環保局至現場開立水污染罰單。 ▣ 115/06/17 環保局：灌溉農渠水源污染。 ▣ 115/06/17 環保局至現場開立水污染罰單。 ▣ 115/06/18 環保局與統包商、專管監造單位辦理排水溝會勘。 ▣ 115/06/18 環保局、里長、鄰長辦理灌溉農渠水源會勘。 ▣ 115/06/18 環保局：灌溉農渠水源污染。 ▣ 115/06/21 環保局：灌溉農渠水源污染。 ▣ 115/06/22 環保局溝二隊：灌溉農渠水源污染。 ▣ 115/06/22 環保局水質科：灌溉農渠水源污染。 ▣ 115/06/22 環保局至現場開立水污染及廢棄物罰單。 ▣ 115/06/23 環保局例行性稽查。 ▣ 115/06/24 環保局例行性稽查。	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							▣ 115/06/25 環保局例行性稽查。 ▣ 115/06/26 環保局例行性稽查。 ▣ 115/06/29 環保局例行性稽查。 ▣ 115/07/01 環保局例行性稽查。 ▣ 115/07/02 環保局例行性稽查。 ▣ 115/07/03 第 211 次至第 212 次專技會議，有關居民陳情工區排放廢水污染農作物之情形，專管監造單位說明，工區排水依核定之逕流廢水放流計畫辦理，請統包商持續落實沉砂、沉澱、水質管制及溝渠清淤等相關措施，確保排放水質符合相關規定，並妥善保存水質檢測、清淤及改善紀錄；後續如環保局或其他主管機關人員到場查核，請統包商立即通報機關及專管監造單位，並完整留存到場時間、查核事項及現場照片。 ▣ 115/07/03 環保局例行性稽查。 ▣ 115/07/06 軍備局職安室督導。 ▣ 115/07/08 環保局例行性稽查。 ▣ 115/7/9 環保局例行性稽查。 ▣ 115/7/13 環保局例行性稽查。 ▣ 115/7/14 環保局例行性稽查。 ▣ 115/7/15 環保局例行性稽查。 ▣ 115/7/16 環保局例行性稽查。 ▣ 115/7/19 環保局例行性稽查。 ▣ 115/7/20 環保局例行性稽查。 ▣ 115/7/21 環保局例行性稽查。 ▣ 115/7/22 環保局例行性稽查。 ▣ 115/7/23 環保局例行性稽查。 ▣ 115/7/24 環保局例行性稽查。 ▣ 115/7/25 環保局例行性稽查。	

待辦事項追蹤表

PENDING ITEMS CONTROL LOG

◎本案於 111/5/17 決標/111/6/15 簽約日。

製表日期：115/09/30

項次	依據	工作事項	建案日期	作業需求	承辦人	作業期限	說明事項	備註
NO.	ACCORDING TO	DESCRIPTION	DATE OF INITIAL	ACTION REQUIRED	ACTION BY	DATE REQUIRED	RESOLUTION	REMARK
							☐ 115/7/26 環保局例行性稽查。 ☐ 115/7/27 環保局例行性稽查。 ☐ 7/28 環保局例行性稽查。 ☐ 7/29 環保局例行性稽查。 ☐ 7/30 環保局例行性稽查。 ☐ 7/30 環保局例行性稽查(路面污染開單)。 ☐ 8/1 環保局例行性稽查。 ☐ 8/2 環保局例行性稽查。 ☐ 8/3 環保局例行性稽查。 ☐ 8/4 環保局例行性稽查。 ☐ 8/5 環保局例行性稽查。 ☐ 8/6 環保局例行性稽查。 ☐ 8/7 環保局例行性稽查。 ☐ 8/8 環保局例行性稽查。 ☐ 8/16 環保局例行性稽查。 ☐ 8/18 環保局例行性稽查。 ☐ 8/19 環保局例行性稽查。 ☐ 8/25 環保局例行性稽查。 ☐ 8/27 環保局例行性稽查。 ☐ 8/29 環保局例行性稽查。 ☐ 9/1 環保局例行性稽查。 ☐ 9/3 環保局例行性稽查。 ☐ 9/8 環保局例行性稽查。 ☐ 9/12 環保局例行性稽查。 ☐ 9/15 環保局例行性稽查。 ☐ 9/17 環保局例行性稽查。 ☐ 9/22 環保局例行性稽查。 ☐ 9/24 環保局例行性稽查。 ☐ 9/26 環保局例行性稽查。 ☐ 9/27 環保局例行性稽查。	

國防部軍備局工程營產中心 復興崗營區職務宿舍新建工程

第225次專技會議

專管及監造單位簡報

115年9月30日

主 辦 單 位：軍備局工程營產中心

專管及監造單位： 亞新工程顧問股份有限公司  王正源建築師事務所



簡報大綱



一

建管勘驗時程管制表

二

經業管機關通過文件送中心備查管制

三

施工及其他管辦事項



建管勘驗時程管制表

項次	項目	預定勘驗時間	實際勘驗時間	勘驗結果
1	放樣勘驗(必勘)	114/07/09	114/07/09	都發局備查
2	第一層開挖及支撐勘驗	115/01/14	115/01/28	都發局備查
3	第二層開挖及支撐勘驗	115/03/04	115/02/11	都發局備查
4	第三層開挖及支撐勘驗	115/04/23	115/03/19	都發局備查
5	第四層開挖及支撐勘驗	115/06/21	115/04/24	都發局備查
6	第五層開挖及基礎版勘驗	115/07/19	115/06/17	都發局備查
7	地下3樓版勘驗	115/08/05	115/07/23	都發局備查
8	地下2樓版勘驗	115/09/06	115/09/09	都發局備查
9	地下1樓版勘驗	115/10/11		
10	1樓版勘驗	115/12/05		
11	2樓版勘驗	115/12/30		

附記：上表依據北工處115.04.20日核定之預訂進度表及施工網圖辦理。



經業管機關通過文件送中心備查管制



項次	文件名稱	業管機關 通過或核准	提供 電子檔	提送紙本	專管審定 轉送	北工處 備查	工營中心 備查
1	拆除執照	111/09/30	V	V	V		V
2	建照結構外審報備	113/09/19	V	V	V		V
3	雜照變更報備	113/12/06	V	V	V		V
4	雜照結構外審報備	113/12/10	V	V	V		V
5	第一次建照變更設計	114/07/01	V	V	V		V
6	都審變更報備	114/07/04	V	V	V		V
7	受保護樹木保護計畫計畫變更	114/07/18	V	V	V		V
8	行道樹樹木移植計畫	113/02/27	V	V	V		V
9	永久性斜坡道	113/10/22	V	V	V		V
10	基地內排水設施新設、改道或 廢止排水計畫(第一次變更)	V	V	V	V		V
11	候選綠建築證書	114/07/07	V	V	V		V
12	候選智慧建築證書	114/04/18	V	V	V		V
13	第二次建照變更設計	115/01/19	V	V	V		V
14	候選建築能效(1+級)證書	預計 116/03/31					



施工及其他管辦事項



項次	管辦項目	管辦情形
1	年度預算支用 (設計費、施工費)	一.設計費： 1.設計費第三期114/12/03提出，專管114/12/09審定轉送中心，機關115/01/26轉送營改基金核付。 2.設計費第四期待提送。 二.施工費： 1. 施工費第二十四期(7月份)統包商115/08/04提送，專管115/08/06審定轉送中心機關115/08/18 轉送營改基金核付。 2. 施工費第二十五期(8月份)統包商115/09/01提送，專管115/09/04審定轉送中心 三.有價物(廢鋼筋廢五金)變賣金額繳回作業(持續列管) 1.統包商114/09/05提報有價物變賣資料，專管114/09/12審定提送機關，北工處114/09/26備查。 2.專管114/11/11提送北工處有關廢鋼筋廢五金回收單價。 3.北工處114/11/28備查。請統包商於全數有價物完成回收過磅後核算總價辦理繳庫。 4.統包商114/11/28提送結算資料，專管114/12/09審查同意提送北工處。 5.北工處115/01/12檢退清運結算案，專管115/01/19澄復。 6.統包商115/04/09完成繳納作業。 7.工營中心115/04/29函請營改基金辦理收繳(167萬4683元)。



施工及其他管辦事項



項次	管辦項目	管辦情形
2	細部設計各階段逾期不可歸責乙方之檢討	一.統包商於115/07/01提出，機關115/07/20函示專管審查結果應於115/08/21前提出。 二.專管115/08/21函請機關寬限審查期展延至115/09/21。 三.專管115/09/21再函請機關展延審查期限至115/10/15。
3	細部設計成果報告書(含工期檢討)	一.統包商於115/07/01提出，專管單位審查意見於115/07/08函送機關。
4	細設圖說調整事宜(建照第2次報備)	專管115/05/12函文機關，同意廠商以設計釋疑辦理。
5	第1次五大管線變更設計	一.五大管線第1次變更設計均已獲主管機關核准，惟配合建築能效審查，本案仍持續列管。 二.115/08/25專管陳報機關，建請同意將本案納入後續變更設計程序辦理。
6	流出抑制計畫對施工作業期程影響	114/10/02設計單位回報，變更設計最遲需於使照請領前6個月完成。



施工及其他管辦事項



項次	管辦項目	管辦情形
7	候選建築能效(1+級)標章證書取得	一.本能效評估案自114/08/04啟動。 二.設計單位依建研所115/04/28函示揚水泵PEB之Qc計算方式據以進行後續作業。 三.評估報告業經台灣建築中心確認收件，預計115年10月排審，以116/03/31前取得候選標章證書為目標。
8	第二次變更設計暨新增需求作業(新設圍牆校方側排水工程及建築能效)	一.專管115/02/13審轉「校方側排水計畫書圖文件」。 二.北工處115/03/24函催辦「建築能效」相關期程及圖算資料，俾與基地外側排水計畫併案辦理第二次變更設計暨新增需求。 三.統包商於115/06/24提送「基地外側排水計畫事宜」(建議不與建築能效併案辦理)，專管單位115/06/30函請機關核示。 四.機關115/07/15函示請統包商先研提分案及併案之優劣分析。 五.專管「分案及併案之優劣分析報告」115/08/03函送機關。 六.所涉工期及經費待成案後依契約程序檢討，專管依第224次專技會議結論(統包商建議儘速啟動變更設計程序)於115/09/29函送機關。
9	北投醫院借地(目前尚未催還)及工程界面高程	一.北工處初步協調，待院方通知後再行歸還。 二.114/11/27統包商提出高程降挖之優劣分析，恐影響流出抑制、五大管線、建照、已核定之細部設計變更或報備等。 三.北工處114/12/04將工程界面課題轉請院方承辦參考。 四.專管114/12/19函轉統包商分析資料予機關，待機關核示。



施工及其他管辦事項



項次	管辦項目	管辦情形
10	瓦斯管線施作及遷移	一.114/11/27專技會議：統包商說明將於115年上半年植栽移植，俟第二次變更設計審定一併函送空軍請提出改管申請。 二.115/03/10專技會議：請統包商評估本項申請作業及應完成施作之時間節點，避免影響後續工進。 三.北工處115/04/07說明空軍刻正提出改管申請。 四.已於115/06/25本團隊赴陽明山瓦斯公司協調討論，因統包商與機關仍有需協調確認事項， <u>後續依正式函文及契約程序辦理。</u>
11	施工現況： B2F層柱筋綁紮	本週持續進行B2F層結構體施工。
12	居民投訴課題： 灌溉水渠疑遭汙染	一.115/06/11機關、專管及統包商參加環保局召集之協調會。 二.115/06/23工營中心第二季工程督導指示不可再發生居民抗爭。目前每日於水流匯合點觀察，未再發生汙染及居民投訴情事。 三.機關115/08/13函示 <u>對統包商採按日計罰49萬元。</u>
13	居民投訴課題： 施工噪音擾鄰	一.115/06/15居民投訴上午8時前工區即已傳出噪音。 二.目前居民已無投訴情事，監造單位持續監督。



施工及其他管辦事項



項次	管辦項目	管辦情形
14	復興崗校區靈甫樓週邊區域淹水問題解決方案	一.115/06/25機關邀集政戰學院及使用單位人員會勘，校方及使用單位建請由工營中心協助解決。 二. 115/08/06北工處長率隊往訪政戰學院院長，會勘靈甫樓週邊區域，會商解決問題方案。 三.所涉工期及經費待成案後依契約程序檢討。
15	既有瓦斯管線與樹木移植預定位置衝突	由統包商檢附釋疑單、現場照片、圖說標示及相關佐證資料，依程序提送專管監造單位。樹木移植費用依契約及相關程序辦理流用。
16	地面樓層混凝土澆置期日借道政戰學院校地方案	一.115/08/06北工處長率隊往訪政戰學院院長，獲院長首肯地面樓層混凝土澆置期日可借道政戰學院校地。 二.以北投分院工程上網公告作為預先準備節點，並以決標作為正式啟動借道及還地協調之節點。



簡報完畢 敬請指教



國防部軍備局工程營產中心

復興崗營區職務宿舍新建統包工程

第225次專業技術協調會議

簡報人：統包團隊代表

115年9月30日



簡報大綱

1 整體進度報告

整體進度說明

歷次展延/不計工期控管表

估驗計價及施工進度表

建管行政流程進度控管表

2 施工單位報告

三月預定進度

三週預定進度

施工進度說明

現場施工照片

送審文件管制

3 設計單位報告

設計進度說明

設計議題討論

4 會議結論辦況



簡報大綱

1 整體進度報告

整體進度說明

歷次展延/不計工期控管表

估驗計價及施工進度表

建管行政流程進度控管表

2 施工單位報告

三月預定進度

三週預定進度

施工進度說明

現場施工照片

送審文件管制

3 設計單位報告

設計進度說明


設計議題討論

4 會議結論辦況



更新日期：2026/9/27

整體進度說明

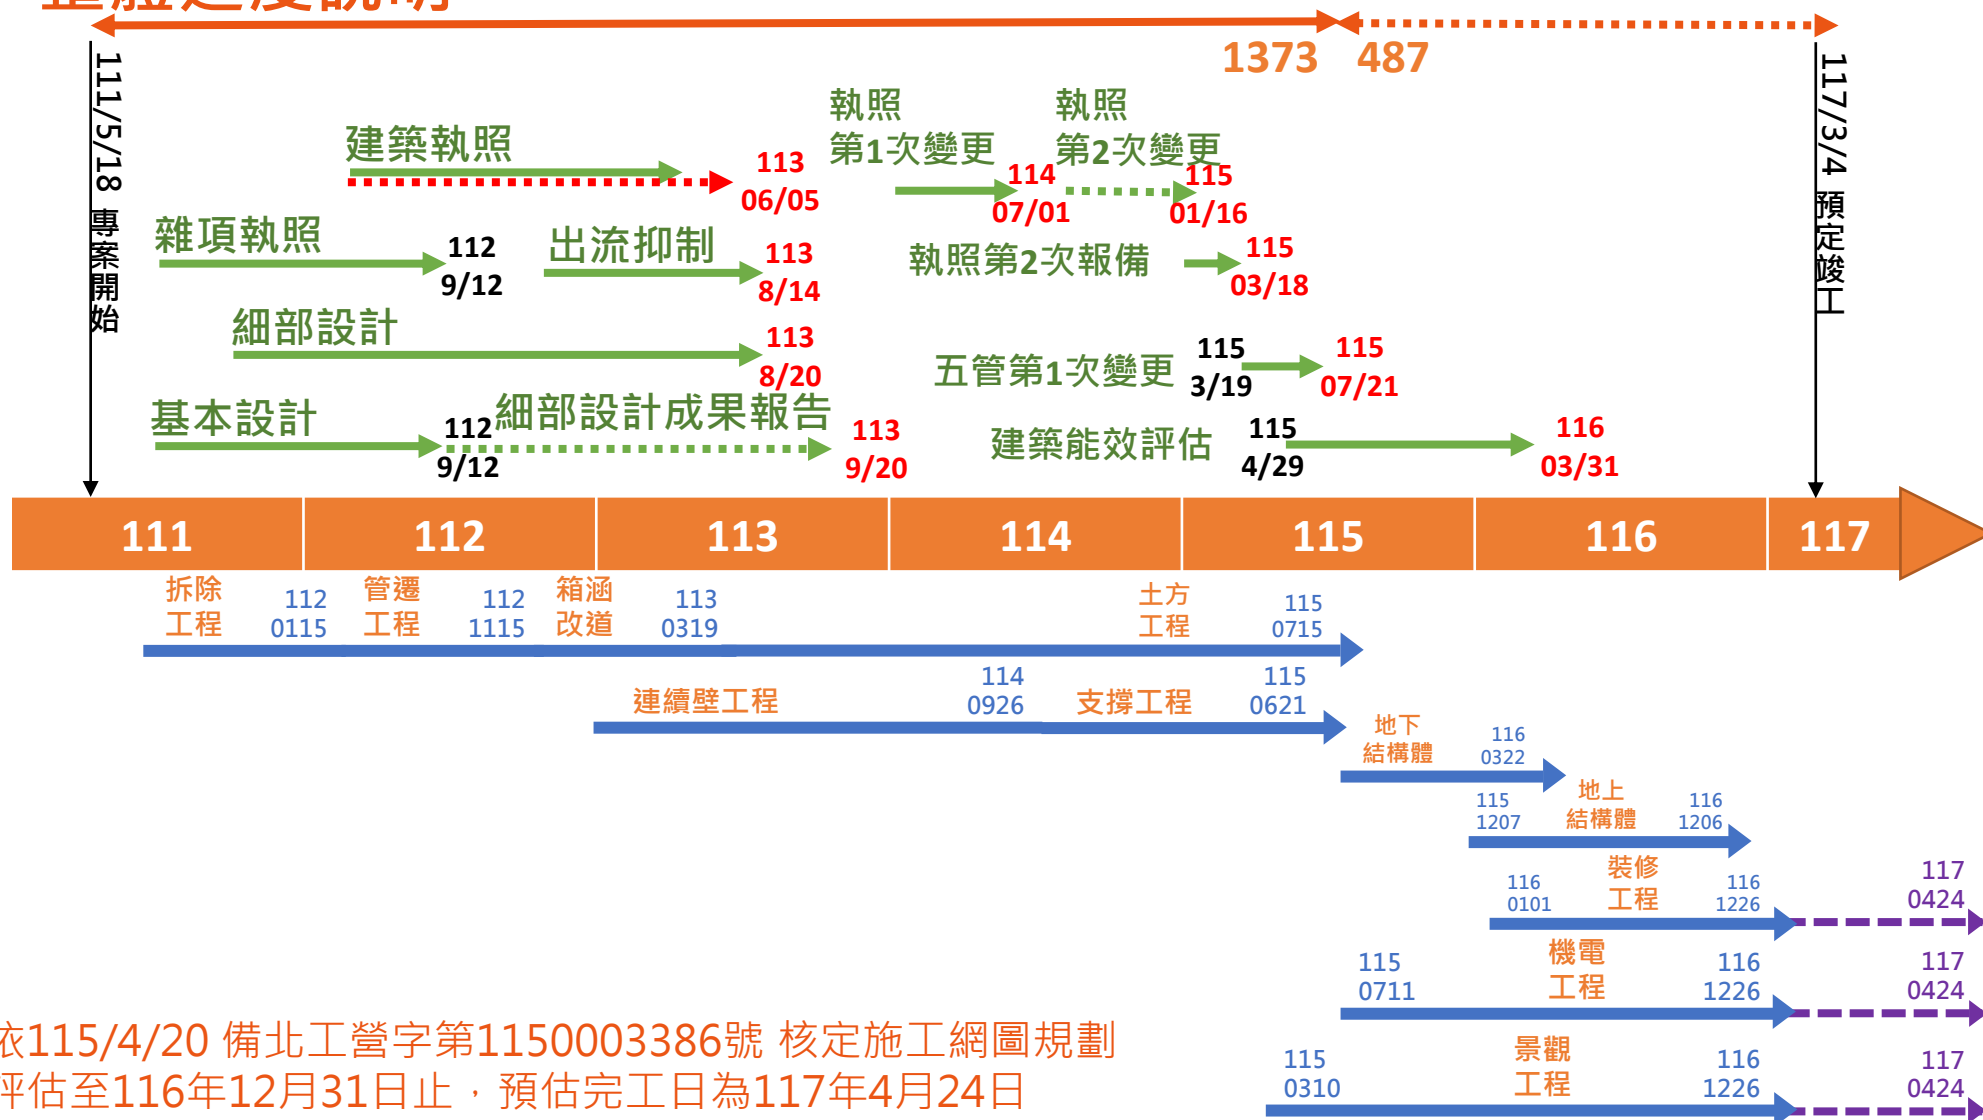

※依115/4/20 備北工營字第1150003386號 核定施工網圖規劃
※評估至116年12月31日止，預估完工日為117年4月24日





歷次展延/不計工期控管表

更新日期：2026/9/27

歷次展延/不計工期管控表										
工程名稱 復興崗營區職務宿舍新建統包工程										
開工日期	111.5.18	原約工期	1655天	原約完工日期		116.01.29	已核定免計 (含國定假日)		更新日期	115年9月27日
		展延天數	205天	展延後工期		1860天	258天		預估完工日期	117年3月4日
項次	申請事由	預估天數(天)	是否陳報	是否立案	是否免計	免計天數(天)	是否展延	展延天數(天)	辦理過程說明	辦理狀況
1	土方-紅火蟻影響	31	V	V	X	0	X	0	113.01.17~113.02.16因紅火蟻影響共31日 113.03.26、113.05.28、114.01.16、114.02.19 分別提出4次申請，中間屢遭監造專管單位要求補充說明及不同意展延，並於114.03.17備北工營字第1140002401號函 北工處對專管不同意展延表示無附加意見； 114.04.07 114宏工2350號 本公司再次發文，未通知本公司相關建議內容便不同意展延，漠視本公司履約權利 114.04.11 亞新（工管一）字第1140017845號 對統包商提出依爭議處理無意見 114.05.01 備北工營字第1140003780號 請於說明資料中補充說明統包商團隊意見 114.05.20 114宏工3509 提出本公司意見再次回覆 114.05.27 亞新（工管一）字第1140026964號 不同意展延 114.06.18 備北工營字第1140005587號 檢退說明資料 114.08.01 亞新（工管一）字第1140034253號 不同意展延 114.08.19 備北工營字第1140007769號 同意備查專管提議(不同意)	待提起爭議
2	土方- 土方運棄土質與原申請不符	17	V	V					113.03.24 首次出土B2-2，土質判定為B2-3遭退車 113.03.28 113宏工1680 提出工期遭受影響 113.04.09 回復清運 113.03.24~113.04.09(共15天) 113.06.27 正式提出，並於113年7~12月之執行進度管制會議上不斷提出工期遭受影響 114.01.16 114宏工0365再次提出 114.01.22 (114)亞新復興崗(監)字第0048號 要求提出計算方式及佐證資料 114.02.19 114宏工1094彙整後重新提出 114.02.27 亞新（工管一）字第1140008798號要求提出影響期間為本工程要徑之證明。 114.07.17 114宏工5053彙整相關資料再次提出 114.10.08 亞新（工管一）字第1140040336號 完成計畫主持人簽署及補充法律意見書(不同意展延工期)，呈北工處辦理	追蹤





歷次展延/不計工期控管表

更新日期：2026/9/27

歷次展延/不計工期控管表										
工程名稱復興崗營區職務宿舍新建統包工程										
開工日期	111.5.18	原約工期	1655天	原約完工日期		116.01.29	已核定免計 (含國定假日)		更新日期	115年9月27日
		展延天數	205天	展延後工期		1860天	258天		預估完工日期	117年3月4日
項次	申請事由	預估天數(天)	是否陳報	是否立案	是否免計	免計天數(天)	是否展延	展延天數(天)	辦理過程說明	辦理狀況
3	土方- 工區處處有隱蔽的既有不明基礎	64	V	V					箱涵改道工程於改道位置挖掘時，發現有些隱蔽的既有不明基礎，經查統包需求說明書等相關契約文件皆未標示，導致箱涵開挖進度延宕出土，以及回填作業必須增加混凝土咬碎及篩土等額外工項，不僅對施工動線造成極大影響，也大幅增加土方作業時程 經114.10.23 備北工營字第1140010024號 依114年10月17日第2次變更設計需求研討會結論 開挖期間不明地下物，俟大底開挖後再行研討處置方案	近期整理再度提出
4	土方- 隱蔽既有不明進水管路(含車道連續壁)	68	V	V					自工區開工以來，多次發現統包需求說明書等相關契約文件皆未標示之進水管線(第一次發現為111年10月23日)；每次遇到這種狀況時，均須立即停止施工作業然後先行止水、抽水及緊急搶修復水，避免影響政戰學院之供水，嚴重影響施工效率，並造成工進緩慢。 經114.10.23 備北工營字第1140010024號 依114年10月17日第2次變更設計需求研討會結論 開挖期間不明地下物，俟大底開挖後再行研討處置方案	近期整理再度提出
5	土方- 隱蔽廢棄物(土石方收容不符臺北港標準及導溝開挖廢棄物)	112	V	V					連續壁導溝作業挖掘出之土石方帶有大量人工廢棄物，必須額外進行土石方過篩才能外運，嚴重影響土石方清運效率，並衍生篩土作業及額外進行土石方紀錄作業。 經114.10.23 備北工營字第1140010024號 依114年10月17日第2次變更設計需求研討會結論 開挖期間不明地下物，俟大底開挖後再行研討處置方案	近期整理再度提出
6	土方- B7類土石方收容量能不足	232	V	V					113.08.20 113宏工4873提出室礙 經114.10.23 備北工營字第1140010024號 依114年10月17日第2次變更設計需求研討會結論 開挖期間不明地下物，俟大底開挖後再行研討處置方案	追蹤





歷次展延/不計工期控管表

更新日期：2026/9/27

歷次展延/不計工期控管表										
工程名稱 復興崗營區職務宿舍新建統包工程										
開工日期	111.5.18	原約工期	1655天	原約完工日期		116.01.29	已核定免計 (含國定假日)		更新日期	115年9月27日
		展延天數	205天	展延後工期		1860天	258天		預估完工日期	117年3月4日
項次	申請事由	預估天數(天)	是否陳報	是否立案	是否免計	免計天數(天)	是否展延	展延天數(天)	辦理過程說明	辦理狀況
7	透地雷達報告	188	V	V					113.7.5 113宏工3940 臺北市政府都市發展局113年2月20日北市都建字第1136090966號函第四條第(二)款第2目之說明「113年3月1日後申報放樣勘驗案件，應於放樣勘驗前提送施工前檢測資料，並於竣工勘驗前提送竣工前檢測資料報告」。 本案為辦理112雜字第0043號雜項執照之放樣勘驗作業，故於113年6月14日申請，113年6月19日由建管處承辦人至工區進行會勘，會後始要求本公司須檢附前項函文要求之道路檢測資料報告後，放樣勘驗作業方可核准；本公司後續於113年7月4日將相關文件送交建管處進行審查，惟已導致後續連續壁勘驗作業延誤，亦影響工區連續壁工項執行時間。綜上所述，明顯屬地方政府法令變更所衍生之工期延誤及契約價金增加之情形，依契約規定得申請工程延期(113年6月19日至113年12月23日放樣勘驗核准) 114.01.16 114宏工0365重新提出 114.01.22 (114)亞新復興崗(監)字第0048號 要求提出計算方式及佐證資料 114.02.19 114宏工1094彙整後重新提出 114.02.27 亞新(工管一)字第1140008798號提出審查意見 114.10.15 114宏工7146 併於第二次變更設計項目中提出 114.10.20 亞新(工管一)字第1140060637號開立審查意見 114.11.07 亞新(工管一)字第1140063363號(公文未發給本公司)建議增加費用項目【1次】(未建議工期) 114.11.26 備北工營字第1140011161號 督商納入變更設計辦理	待變更設計再提出
8	113年7月~114年9月因雨濕度影響	185	V	V					已發文保留權益	待併案提出





歷次展延/不計工期控管表

更新日期：2026/9/27

歷次展延/不計工期控管表										
工程名稱 復興崗營區職務宿舍新建統包工程										
開工日期	111.5.18	原約工期	1655天	原約完工日期		116.01.29	已核定免計(含國定假日)		更新日期	115年9月27日
		展延天數	205天	展延後工期		1860天	258天		預估完工日期	117年3月4日
項次	申請事由	預估天數(天)	是否陳報	是否立案	是否免計	免計天數(天)	是否展延	展延天數(天)	辦理過程說明	辦理狀況
9	114年春節免計天數	4	V	V					114.3.26 114宏工2085 提出爭議 114.4.1 (114)亞新復興崗(監)字第0166號 建議列入待處理工程爭議事項管制 114.4.9 備北工營字第1140003112號 請納入「待處置工程爭議事項彙整表」 114.4.15 (114)亞新復興崗(監)字第0191號 請完善「待處置工程爭議事項彙整表」 114.4.15 備北工營字第1140003410號 請納入「待處置工程爭議事項彙整表」 114.4.22 (114)亞新復興崗(監)字第0203號 請完善「待處置工程爭議事項彙整表」 114.7.11 114宏工字4878 提送工期爭議事項處置方案評估及建議說明資料 114.9.2 亞新(工管一)字第1140038722號 呈北工處	追蹤
10	114.1.4國防大學校慶	1	V	V	X				113宏工7970 114.3.6備北工營字第1140002056號 監造報表有施工不同意申請	待後續辦理
11	資通管線遷移(第一次變更)	268	V	X			X		114.01.16 114宏工0365重新提出 114.01.22 (114)亞新復興崗(監)字第0048號 要求提出計算方式及佐證資料 114.02.19 114宏工1094彙整後重新提出 114.02.27 亞新(工管一)字第1140008798號提出依第一次變更設計合約已載明不追加工期·不同意辦理	待後續辦理





歷次展延/不計工期控管表

更新日期：2026/9/27

歷次展延/不計工期控管表										
工程名稱 復興崗營區職務宿舍新建統包工程										
開工日期	111.5.18	原約工期	1655天	原約完工日期		116.01.29	已核定免計 (含國定假日)		更新日期	115年9月27日
		展延天數	205天	展延後工期		1860天	258天		預估完工日期	117年3月4日
項次	申請事由	預估天數(天)	是否陳報	是否立案	是否免計	免計天數(天)	是否展延	展延天數(天)	辦理過程說明	辦理狀況
12	復工後遭王正源要求停止出土	8	V	X					114.01.10 114宏工0274 提出因王正源要求停工展延工期 114.01.20 亞新(工管一)字第1140002189號 不同意辦理 114.01.23 114宏工0563 再次重申展延工期訴求，後續依據主辦機關114年1月7日管制會議結論，另案提出	待後續辦理
13	開工~114/8/3週日免計	164.5	V	V	V	41	X	0	114.10.01 114宏工字6885提出申請164.5日(168-3.5原已同意) 114.10.28 (114)亞新復興崗(監)字第0504號 同意44.5日(41+3.5原已同意) 不同意123.5日 114.10.29 亞新(工管一)字第1140063360號 同意41日 不同意123.5日 114.11.19 備北工營字第1140010730號 核定41日 114.12.02 114宏工8303 提出異議 114.12.09 (114)亞新復興崗(監)字第0576號 要求檢具相關事證	追蹤
14	115/3/10媽祖繞境	1	V	V					115.03.13 115宏工字第1150001540號 提出申請 115.03.19 (115)亞新復興崗(監)字第0101號 不同意辦理 115.03.26 115宏工字第1150001834號 再次申請 115.04.01 (115)亞新復興崗(監)字第0118號備忘錄 115.04.07 亞新(工管一)字第1150016374號 不同意，呈北處核示115.04.21 備北工營字第1150003187號 檢退	追蹤
15	115/3/20安全支撐說明會	1	V	V					115.04.09 115宏工字第1150002091號 提出申請 115.04.17 亞新(工管一)字第1150018731號 呈北處核示 115.04.24 備北工營字第1150003413號 檢退	追蹤





歷次展延/不計工期控管表

更新日期：2026/9/27

歷次展延/不計工期控管表										
工程名稱 復興崗營區職務宿舍新建統包工程										
開工日期	111.5.18	原約工期	1655天	原約完工日期		116.01.29	已核定免計(含國定假日)		更新日期	115年9月27日
		展延天數	205天	展延後工期		1860天	258天		預估完工日期	117年3月4日
項次	申請事由	預估天數(天)	是否陳報	是否立案	是否免計	免計天數(天)	是否展延	展延天數(天)	辦理過程說明	辦理狀況
16	115.05.05 因雨影響開挖作業	1	V	V					115.05.07 115宏工字第1150002751號 提出 115.05.14 (115)亞新復興崗(監)字第0203號 說明與契約規定不符，呈權責機關核定 115.05.15 亞新(工管一)字第1150025344號 呈北處核示 115.05.26 備北工營字第1150004385號 檢退	追蹤
17	115.05.06 因雨影響開挖作業	1	V	V					115.05.07 115宏工字第1150002750號 提出 115.05.14 (115)亞新復興崗(監)字第0203號 說明與契約規定不符，呈權責機關核定 115.05.15 亞新(工管一)字第1150025344號 呈北處核示 115.05.26 備北工營字第1150004385號 檢退	追蹤
18	115.05.07 因雨影響開挖作業	1	V	V					115.05.12 115宏工字第1150002824號 提出 115.05.14 (115)亞新復興崗(監)字第0203號 說明與契約規定不符，呈權責機關核定 115.05.15 亞新(工管一)字第1150025344號 呈北處核示 115.05.26 備北工營字第1150004385號 檢退	追蹤
19	115.05.08 因雨影響開挖作業	1	V	V					115.05.12 115宏工字第1150002825號 提出 115.05.14 (115)亞新復興崗(監)字第0203號 說明與契約規定不符，呈權責機關核定 115.05.15 亞新(工管一)字第1150025344號 呈北處核示 115.05.26 備北工營字第1150004385號 檢退	追蹤





歷次展延/不計工期控管表

更新日期：2026/9/27

歷次展延/不計工期控管表										
工程名稱 復興崗營區職務宿舍新建統包工程										
開工日期	111.5.18	原約工期	1655天	原約完工日期		116.01.29	已核定免計 (含國定假日)		更新日期	115年9月27日
		展延天數	205天	展延後工期		1860天	258天		預估完工日期	117年3月4日
項次	申請事由	預估天數(天)	是否 陳報	是否 立案	是否 免計	免計天數 (天)	是否 展延	展延天數 (天)	辦理過程說明	辦理狀況
20	115.06.05因雨無法施作	1	V	V					115.06.08 115宏工字第1150003441號 提出 115.06.15 (115)亞新復興崗(監)字第0243號 說明 與契約規定不符·陳請機關核示 115.06.17 亞新(工管一)字第1150032988號 呈 北工處核示 115.06.29 備北工營字第1150005506號 檢退	追蹤
21	115.06.10因雨無法施作	1	V	V					115.06.12 115宏工字第1150003543號 提出 115.06.18 (115)亞新復興崗(監)字第0248號 說明 與契約規定不符·陳請機關核示115.06.22 亞新 (工管一)字第1150034369號 呈北工處核示 115.06.30 備北工營字第1150005699號 請督商 重新提送因天候影響致確無法履約或有安全性顧 慮致影響施工115.07.07 (115)亞新復興崗(監)字 第0281號 應重新提送因天候影響致確無法履約 或有安全性顧慮致影響施工之佐證資料	追蹤
22	115.06.12因雨無法施作	1	V	V					115.06.16 115宏工字第1150003597號 提出 115.06.23 (115)亞新復興崗(監)字第0252號 說明 與契約規定不符·陳請機關核示 115.06.26 亞新(工管一)字第1150036160號 呈 北工處核示	追蹤
23	115.06.17因雨無法施作	1	V	V					115.06.22 115宏工字第1150003723號 提出 115.06.24 (115)亞新復興崗(監)字第0261號 說明 與契約規定不符·陳請機關核示 115.06.26 亞新(工管一)字第1150035062號 呈 北工處核示	追蹤





歷次展延/不計工期控管表

更新日期：2026/9/27

歷次展延/不計工期管控表										
工程名稱復興崗營區職務宿舍新建統包工程										
開工日期	111.5.18	原約工期	1655天	原約完工日期		116.01.29	已核定免計 (含國定假日)		更新日期	115年9月27日
		展延天數	205天	展延後工期		1860天	258天		預估完工日期	117年3月4日
項次	申請事由	預估天數(天)	是否陳報	是否立案	是否免計	免計天數(天)	是否展延	展延天數(天)	辦理過程說明	辦理狀況
24	115.07.09~11巴威颱風	3	V	V	V	2			115.07.13 115宏工字第1150004126號 提出 115.07.17 亞新 (工管) 字第1150041403號 呈北工處核示 115.08.03 備北工營字第1150006623號 核定2日	待後續辦理
25	115.09.01大雨	1	V	V					115.09.03 115宏工字第1150005155號 提出 115.09.10 (115)亞新復興崗(監)字第0374號 同意1日 115.09.11 亞新 (工管) 字第1150053975號 呈北工處核示	追蹤
26	115.09.03~04大雨	2	V	V					115.09.07 115宏工字第1150005202號 提出 115.09.14 (115)亞新復興崗(監)字第0377號 同意2日 115.09.17 亞新 (工管) 字第1150054713號 呈北工處核示	追蹤
27	115.09.12大雨	1	V	V					115.09.15 115宏工字第1150005355號 提出 115.09.18 (115)亞新復興崗(監)字第0387號 同意1日	追蹤





追加訴求

更新日期：2026/9/27


項次	項目	發生時間	我方訴求	目前結論
1	箱涵(覺民樓後方)水溝(新設圍牆排水工程費用)		工期270日 追加14,000,000	已納入第二次變更
2	北市府都發局要求檢附道路檢測資料報告(價金)	113/6/19~113/7/3	展延15日 追加5,938,824	已提送， 依專管建議併第二次變更設計辦理 【第二次變更設計尚未納入討論】
3	箱涵改道	112/10/29~113/3/29	追加13,655,251	不同意變更設計
4	資通管線遷移(基地端)	112/8/7~112/10/26	展延268日 追加4,548,588	不同意變更設計
5	臺北港收容費用上漲	114/1/1~	追加6,460,110	不同意變更設計
6	夜間施工申請	113/7/16~迄今	請協助申請夜間施工	歷經10次申請均遭駁回
7	土方聯單改電子聯單作業費	115/1/1~	追加作業費	尚未提出
8	樹木移植(人行道樹木由一般樹升級為受保護樹)		追加作業費	尚未提出
9	數量追加減(連續壁鋼筋、中間樁數量調整、機電等)		預算流用	9/7已提出
10	1級能效改1+級評估費用差異		追加作業費	尚未提出
11	第一次變更設計設計費		追加作業費	尚未提出
12	建造執照圖說(第2次變更)異動		追加作業費	尚未提出
13	瓦斯遷移費用		追加作業費	尚未提出
14	電桿遷移代辦項目		追加作業費	尚未提出
15	鼠疫防治報告	115/5/19~	額外費用	已發文說明待結構體完成後再提出
16	機電五大管線圖說(第2次變更)異動		追加作業費	尚未提出





估驗計價進度及施工進度表

更新日期：2026/9/27

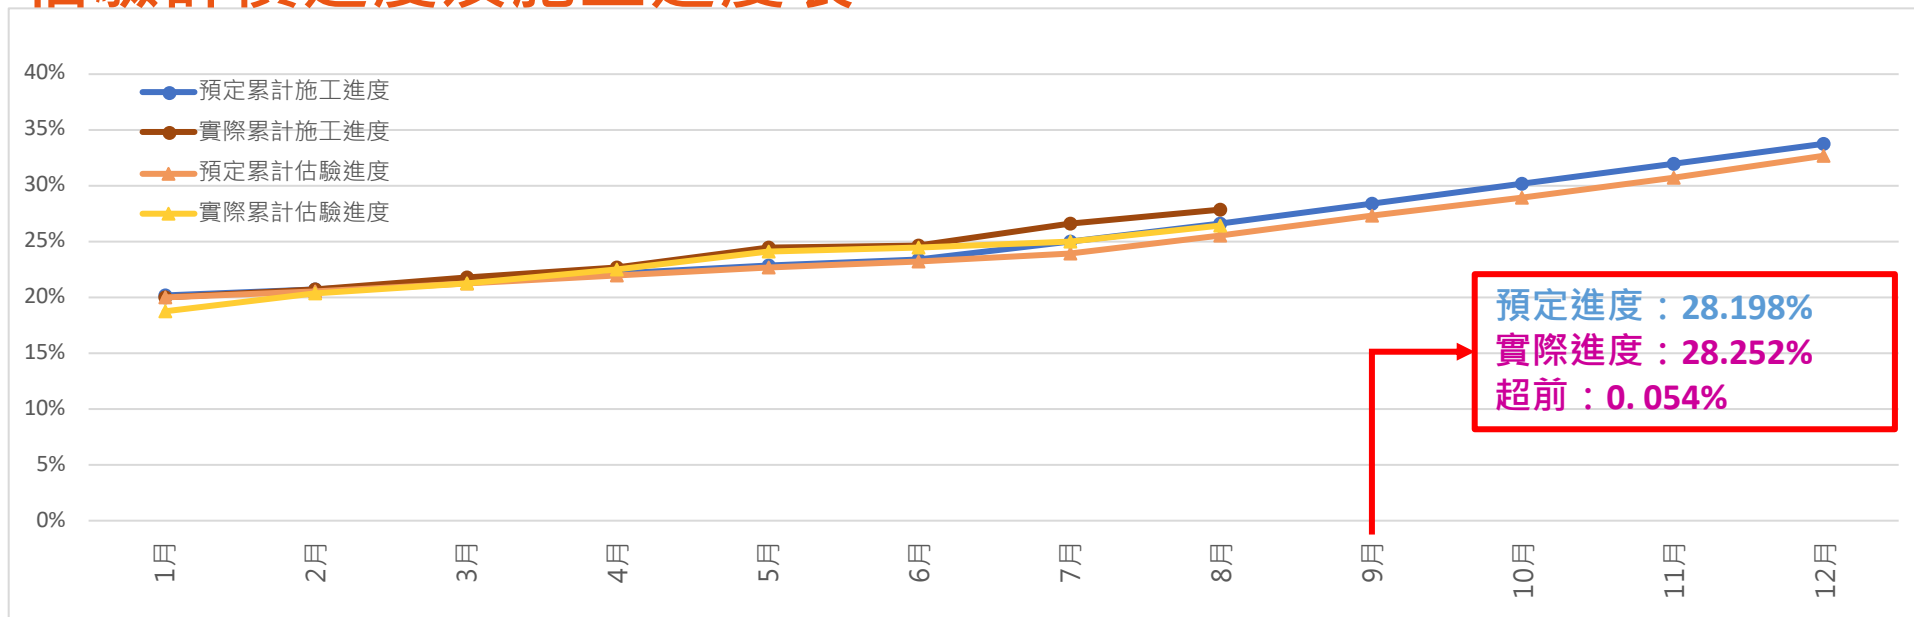

115年													
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
預定單	金額	20,783,145	18,514,611	20,783,145	20,026,967	20,783,145	20,026,967	45,970,494	53,202,565	51,723,180	53,202,565	56,452,231	56,340,637
月施工	進度	0.68%	0.61%	0.68%	0.65%	0.68%	0.65%	1.50%	1.74%	1.69%	1.74%	1.85%	1.84%
實際單	金額	32,828,293	23,040,991	32,099,992	25,374,021	54,315,927	8,027,161	55,246,729	40,217,383				
月施工	進度	1.10%	0.77%	1.07%	0.85%	1.82%	0.27%	1.85%	1.35%				
預定累	金額	615,428,595	633,943,206	654,726,351	674,753,318	695,536,463	715,563,430	761,533,925	814,736,490	866,459,670	919,662,235	976,114,466	1,032,455,103
計施工	進度	20.13%	20.73%	21.41%	22.07%	22.75%	23.40%	24.90%	26.64%	28.34%	30.07%	31.92%	33.76%
實際累	金額	594,072,969	617,113,960	649,213,952	674,587,973	728,903,900	736,931,061	792,177,790	832,395,173				
計施工	進度	19.87%	20.64%	21.71%	22.56%	24.38%	24.65%	26.49%	27.84%				
預定單	金額	18,494,048	20,783,145	18,514,611	20,783,145	20,026,967	20,783,145	20,026,967	45,970,494	53,202,565	51,723,180	53,202,565	56,452,231
月估驗	進度	0.62%	0.69%	0.62%	0.69%	0.67%	0.69%	0.67%	1.54%	1.78%	1.73%	1.78%	1.89%
實際單	金額	併2月	47,603,029	24,040,726	36,120,891	48,679,479	11,571,842	19,166,797	42,759,002				
月估驗	進度		1.59%	0.80%	1.21%	1.63%	0.39%	0.64%	1.43%				
預定累	金額	594,645,450	615,428,595	633,943,206	654,726,351	674,753,318	695,536,463	715,563,431	761,533,925	814,736,490	866,459,670	919,662,235	976,114,466
計估驗	進度	19.87%	20.57%	21.19%	21.88%	22.55%	23.24%	23.91%	25.45%	27.23%	28.96%	30.73%	32.62%
實際累	金額	562,057,831	609,660,860	633,701,586	669,822,477	718,501,956	730,073,798	749,240,595	791,999,597				
計估驗	進度	18.78%	20.37%	21.18%	22.38%	24.01%	24.40%	25.04%	26.47%				



※依115/4/20 備北工營字第1150003386號 核定施工網圖規劃



建管行政流程進度控管表

施工計畫已於114年1月22日

北市都建字第1146076569號函備查

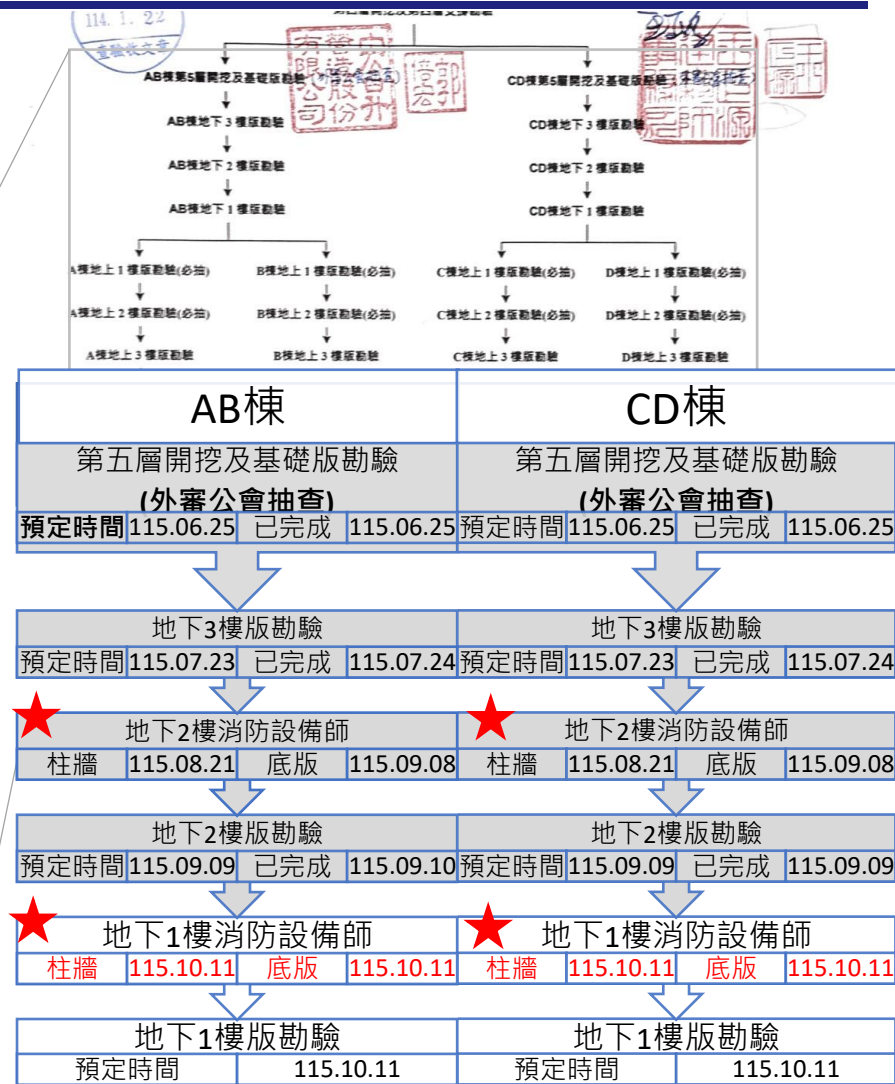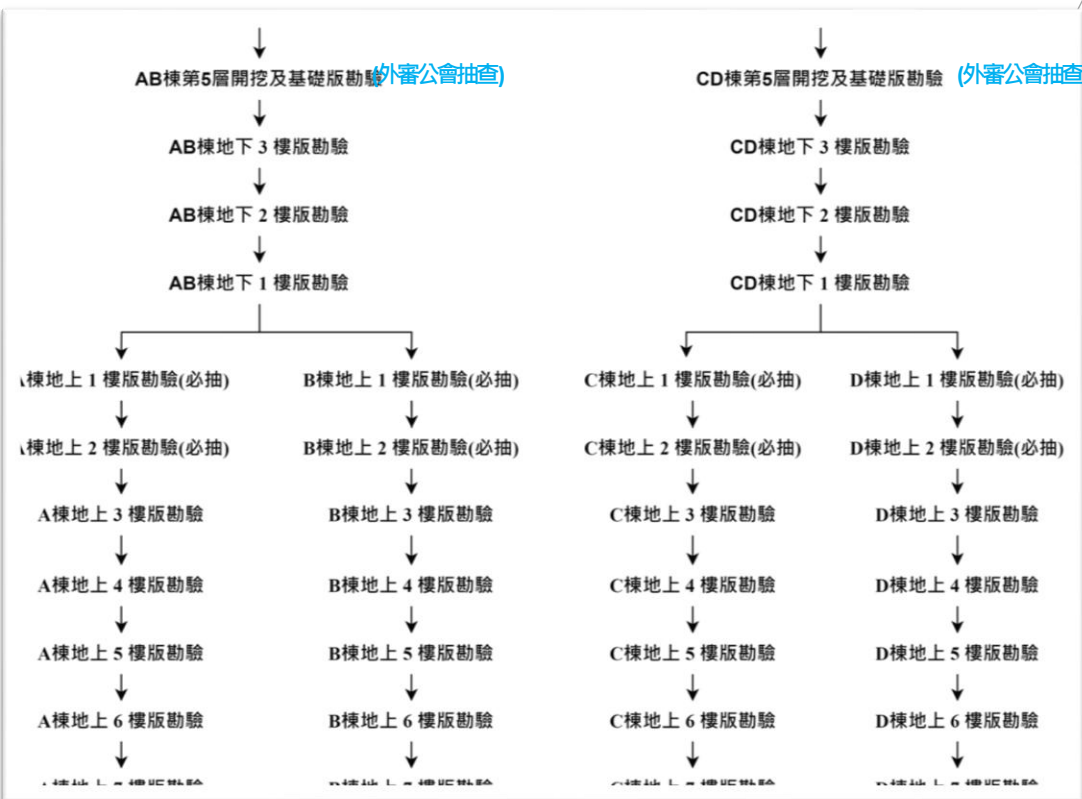

※依115/4/20 備北工營字第1150003386號 核定施工網圖
規劃，並隨現場進度滾動式調整





地下1樓版勘驗文件清單

更新日期：2026/9/27

項次	一般樓層勘驗應準備事項 (A棟/B棟/C棟/D棟)	處理單位						辦理狀況	備註說明	
		起	承		技		監			
		空軍	宏昇營造		技師		王正源			
		印	印	簽	印	簽	印	簽		
1	勘驗申報書等相關用印文件		●	●	●	●	●	●	!	待監造單位提供
2	B14-2建築工程必需勘驗部分申報表						●	●	!	
3	B14-5建築物施工中營造業專任工程人員				●	●			✓	
4	監造現地勘驗檢查報告書						●	●	!	待監造單位提供
5	承造人及營造業技師施工勘驗報告表		●	●	●	●			✓	
6	觀測系統施工勘驗報告表		●	●	●	●			✓	
7	觀測系統監測施工勘驗報告表		●	●	●	●			✓	
8	鋼筋保證書		●	●			●	●	!	待監造單位提供
9	申報前一日施工日誌		●	主任					!	
10	當層鋼筋出場保證書及無汙染證明								!	
11	上一層樓版之混凝土品質保證書、氯離子含量檢測報告及實測資料（技師簽章）、電弧爐渣報告書、碎石級配				●	●			!	
12	建築師、技師及工地主任現場會勘、當層4向鋼筋全景照、觀測告示、圍籬全景照片(請拿白板寫明建照號碼、勘驗項目)								!	
13	監造建築師委託書						●		!	(如有需要)
14	其他列管事項：依建照抽查結果如有新增列管事項應配合辦理完成								!	
!	辦理中	✓ 已完成								





簡報大綱

1

整體進度報告

整體進度說明

歷次展延/不計工期控管表

估驗計價及施工進度表

建管行政流程進度控管表

2

施工單位報告

三月預定進度

三週預定進度

施工進度說明

現場施工照片

送審文件管制

3

設計單位報告

設計進度說明

設計議題討論

4

會議結論辦況



三月預定進度

更新日期：2026/9/27

本週

						8					9				10			
						第一週	第二週	第三週	第四週	第五週	第一週	第二週	第三週	第四週	第一週	第二週	第三週	第四週
	項次	工作項目		開始	完成													
施工	5.9	土方工程	預計	113/5/2	115/7/15													
			實際	113/3/24	115/6/8													
	5.12	基礎及地下層結構工程	預計	115/7/16	116/3/22													
			實際	115/6/1														
	5.12.1	筏基施工	預計	115/7/16	115/8/11													
			實際	115/6/1	115/7/27													
	5.12.1.1	FS(GL-14.05~-13.25)	預計	115/7/11	115/7/20													
			實際	115/6/1	115/7/2													
	5.12.1.2	TB(GL-13.25~-11.85)	預計	115/7/21	115/7/30													
			實際	115/7/3	115/7/14													
	5.12.1.3	BS(B3FL)(GL-11.85~11.55)	預計	115/7/31	115/8/6													
			實際	115/7/15	115/7/27													
	5.12.2	第四層支撐拆除	預計	115/8/7	115/8/11													
			實際	115/8/1	115/8/6													
	5.12.3	B2FL(GL-11.55~-7.95)	預計	115/8/12	115/9/7													
			實際	115/8/7	115/9/11													
	5.12.4	第三層支撐拆除	預計	115/9/8	115/9/12													
			實際	115/9/12	115/9/21													
	5.12.5	B1FL(GL-7.95~-4.35)	預計	115/9/13	115/10/12													
			實際	115/9/22														
5.12.6	第二層支撐拆除	預計	115/10/13	115/10/17														
		實際																
5.12.7	第一層支撐拆除	預計	115/10/18	115/10/22														
		實際																
5.12.8	構台拆除+中間樁(含構台樁)拔除	預計	115/10/23	115/11/1														
		實際																
5.12.9	1FL(GL-4.35~0.0)	預計	115/11/2	115/12/6														
		實際																
5.12.10	車道結構體工程	預計	116/3/2	116/3/22														
		實際																
備註																		



三週預定進度

更新日期：2026/9/27

日期				上週							本週							下週						
				週一	週二	週三	週四	週五	週六	週日	週一	週二	週三	週四	週五	週六	週日	週一	週二	週三	週四	週五	週六	週日
				9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11
施工	5.9	土方工程	預計	113/5/2	115/7/15																			
			實際	113/3/24	115/6/8																			
	5.12	基礎及地下層結構工程	預計	115/7/16	116/3/22																			
			實際	115/6/1																				
	5.12.1	筏基施工	預計	115/7/16	115/8/11																			
			實際	115/6/1	115/7/27																			
	5.12.1.1	FS(GL-14.05~-13.25)	預計	115/7/11	115/7/20																			
			實際	115/6/1	115/7/2																			
	5.12.1.2	TB(GL-13.25~-11.85)	預計	115/7/21	115/7/30																			
			實際	115/7/3	115/7/14																			
	5.12.1.3	BS(B3FL)(GL-11.85~11.55)	預計	115/7/31	115/8/6																			
			實際	115/7/15	115/7/27																			
	5.12.2	第四層支撐拆除	預計	115/8/7	115/8/11																			
			實際	115/8/1	115/8/6																			
	5.12.3	B2FL(GL-11.55~-7.95)	預計	115/8/12	115/9/7																			
			實際	115/8/7	115/9/11																			
	5.12.4	第三層支撐拆除	預計	115/9/8	115/9/12																			
			實際	115/9/12	115/9/21																			
	5.12.5	B1FL(GL-7.95~-4.35)	預計	115/9/13	115/10/12																			
			實際	115/9/22																				
	5.12.6	第二層支撐拆除	預計	115/10/13	115/10/17																			
			實際																					
	5.12.7	第一層支撐拆除	預計	115/10/18	115/10/22																			
			實際																					
	5.12.8	構台拆除+中間樁(含構台樁)拔	預計	115/10/23	115/11/1																			
			實際																					
	5.12.9	1FL(GL-4.35~0.0)	預計	115/11/2	115/12/6																			
			實際																					
	5.12.10	車道結構體工程	預計	116/3/2	116/3/22																			
			實際																					
備註																								

※依115/4/20 備北工營字第1150003386號 核定施工網圖規劃



施工進度說明

更新日期：2026/9/27

時間		預定進度	實際進度	進度差異	備註
上週進度	115-09-21 ~ 115-09-27	28.198%	28.252%	0.054%	
本週進度	115-09-28 ~ 115-10-04	28.556%			施工網圖已於 115/4/20 核定最新 版
下週進度	115-10-05 ~ 115-10-11	28.988%			
合約開工日期：	111年05月18日	申報動工日期：	111年11月21日	原訂完工日： (1655日)	116年01月29日
展延工期：	205日	展延後完工日：	116年09月02日	免計工期： (例行性)	104日
預定竣工日期： (1860日)	117年03月04日			免計工期： (非例行性)	154日

工期檢討：統計至115年09月27日，已用工期1373日，剩餘工期487日





施工進度說明

更新日期：9/29

B 2 F 施工進度圖

鋼筋綁紮進度(%)				
棟別/部位	柱	梁	版	牆
A棟	90	0	0	10
B棟	90	0	0	0
C棟	100	0	0	0
D棟	100	0	0	0


 柱筋綁紮範圍

地下一層結構平面圖

更新日期：2026/9/27

施工進度說明

B 2 F 柱 牆 放 樣 配 管 施 工 進 度 圖

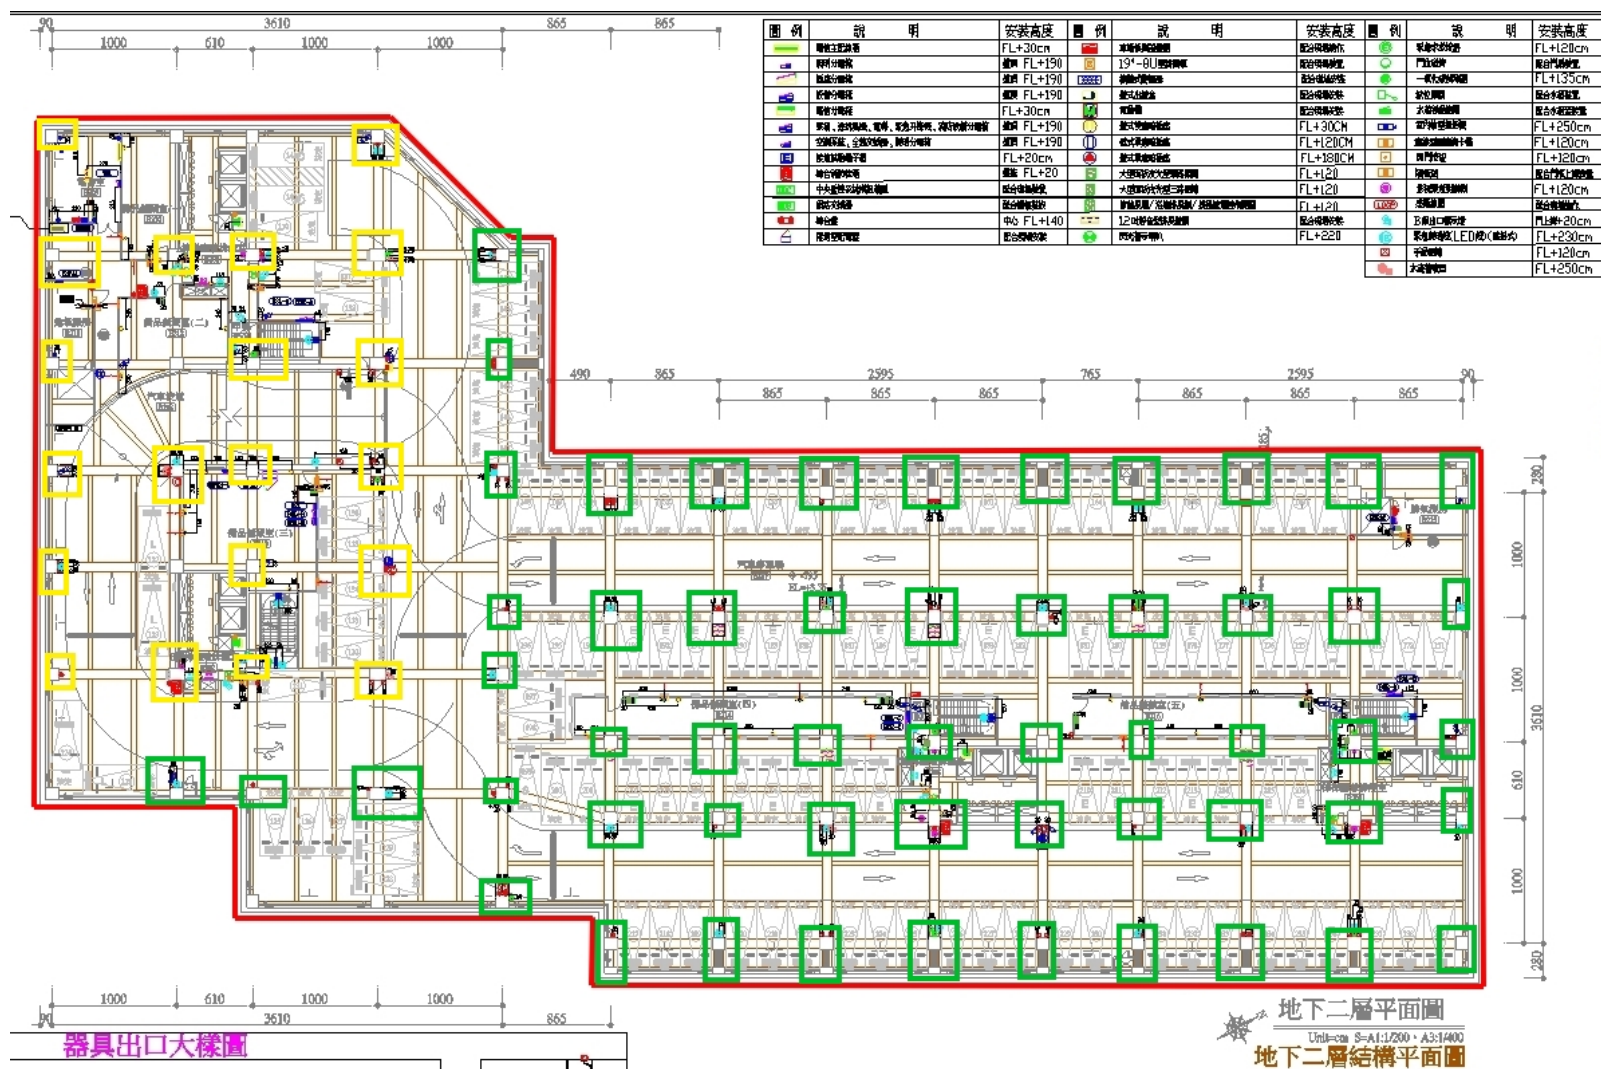

B2F柱牆配管進度

放樣進度：40%

配管進度：40%

目前只有柱子放樣配

☒ 已完成

☐ 施作中



安全觀測頻率

更新日期：2026/9/27

結構體工程

監測儀器名稱	頻率
壁中傾度管	每階段開挖前後，水平支撐施加預壓及拆除前後，每周各觀測二次，平時每周一次。
地中傾度管	每階段開挖前後，水平支撐施加預壓及拆除前後，每周各觀測二次，平時每周一次。
鋼筋應力計	每階段開挖前後，水平支撐施加預壓及拆除前後，每周各觀測二次，平時每周一次。
中間柱隆起尺(點)	每階段開挖前後，水平支撐施加預壓及拆除前後，每周各觀測二次，平時每周一次。
建物傾斜計	每階段開挖前後，水平支撐施加預壓及拆除前後，每周各觀測二次，平時每周一次。
沉陷觀測釘	每階段開挖前後，水平支撐施加預壓及拆除前後，每周各觀測二次，平時每周一次。
水位觀測井	開挖或抽水期間每周二次，平時每周一次。
水壓計	每階段開挖前後，水平支撐施加預壓及拆除前後，每周各觀測一次，抽水作業期間每周三次，平時每周一次。
支撐應變計	每階段開挖前後，水平支撐施加預壓及拆除前後，每周各觀測二次，平時每周一次。

- 開挖階段為第一層土方開挖(含各層支撐加壓)至大底澆置完成。
- 平時階段為大底澆置完成(含各層支撐拆除)至 1 樓板完成。





前週安全觀測報告

更新日期：2026/9/27

115/9/21

案名：復興崗營區職務宿舍新建統包工程

本次觀測日期：115/9/21

工地進度：

第三層水平支撐拆除完成

前次日期：115/9/18

監測儀器	編號	本次 最大值	深度	本次 最大 變化量	前次 最大值	深度	前次 最大 變化量		管理值	警戒值	行動值	單位	有無 超過 行動值
壁中 傾度管	SID-1	0.82	CM	9.5	0.80	CM	9.5	±	1.45	1.80	2.20	CM	無
	SID-2	0.89	CM	12.5	0.90	CM	12.5						無
	SID-3	1.20	CM	11.5	1.22	CM	11.5						無
	SID-4	1.37	CM	11.0	1.32	CM	11.0						無
	SID-5	1.30	CM	12.5	1.35	CM	12.5						無
監測儀器	編號	本次 最大值	深度	本次 最大 變化量	前次 最大值	深度	前次 最大 變化量		管理值	警戒值	行動值	單位	有無 超過 行動值
地中 傾度管	SIS-1	1.77	CM	11.0	1.76	CM	11.0	±	1.45	1.80	2.20	CM	無
	SIS-2	1.40	CM	10.5	1.39	CM	10.5						無
	SIS-3	1.51	CM	12.5	1.56	CM	12.5						無
	SIS-4	1.75	CM	11.5	1.74	CM	11.5						無
	SIS-5	1.62	CM	12.0	1.59	CM	12.0						無
監測儀器	編號	本次 最大值	單位	編號	前次 最大值	單位	編號		管理值	警戒值	行動值	單位	有無 超過 行動值
鋼筋 應力計	RS-1-40	-98.96	kg/cm ²	RS-32	-93.95	kg/cm ²	RS-22	±	1280	1600	2000	kg/cm ²	無
監測儀器	編號	本次 變化量	本次 傾斜 方向	本次 最大 變化量	前次 變化量	前次 傾斜 方向	前次 最大 變化量		管理值	警戒值	行動值		有無 超過 行動值
建物 傾斜計	TI-1(X)	1/10000	→	1/12500	→	1/12500	→	±	1/700	1/600	1/500		無
	TI-1(Y)	-1/16666	→	-1/8333	→	-1/8333	→						無
	TI-2(X)	1/3333	→	1/2777	→	1/2777	→						無
	TI-2(Y)	-1/6249	→	-1/16666	→	-1/16666	→						無
	TI-3(X)	-1/9999	→	-1/8333	→	-1/8333	→						無
	TI-3(Y)	-1/7142	→	-1/8333	→	-1/8333	→						無
	TI-4(X)	1/2777	→	1/3333	→	1/3333	→						無
	TI-4(Y)	1/6249	→	1/5555	→	1/5555	→						無
	TI-5(X)	0		-1/24999	→	-1/24999	→						無
	TI-5(Y)	1/5555	→	1/6250	→	1/6250	→						無
	TI-6(X)	-1/49999	→	-1/12500	→	-1/12500	→						無
	TI-6(Y)	-1/8333	→	-1/6250	→	-1/6250	→						無
	TI-7(X)	-1/16666	→	-1/12500	→	-1/12500	→						無
	TI-7(Y)	1/12500	→	1/10000	→	1/10000	→						無
	TI-8(X)	1/7142	→	1/7142	→	1/7142	→						無
	TI-8(Y)	0		-1/49999	→	-1/49999	→						無
	TI-9(X)	1/12500	→	1/49999	→	1/49999	→						無
	TI-9(Y)	1/8333	→	1/24999	→	1/24999	→						無
	TI-10(X)	-1/12500	→	-1/5555	→	-1/5555	→						無
	TI-10(Y)	1/9999	→	1/7142	→	1/7142	→						無
	TI-11(X)	1/4166	→	1/6249	→	1/6249	→						無
	TI-11(Y)	1/2380	→	1/2380	→	1/2380	→						無
	TI-12(X)	1/4999	→	1/10000	→	1/10000	→						無
	TI-12(Y)	1/24999	→	-1/50000	→	-1/50000	→						無
	TI-13(X)	-1/7142	→	-1/4545	→	-1/4545	→						無
	TI-13(Y)	1/8333	→	1/16666	→	1/16666	→						無
	TI-14(X)	-1/50000	→	1/24999	→	1/24999	→						無
	TI-14(Y)	-1/16666	→	-1/8333	→	-1/8333	→						無
	TI-15(X)	1/9999	→	1/9999	→	1/9999	→						無
	TI-15(Y)	-1/16666	→	-1/12500	→	-1/12500	→						無

案名：復興崗營區職務宿舍新建統包工程

本次觀測日期：115/9/21

工地進度：

第三層水平支撐拆除完成

前次日期：115/9/18

監測儀器	編號	本次 最大值	單位	編號	前次 最大值	單位	編號		管理值	警戒值	行動值	單位	有無 超過 行動值
沉陷 觀測點 (地表)	SM-1-38	-1.27	CM	SM-2	-1.27	CM	SM-34	±	1.50	2.00	2.50	CM	無
監測儀器	編號	本次 最大值	單位	編號	前次 最大值	單位	編號		管理值	警戒值	行動值	單位	有無 超過 行動值
沉陷 觀測點 (建物)	SB-1-60	-1.37	CM	SB-2	-1.38	CM	SB-2	±	2.00	3.00	4.00	CM	無
監測儀器	編號	本次 水位高程	單位	編號	前次 水位高程	單位	編號	水位差 (m)	管理值	警戒值	行動值	單位	有無 超過 行動值
水位 觀測井	OW-1	-2.64	m		-2.62	m		-0.02	±1.0	±2.0	±3.0	m	無
	OW-2	-2.96	m		-2.95	m		-0.01					無
監測儀器	編號	本次 水壓力	單位	編號	前次 水壓力	單位	編號		管理值	警戒值	行動值		檢核 結果
水壓計	P-1	27.60	T/m ²	FS-1.3	27.62	T/m ²	FS-1.3			FS≥1.20	FS≥1.15		OK
空間控制網上舉檢核：FS-覆土重/水壓力，各階段壓力水頭控制剖水壓計監測頁面。													
監測儀器	編號	本次 最大值	單位	編號	前次 最大值	單位	編號		管理值	警戒值	行動值	單位	有無 超過 行動值
中間柱 隆起尺(點)	BM-1-6	1.22	CM	H-3	1.20	CM	H-3	±	3.00	6.00	9.00	CM	無
監測儀器	層數	本次 最大值	單位	編號	前次 變化量	單位	前次 最大 變化量	本層 型鋼	管理值	警戒值	行動值	單位	有無 超過 行動值
支撐 應變計	1	39.94	ton	VG1-09	41.59	ton	VG1-03	H350	46.56	58.2	69.84	ton	無
	2	91.36	ton	VG2-05	95.10	ton	VG2-05	H400	80.72	100.9	121.08	ton	無

※本次觀測結果均無超過行動值，所有“監測數值”均在安全範圍內。

與上週數值相比無異常變動





前週安全觀測報告

更新日期：2026/9/27

115/9/23

業主：宏昇營造股份有限公司 王騰建築師事務所

案名：復興崗營區職務宿舍新建統包工程

本次觀測日期：115/9/23

工地進度：

第三層水平支撐拆除完成

前次日期：115/9/21

監測儀器	編號	本次 最大值	深度	本次 最大 變化量	前次 最大值	深度	前次 最大 變化量		管理值	警戒值	行動值	單位	有無 超過 行動值
壁中 傾度管	SID-1	0.81 cm	9.5 m		0.82 cm	9.5 m		±	1.45	1.80	2.20	cm	無
	SID-2	0.85 cm	12.5 m		0.89 cm	12.5 m							無
	SID-3	1.16 cm	11.5 m		1.20 cm	11.5 m							無
	SID-4	1.34 cm	11.0 m	←最大	1.37 cm	11.0 m	←最大						無
	SID-5	1.26 cm	12.5 m		1.30 cm	12.5 m							無
監測儀器	編號	本次 最大值	深度	本次 最大 變化量	前次 最大值	深度	前次 最大 變化量		管理值	警戒值	行動值	單位	有無 超過 行動值
地中 傾度管	SIS-1	1.70 cm	11.0 m		1.77 cm	11.0 m	←最大	±	1.45	1.80	2.20	cm	無
	SIS-2	1.37 cm	10.5 m		1.40 cm	10.5 m							無
	SIS-3	1.49 cm	12.5 m		1.51 cm	12.5 m							無
	SIS-4	1.74 cm	11.5 m	←最大	1.75 cm	11.5 m							無
	SIS-5	1.62 cm	12.0 m		1.62 cm	12.0 m							無
監測儀器	編號	本次 最大值	單位	編號	前次 最大值	單位	編號		管理值	警戒值	行動值	單位	有無 超過 行動值
鋼筋 應力計	RS-1-40	-97.23	kg/cm ²	RS-22	-98.96	kg/cm ²	RS-32	±	1280	1600	2000	kg/cm ²	無
監測儀器	編號	本次 變化量	本次 傾斜 方向	本次 最大 變化量	前次 變化量	前次 傾斜 方向	前次 最大 變化量		管理值	警戒值	行動值		有無 超過 行動值
建物 傾斜計	TI-1(X)	1/10000	→1		1/10000	→1		±	1/700	1/600	1/500		無
	TI-1(Y)	-1/12500	→4		-1/16666	→4							無
	TI-2(X)	1/3333	→1		1/3333	→1							無
	TI-2(Y)	-1/8333	→4		-1/8249	→4							無
	TI-3(X)	-1/16666	→3		-1/9999	→3							無
	TI-3(Y)	-1/8249	→4		-1/7142	→4							無
	TI-4(X)	1/2631	→1		1/2777	→1							無
	TI-4(Y)	1/4166	→2		1/6249	→2							無
	TI-5(X)	-1/49999	→3		0								無
	TI-5(Y)	1/7142	→2		1/5555	→2							無
	TI-6(X)	1/50000	→1		-1/49999	→3							無
	TI-6(Y)	-1/8250	→4		-1/8333	→4							無
	TI-7(X)	-1/10000	→3		-1/16666	→3							無
	TI-7(Y)	1/25000	→2		1/12500	→2							無
	TI-8(X)	1/12500	→1		1/7142	→1							無
	TI-8(Y)	-1/16666	→4		0								無
	TI-9(X)	1/8333	→1		1/12500	→1							無
	TI-9(Y)	1/16666	→2		1/8333	→2							無
	TI-10(X)	-1/8250	→3		-1/12500	→3							無
	TI-10(Y)	1/5555	→2		1/9999	→2							無
	TI-11(X)	1/4545	→1		1/4166	→1							無
	TI-11(Y)	1/2272	→2	←最大	1/2380	→2	←最大						無
	TI-12(X)	1/7142	→1		1/4999	→1							無
	TI-12(Y)	1/49999	→2		1/24999	→2							無
	TI-13(X)	-1/5555	→3		-1/7142	→3							無
	TI-13(Y)	1/9999	→2		1/8333	→2							無
	TI-14(X)	-1/25000	→3		-1/50000	→3							無
	TI-14(Y)	-1/16666	→4		-1/16666	→4							無
	TI-15(X)	1/12500	→1		1/9999	→1							無
	TI-15(Y)	-1/12500	→4		-1/16666	→4							無

業主：宏昇營造股份有限公司 王騰建築師事務所

案名：復興崗營區職務宿舍新建統包工程

本次觀測日期：115/9/23

工地進度：

第三層水平支撐拆除完成

前次日期：115/9/21

監測儀器	編號	本次 最大值	單位	編號	前次 最大值	單位	編號		管理值	警戒值	行動值	單位	有無 超過 行動值
沉陷 觀測點 (地表)	SM-1-38	-1.27	cm	SM-2	-1.27	cm	SM-2	±	1.50	2.00	2.50	cm	無
監測儀器	編號	本次 最大值	單位	編號	前次 最大值	單位	編號		管理值	警戒值	行動值	單位	有無 超過 行動值
沉陷 觀測點 (建物)	SB-1-60	-1.36	cm	SB-2	-1.37	cm	SB-2	±	2.00	3.00	4.00	cm	無
監測儀器	編號	本次 水位高程	單位	前次 水位高程	單位	水位差 (m)		管理值	警戒值	行動值	單位	有無 超過 行動值	
水位 觀測井	OW-1	-2.61	m	-2.64	m	0.03	±1.0	±2.0	±3.0	m		無	
	OW-2	-2.93	m	-2.96	m	0.03							
監測儀器	編號	本次 水壓力	單位	前次 水壓力	單位			管理值	警戒值	行動值		檢核 結果	
水壓計	P-1	27.54	T/m ²	FS-1.3	27.60	T/m ²	FS-1.3			FS≥1.20	FS≥1.15		OK
空間挖動間土層檢核：FS=覆土重/水壓力，各階段壓力水頭控制詳水壓計監測頁面。													
監測儀器	編號	本次 最大值	單位	編號	前次 最大值	單位	編號		管理值	警戒值	行動值	單位	有無 超過 行動值
中間柱 隆起尺(點)	RM-1-6	1.10	cm	H-3	1.22	cm	H-3	±	3.00	6.00	9.00	cm	無
監測儀器	層數	本次 最大值	單位	編號	前次 變化量	單位	前次 最大 變化量	本層 型鋼	管理值	警戒值	行動值	單位	有無 超過 行動值
支撐 應變計	1	41.43	ton	VG1-03	39.94	ton	VG1-09	R350	46.56	58.2	69.84	ton	無
	2	90.92	ton	VG2-05	91.36	ton	VG2-05	R400	80.72	100.9	121.08	ton	無

※本次觀測結果均無超過行動值，所有“監測數值”均在安全範圍內。



與上週數值相比無異常變動





現場施工照片

更新日期：2026/9/27

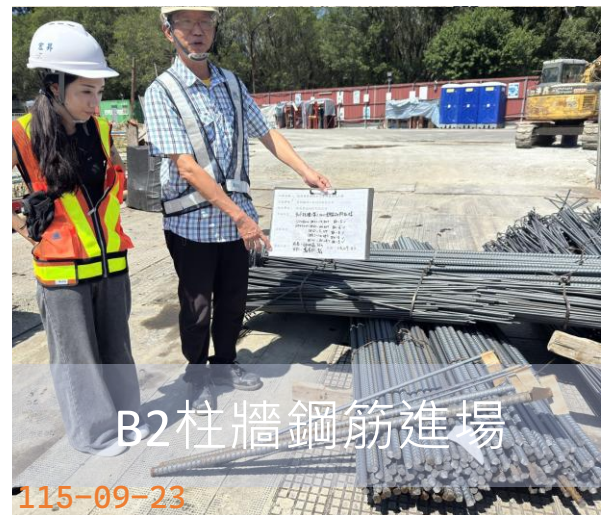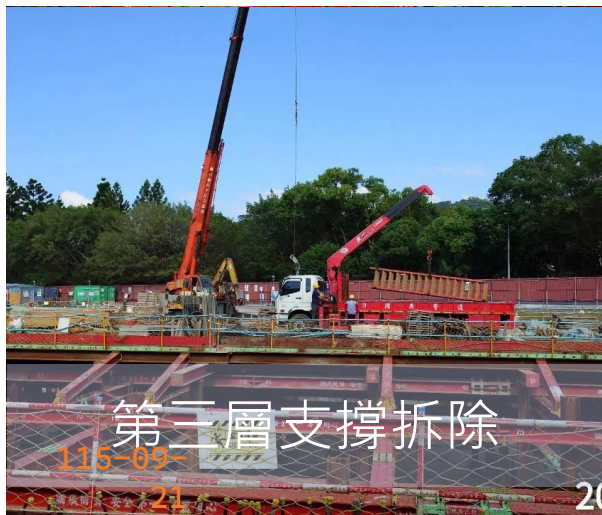



外部單位稽查統計

更新日期：2026/9/27

外部單位稽查統計		
稽查單位	稽查次數	計罰金額
台北市勞動檢查處	12	-
台北市政府環境保護局	148	472,000
民意代表	7	-
警察局北投分局	3	-
工營中心	9	77,000
北工處	39	220,000
軍備局工程營產處	6	-
軍備局職安室	5	1,000
建管處	4	66,000
民眾陳情	31	-
新工處	2	-
農田水利會	1	-
總計	267	836,000

本月份外部單位稽查：

9/1環保局例行性稽查、9/3勞檢例行性稽查、9/3環保局例行性稽查、9/8環保局例行性稽查、9/11環保局稽查(施工噪音)、9/12環保局例行性稽查、9/15環保局例行性稽查、9/17環保局例行性稽查、9/22環保局例行性稽查、9/24環保局例行性稽查、9/26環保局例行性稽查、9/27環保局例行性稽查





送審材料管制表 (建築)

更新日期：2026/9/27

項次	項目	預定送審時程	實際送審日期	監造同意審查日期	專管同意核定日期	機關同意備查日期
1	預拌混凝土材料廠商資格送審(和昌)	111/11/15	111/11/8	111/12/1	111/12/1	111/12/2
2	預拌混凝土材料廠商資格送審(龍形)	111/11/15	111/11/8	111/12/1	111/12/1	111/12/2
3	鋼筋材料廠商資格送審 (宜聯)	111/11/15	111/10/3	111/11/14	111/11/14	111/11/17
4	鋼筋材料廠商資格送審 (東和鋼鐵)	111/11/15	111/9/30	111/11/14	111/11/14	111/11/17
5	鋼筋材料廠商資格送審 (羅東鋼鐵)	111/11/15	111/10/3	111/11/14	111/11/14	111/11/17
6	實驗室廠商資格送審 (裕全顧問)	112/1/4	112/1/3	112/1/5	112/1/6	112/1/9
7	實驗室廠商資格送審 (台灣檢驗)	112/1/10	112/1/9	112/1/11	112/1/12	112/1/13
8	實驗室廠商資格送審 (正中工程)	112/4/27	112/4/26	112/5/4	112/5/5	112/5/12
9	點焊鋼絲網 (鴻星鐵網)	112/4/19	112/4/18	112/5/4	112/5/5	112/5/12
10	鋼筋材料廠商資格送審 (沛波鋼鐵)	113/2/16	113/2/16	113/3/7	113/3/11	113/3/26
11	鋼筋續接器廠商資格 (常基)	113/9/1	113/5/24	113/5/27	113/5/28	113/6/11
12	實驗室廠商資格送審 (鄭兆鴻實驗室)	113/7/12	113/7/12	113/7/17	113/7/19	113/8/5
13	箱涵改道廠商資格(弘展)	112/11/13	112/11/13	112/11/30	111/12/1	111/12/12
14	安全支撐廠商資格(國廣)	112/11/13	112/11/13	112/11/30	111/12/1	111/12/12
15	安全觀測廠商資格(正皓)	112/11/14	112/11/14	112/11/23	111/11/27	111/12/5
16	基樁載重試驗廠商資格(三正)	113/1/29	113/1/29	113/2/2	113/2/5	113/2/17
17	有價物清運廠商資格(晉鑫環保)	112/9/22	112/9/22	112/11/2	112/11/3	112/11/15
18	防水材料	115/12/31				





送審材料管制表 (建築)

更新日期：2026/9/27

項次	項目	預定送審時程	實際送審日期	監造同意審查日期	專管同意核定日期	機關同意備查日期
19	電梯工程	116/1/1	115/6/15			
20	油漆(乳膠漆)材料	116/1/1				
21	輕隔間隔間材料	116/1/1				
22	天花板材料	116/1/15				
23	導水板	116/1/15				
24	隔音地墊	116/1/15				
25	磁磚(地磚)材料	116/1/15				
26	磁磚(壁磚)材料	116/1/15				
27	環氧樹脂地坪	116/1/15				
28	隔音地墊	116/2/1				
29	鋁門窗材料	116/3/15				
30	強化玻纖門	116/3/15				
31	烤漆鋼板門	116/3/15				
32	石材	116/8/15				
33	PVC木紋踢腳板	116/10/1				
34	雜項金屬鐵件	116/10/15				
35	外牆隔柵	116/10/15				
36	吸音材	116/10/30				
37	耐磨木地板	116/11/1				
38	鋁合金地板	116/11/1				
39	橡膠運動地板	116/11/1				
40	指標工程	116/11/1				
41	景觀工程	116/11/1				
42	家具及辦公設備	116/11/5				





送審文件管制表 (建築)

更新日期：2026/9/27

項次	項目	預定送審時程	實際送審日期	監造同意審查日期	專管同意核定日期	機關同意備查日期
1	整體施工計畫書(核定一版)	113/12/10	113/12/10	113/12/13	113/12/18	113/12/30
2	整體品質計畫書(核定一版)	113/12/30	113/12/30	114/1/7	114/1/10	114/1/23
3	職業安全衛生管理計畫書(核定一版)	113/11/29	113/11/29	113/12/5	113/12/9	113/12/20
4	拆除工程計畫書	111/7/17	111/7/15	111/8/8	111/8/8	111/8/17
5	地下油槽拆除計畫書	111/12/31	111/10/28	111/11/18	111/11/18	111/11/24
6	假設工程分項施工暨品質計畫書	111/10/15	111/10/3	111/10/26	111/10/26	111/10/28
7	樹木移植工程分項施工暨品質計畫書	111/10/15	111/10/13	111/10/28	111/10/28	111/11/2
8	拆除餘土清理計畫書	111/10/15	111/10/14	111/10/26	111/10/26	111/10/28
9	有價物清運計畫	111/12/2	111/12/1	111/12/5	112/1/13	112/1/16
10	箱涵改道分項施工計畫書	112/9/5	112/9/5	112/9/8	112/11/22	112/12/5
11	安全支撐分項施工計畫書 (箱涵工程)	112/11/13	112/11/13	112/11/17	111/12/1	112/12/12
12	安全觀測施工暨品質計畫書 (箱涵工程及主體結構工程)	112/11/14	112/11/14	112/11/17	112/11/17	112/11/29
13	建築資訊模型(BIM)工作執行計畫書	112/9/11	112/9/11	112/9/15	113/1/9	113/1/16
14	縮時攝影施工暨品質計畫書	112/7/24	112/7/24	1226/8/8	112/8/11	112/8/21
15	安全圍籬維護計畫書(維護、回收)	112/12/28	112/12/28	112/12/28	112/12/28	113/1/5
16	安全圍籬之美化綠牆施工計畫書	112/12/28	112/12/28	112/12/28	112/12/28	113/1/5
17	連續壁分項施工暨品質計畫書	113/1/24	113/1/24	113/1/31	113/3/5	113/3/15
18	承載層預鑽判岩計畫書	113/1/8	113/1/8	113/1/9	113/1/9	113/1/19
19	基樁載重試驗計畫書	113/1/29	113/1/29	113/2/2	113/2/5	113/2/17
20	營建剩餘土石方暨泥漿處理計畫書	113/1/30	113/1/30	113/2/2	113/2/15	113/2/19





送審文件管制表 (建築)

更新日期：2026/9/27

項次	項目	預定送審時程	實際送審日期	監造同意審查日期	專管同意核定日期	機關同意備查日期
21	施工階段工程風險評估報告	112/8/11	112/8/11	113/1/15	113/1/17	113/1/30
22	土方開挖工程	113/12/1	113/11/8	113/12/30	113/12/31	114/1/8
23	安全支撐施工暨品質計畫書(主體結構工程)	113/12/1	113/7/18	113/8/2	113/8/5	113/8/16
24	鋼筋施工計畫書	114/1/15	113/12/18	114/1/7	114/1/8	114/2/14
25	混凝土施工計畫書	114/3/30	114/2/11	114/3/3	114/3/4	114/3/17
26	模板施工計畫書	115/5/30	115/4/30	115/5/26	115/5/27	115/6/11
27	植筋工程施工計畫書	115/5/30	115/5/12	115/5/14	115/5/15	115/5/25
28	施工架施工計畫書	115/6/30	115/5/21	115/6/8	115/6/9	115/6/24
29	油漆工程施工計畫書	115/12/18				
30	輕隔間施工計畫書	115/12/18				
31	天花板工程施工計畫書	115/12/31				
32	防水施工計畫書	115/12/31				
33	電梯工程施工計畫書	116/1/1				
34	隔音墊工程施工計畫書	116/1/15				
35	EPOXY工程施工計畫書	116/1/15				
36	磁磚計畫書	116/2/1				
37	景觀排水施工計畫書(第二次變更設計)	116/2/10				
38	強化玻纖門施工計畫書	116/3/1				
39	金屬防火門施工計畫書	116/3/1				
40	鋁門窗工程施工計畫書	116/3/1				





送審文件管制表 (建築)

更新日期：2026/9/27

項次	項目	預定送審時程	實際送審日期	監造同意審查日期	專管同意核定日期	機關同意備查日期
41	石材工程施工計畫書	116/8/1				
42	透空圍牆施工計畫書	116/8/1				
43	電動捲/伸縮門工程施工計畫書	116/9/1				
44	搗擺工程施工計畫書	116/9/1				
45	雜項鐵件金屬工程施工計畫書	116/10/1				
46	停車防護設備工程施工計畫書	116/11/1				
47	指標工程施工計畫書	116/11/1				
48	景觀綠化植栽施工計畫書	116/11/1				
49	傢俱及辦公設備安裝施工計畫書	116/11/5				
50	木地板施工計畫書	116/11/5				
51	防水閘門安裝施工計畫書	116/11/10				
52	景觀塑木設施施工計畫書	116/11/10				
53	鋁合金高架地板施工計畫書	116/11/10				
54	運動橡膠地坪工程施工計畫書	116/11/10				





送審材料管制表 (機電)

更新日期：2026/9/27

項次	項目	預定送審時程	實際送審日期	監造同意審查日期	專管同意核定日期	機關同意備查日期
1	管遷材料廠商資格送審 (常佑機電)	111/11/15	111/10/24	112/1/13	112/1/18	112/1/31
2	工務所水電管線材料送審	112/4/28	112/4/27	112/5/29	112/5/30	112/6/6
3	2-2-1階細部設計 資通管線材料送審	112/8/8	112/8/7	112/8/21	112/8/22	112/8/29
4	CCTV設備廠商資格送審 (高峰企業)	113/6/11	113/6/11	113/7/2	113/7/2	113/7/10
5	工安漏電檢測箱設備廠商資格 (元太能源科技)	113/11/5	113/11/5	113/11/7	113/11/8	113/11/20
6	門禁人臉辨識系統備廠商資格	113/7/22	113/7/22	113/7/29	113/7/30	113/8/15
7	接地工程管線材料送審	113/10/16	113/10/16	113/10/23	113/10/25	113/11/5
8	假設工程臨時水電管線材料送審	113/9/30	113/9/30	113/10/7	113/10/8	113/10/11
9	假設工程臨時水電設備送審	113/11/1	113/11/1	113/11/7	113/11/8	113/11/19
10	導電線材類 PVC電線、FR防火耐燃線、耐熱線、PEX電線	114/6/30	114/6/13	114/8/5	114/8/5	114/8/14
11	PVC管： 電管類、排水管類、CD管、DWV-PVC管-橘紅色、低噪音	114/8/30	114/8/5	114/8/12	114/8/13	114/8/14
12	金屬管： EMT管、RSG管、鍍鋅鋼管(消防)、不銹鋼被覆管(車牙管-冷熱水)	115/1/15	114/8/5	114/8/12	114/8/13	114/8/14
13	電氣人孔、弱電手孔、陰井人孔、汙水陰井(含鑄鐵蓋)(基地內五大管線系統)	115/9/15	115/8/25	115/8/27	115/8/28	115/9/9





送審材料管制表 (機電)

項次	項目	預定送審時程	實際送審日期	監造同意審查日期	專管同意核定日期	機關同意備查日期
14	發電機-750kw、黑煙淨化器	115/10/15	115/8/26	115/9/15	115/9/17	
15	弱電系統： 電話配線架、端子板、無線電視共同數位天線系統、宅內弱電整合箱工程、光纖設備、BCW裸銅線、對絞隔離線、屋內電話線、資訊線、同軸電纜線	115/12/30				
16	閥類： 閘門凡而、蝶閥、逆止凡而、緩衝式逆止凡而、球塞凡而、浮球凡而、高壓浮球凡而、不鏽鋼子母型定水位閥、不鏽鋼水錘吸收(緩衝)器、不銹鋼防震軟管、不銹鋼製減壓閥組、釋氣閥、角應力吸收器、電動蝶閥、底閥	116/5/15				
17	不銹鋼防震軟管	116/5/15				
18	泵浦類： 1.沉水式廢水、雨水、污水、排水、滯洪排放泵浦 2.揚水泵浦、陸上型加壓泵浦、陸上型變頻加壓泵浦組	116/5/15				
19	停車場號誌設備	116/5/15				
20	燈具類 壁式日光燈、崁燈、吸頂燈、景觀燈具、住戶燈具、航空障礙燈、照樹燈、車道燈、燈具光源、防爆燈	116/5/15				
21	動力電氣類 低壓配電盤箱體、弱電箱體、住戶開關箱(合併智能箱)、ATS、RCSW、UPS不斷電系統、變壓器	116/6/15				
22	空調工程(空調主機、室內送風機、全熱交換器)-公共區	116/6/15				
23	智慧建築設備工程(監控工程): 智慧型數位監控影像錄影主機、保全對講管理總機、彩色影視對講防盜兼緊急求救主機、業務廣播設備	116/6/30				
24	落水頭及衛生設備	116/6/30				
25	浴廁排風機(含逆止風門)	116/6/30				





送審材料管制表 (機電)

更新日期：2026/9/27

項次	項目	預定送審時程	實際送審日期	監造同意審查日期	專管同意核定日期	機關同意備查日期
26	不銹鋼管機械接頭(滾溝式)、機械接頭(滾溝式)消防	116/6/30				
27	行動電話增波設備	116/6/30				
28	消防設備-水 消防、泡沫、撒水送水口、陸上型全套式消防泵組、陸上型全套式泡沫泵組、陸上型全套式撒水泵組、陸上型消防採水泵、消防用一齊開放閥、水流警報器、泡沫原槽液、泡沫原液、泡沫頭、感知噴頭、比例混合器、自動感知撒水頭、防震接頭、消防鋼管、水鐘水流警報器、閘閥、擺動型逆止閥、Y型過濾器、底閥	116/7/15				
29	消防設備-電 消防栓箱及火警綜合盤、緩降機、安全門、避難方向指示燈、出口標示燈、R型火警探測器、緊急自動照明燈、緊急廣播系統、R型火警受信總機、防火阻絕、消防排煙進風風機	116/7/15				
30	發電機室進排風系統設備工程、停車場進排風系統設備工程、浴廁排風機(含逆止風門)	116/7/30				
31	開關插座類 開關插座(電話、網路)、電話及資訊壁式插座雙出口、電視壁式插座出線口、紅外線燈控開關、防爆接線盒	116/10/15				
32	噴灌工程1F/RF	116/10/15				
33	匯流排設備工程	116/12/15				
34	中水處理工程	116/12/30				
35	太陽能工程	116/12/30				
36	防火阻隔(防火填塞)	116/12/30				





送審文件管制表 (機電)

更新日期：2026/9/27

項次	項目	預定送審時程	實際送審日期	監造同意審查日期	專管同意核定日期	機關同意備查日期
1	管線路遷移工程分項施工計畫書	111/10/15	111/10/12	112/1/12	112/1/16	112/1/30
2	供電切換計畫書	111/12/2	111/12/1	111/12/14	111/12/19	111/12/22
3	資通管線分項計畫書及施工圖	112/8/8	112/8/7	112/9/14	112/9/21	114/3/18
4	假設工程臨時水電施工計畫書	113/6/21	113/6/21	113/7/29	113/7/29	112/8/13
5	接地工程施工計畫書	113/9/25	113/9/25	113/9/30	113/10/1	113/10/7
6	機電預埋管分項施工計畫暨品質計畫書	114/5/2	114/5/2	114/5/6	114/5/7	114/5/28
7	電器設備工程施工計畫書	114/10/30	114/8/27	114/8/28	114/9/1	114/9/11
8	給排水設備工程施工計畫書	114/10/30	114/10/9	114/10/14	114/10/20	114/11/5
9	消防工程暨品質施工計畫書	115/4/30	114/12/15	114/12/31	114/12/31	115/1/16
10	弱電設備工程暨品質施工計畫書	115/5/31	115/1/20	115/1/22	115/1/22	115/2/5
11	中央監控系統及資訊設備工程施工計畫書	116/1/30				
12	衛浴設備工程施工計畫書	116/1/30				
13	景觀噴灌工程施工計畫書	116/2/10				
14	停車場設施工程施工計畫書	116/2/28				
15	空調系統設備工程施工計畫書	116/3/30				
16	瓦斯系統工程施工計畫書	116/3/30				
17	太陽能設備工程施工計畫書	116/4/30				
18	機電設備測試運轉計畫書	116/5/30				
19	機電設備廠驗計畫書(發電機、通風、馬達、消防)依各類系統施工日30日前	116/6/30				



臨時動議-屋頂水箱排水

更新日期：2026/9/27


(1) 各棟屋頂水箱溢流排水6吋PVC管，依【1110606-污排水圖[第五階段][細部設計圖][核定版]114.01.09】，圖名：屋突一層污排水配管平面圖(全)，圖號：D2-16，如附件一、二、三、四、五所示下行水平排水幹管行經A6戶、B6戶、C1戶、D1戶室內餐廳天花，6吋管路路徑無天花板包覆，影響使用美觀甚鉅，管路依設計圖規劃，由餐廳旁浴室管道間下行至B1F，排向雨水回收池，該管道間寬度20公分，管路及固定件至少需要21.5公分，明顯空間不足。

(2) 建議方案：如附件六所示，屋頂水箱溢流排水管，於水箱室地面穿牆排向屋頂平台，間接利用平台洩水坡度及淺溝，流經屋頂地面排水孔與垂直幹管，最終進入雨水回收池。


以上說明，詳附件，懇請設計單位協助釋疑，並提供參考意見。

附件說明：

- (1) 1110606-污排水圖114.01.09-R1F_圖號D2-16
- (2) 給水系統昇位圖(一)_圖號WW1-02及局部放大圖
- (3) 屋頂水箱6吋排水吊管圖
- (4) 各棟屋頂水箱溢流排水管剖面示意圖
- (5) 天花板與水箱溢流排水管相對位置
- (6) 屋頂水箱排水建議調整前後對照示意圖

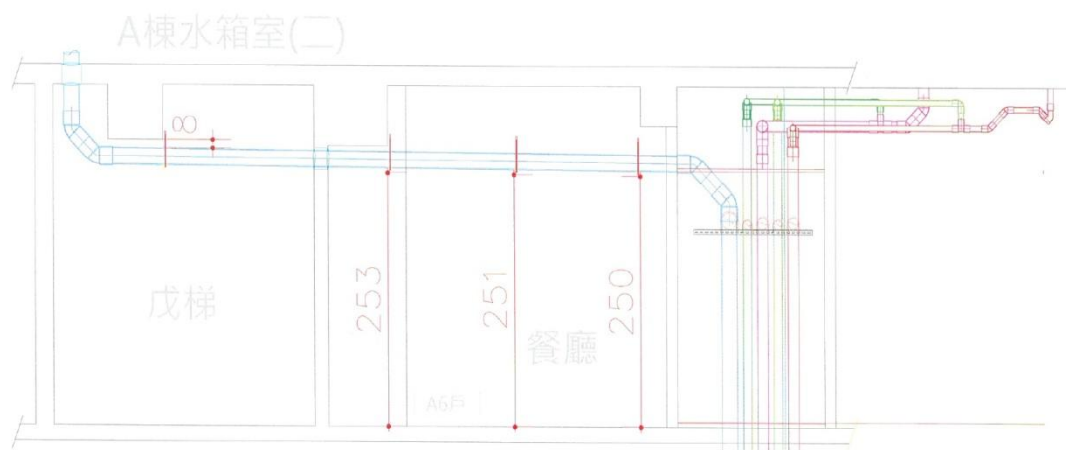


各棟屋頂水箱溢流排水管剖面示意圖

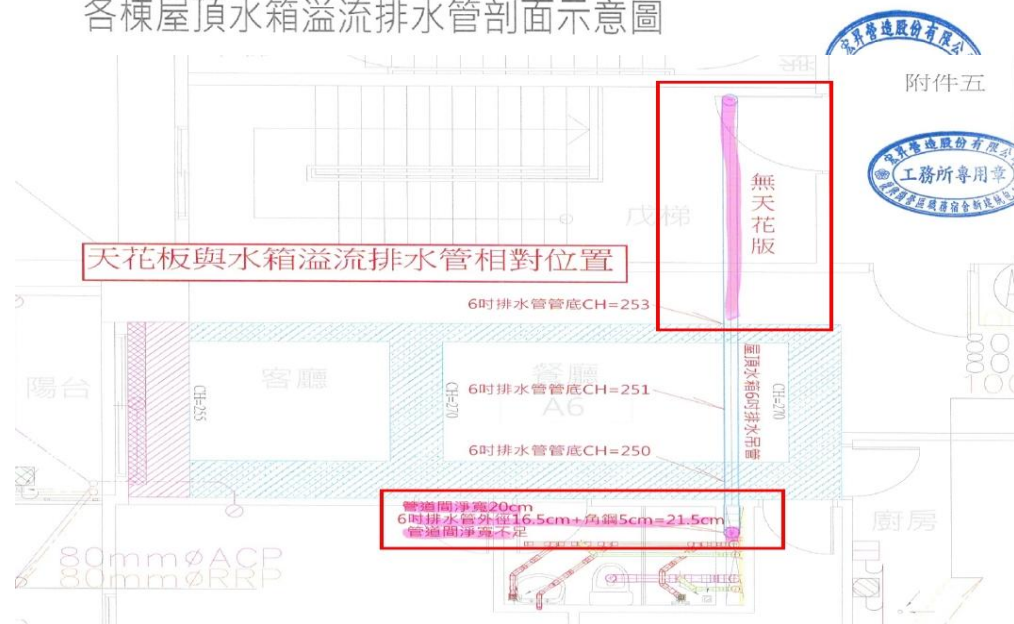


臨時動議-屋頂水箱排水

更新日期：2026/9/27

屋頂水箱排水建議調整前後對照示意圖

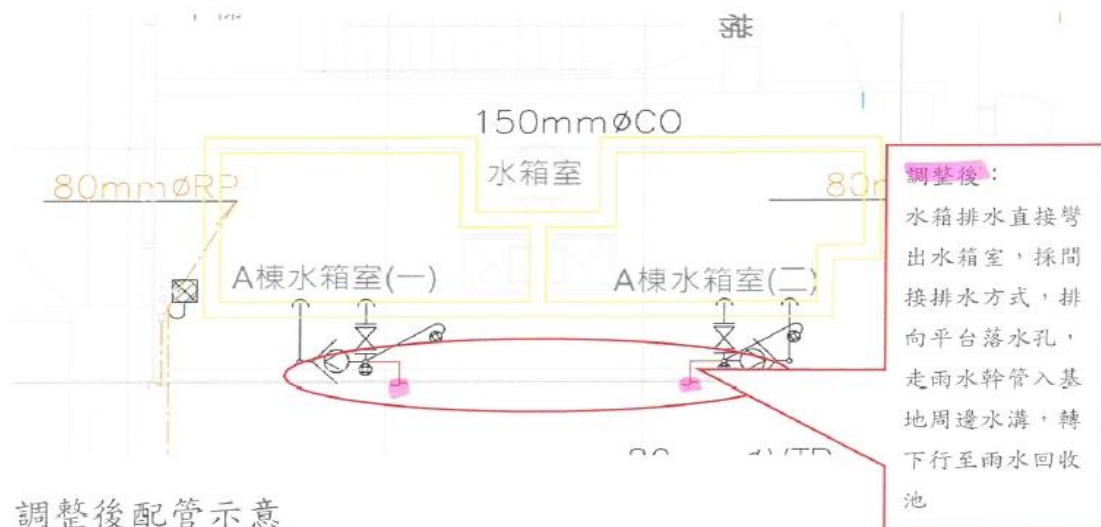

調整後配管示意

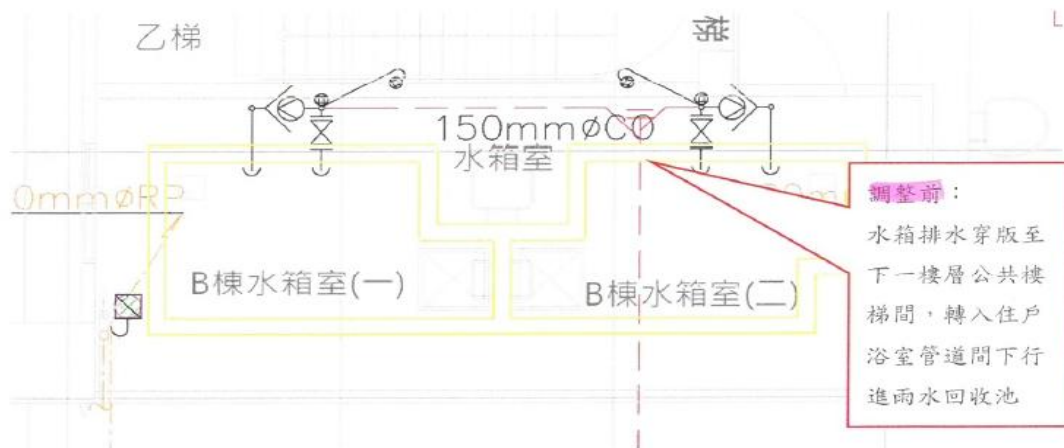



簡報大綱

1

整體進度報告

整體進度說明

歷次展延/不計工期控管表

估驗計價及施工進度表

建管行政流程進度控管表

2

施工單位報告

三月預定進度

三週預定進度

施工進度說明

現場施工照片

送審文件管制

3

設計單位報告

設計進度說明

設計議題討論

4

會議結論辦況



第二次執照變更取得核可後後續作業時間管制表：

更新日期：2026/9/27

項次	項目	掛件日期(業管收件日期)	預定完成	實際完成	施工節點	說明
第二次建照變更後後續工作內容	1	第二次建造執照變更	114/08/25	115/01/19	115/01/19	(預計)115/12/05 一樓板勘驗日期 (依業管辦理程序時程為主) 不影響施工節點
	2	第二次建造執照報備	115/02/10	115/04/30	115/3/18	- (依業管辦理程序時程為主)
	3	(1)公共設施設備圖 (五大管線)	113/07/08	113/11/30	113/07/23 ~ 113/11/28	(預計)114/07/03 放樣勘驗 (預計)115/7/15 基礎版勘驗 放勘:電信、消防、污排水 基礎版:電力、自來水 (已取得五大管線核准文, 不影響施工節點)
		(2)五大管線第一次變更	(預計) 115/03/19	(預計) 115/07/10	115/05/21 ~ 115/07/23	- 1.(消防待報備核准後辦理) 此次變更 不影響勘驗作業 2.因115/6開始消防審查由消防局改至消防大隊,故圖說重新審查,比原預估日期多2週
	4	建築能效評估	(預計) 115/08/15	(預計) 116/03/31		





基礎版-1樓版勘驗設計文件管制時程表

更新日期：2026/9/27

勘驗相關設計核可文件取得時間管制表:				
項次	項目	建管管制時間	建管勘驗時間	核可文件取得時間
0	建照開工	建照取得後60~90日	113/6/5 取得建照	113/9/3日前(已取得)
1	建築設備(電力、避雷)目的事業主管機關(台電)核可文件(簽證報告、書圖、建築師委託書)	第一次樓板勘驗前(基礎版)	(預計)115/07/15	114/03/04(已取得)
2	自來水表後設備完成審查核可文件	第一次樓板勘驗前(基礎版)	(預計)115/07/15	113/11/28(已取得)
3	流出抑制計畫(水利處)審查核可	基礎版勘驗前	(預計)115/07/15	113/09/30(已取得)
4	綠建築候選證書(銅級)取得	1樓板勘驗前	(預計)115/12/05	114/08/19(已取得)
5	智慧建築候選證書取得	1樓板勘驗前	(預計)115/12/05	114/04/18(已取得)
註:本表時間依115/3/5提送第四、五階段細設核定後修正之施工網圖				





設計進度說明

更新日期：2026/9/27

項次	項目	管制日期	預計提送	上周設計工作 115-09-21 115-09-25	本周設計工作 115-09-28 115-10-02	下周設計工作 115-10-05 115-10-09	備註
			實際提送				
1	建築能效評估	114 08-25	-	9/17(五)取得空軍用印文件(空軍115/9/14發文)(國空人庶字第1150216081號) 9/21(一)完成上傳作業,等待審查作業 9/23取得審查意見	9/29(二)~10/02(五)修正作業	依審查作業修正	
2	五管變更			待確認是否納入後續變更設計的依據	待確認是否納入後續變更設計的依據	待確認是否納入後續變更設計的依據	
3	區外排水 (案內_第二次變更)			依4/28建研環字第1157638324號函整理相關資料後辦理	依4/28建研環字第1157638324號函整理相關資料後辦理	依4/28建研環字第1157638324號函整理相關資料後辦理	

[註]:前期提出預計取得建築能效評估時間為116/2/28，為最快可以取得時間，實際仍依業管機關審核及核發時間為主。






-候選階段-
(建築能效評估)

更新日期：2026/9/27

115年

116年

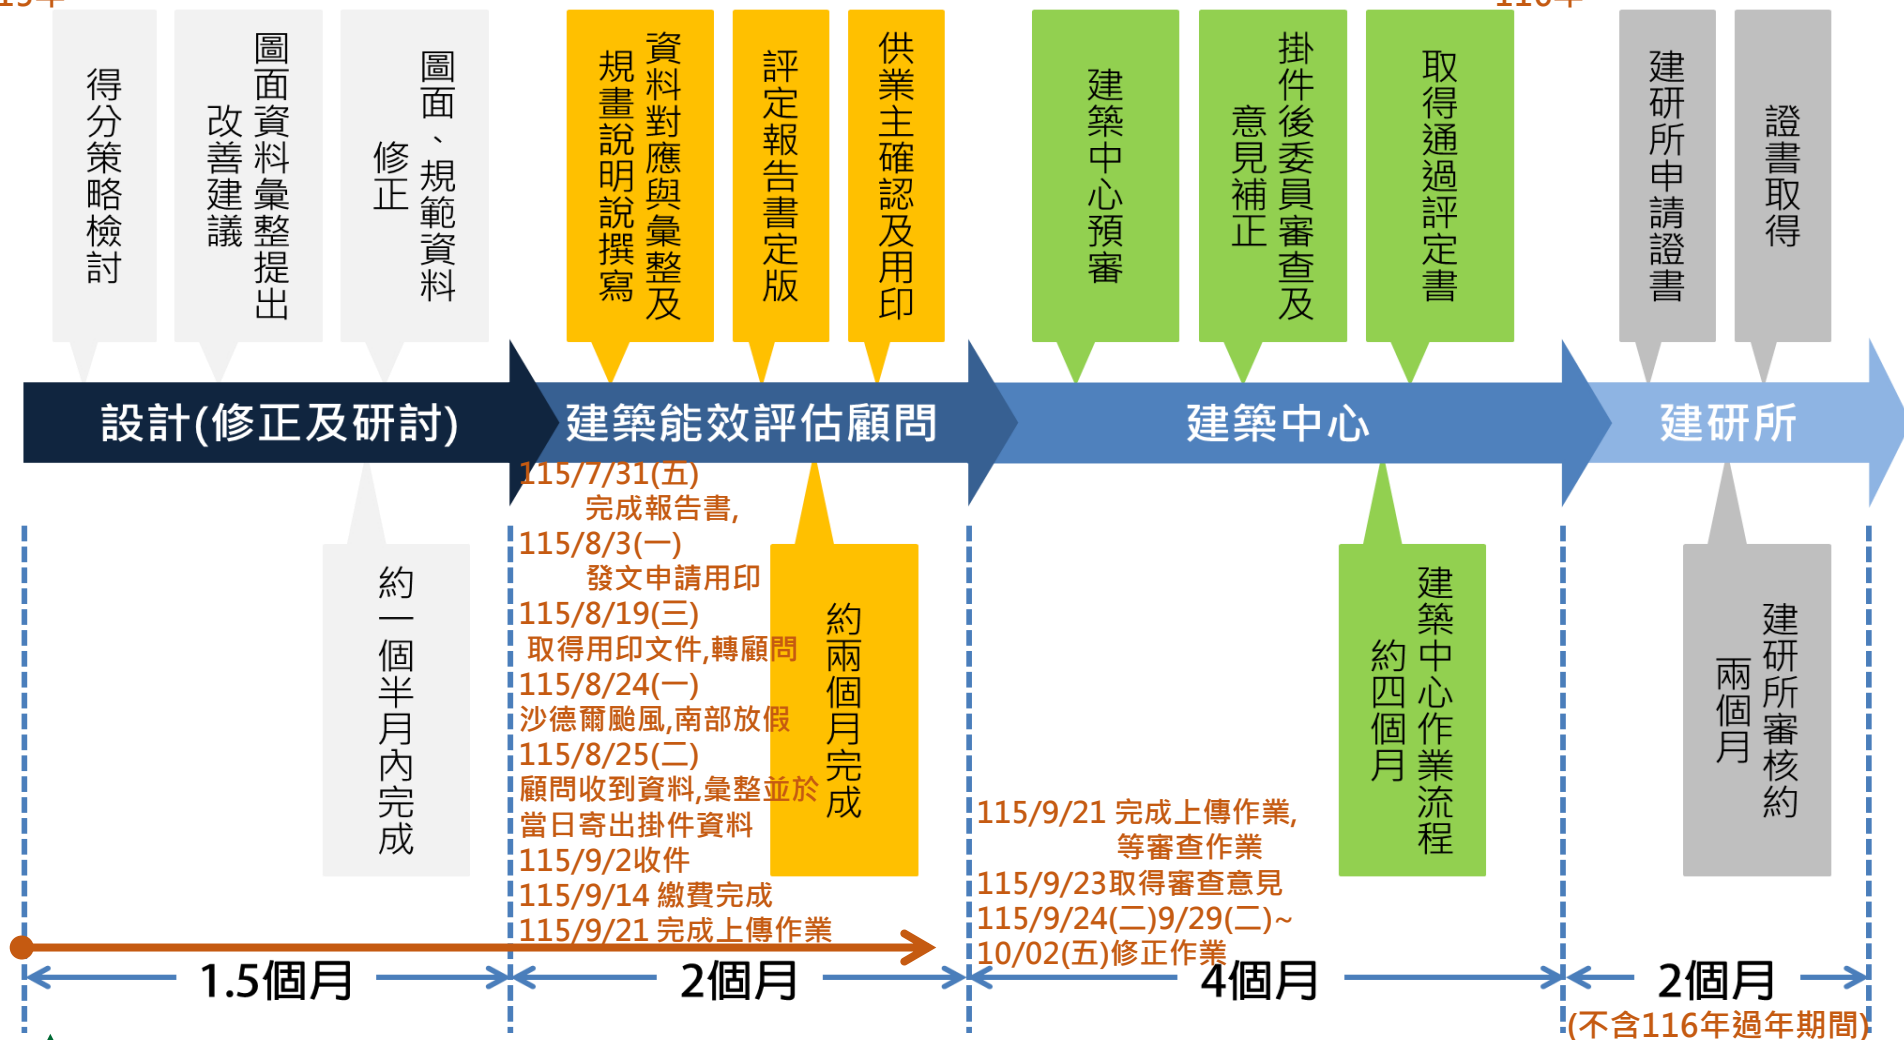



建築能效評估進度說明

更新日期：2026/9/27

項目	1150731 預計提送建築中心審查版
外殼 EEV	0.46
空調 EAC 1 (住宅空間)	0.9 (無裝設空調)
空調 EAC 2 (公共空間)	0.69 (空調報告書)
照明 EL 1 (住宅空間)	0.4
照明 EL 2 (公共空間)	0.63
熱水器	0.80 (一級能效-瓦斯熱水器)
熱水管保溫材	0.97 (U值<4.1W/M2k)
烹飪設備	0.78 (IH爐)
地下室送排風機	0.80 (節能風機)
電梯	0.40 (變壓變頻控制螺旋齒輪 VVVF+電力回生裝置)
揚水泵	PEB=0.63
預計得分 (估算)	92.59
分級	1+級

[進度說明]

1.115/9/8候選能效評估,取得繳費單及
「發票抬頭確認文件」申請業主用印

(115宏工字第1150004555號函)

2.115/9/17取的業主用印文件

[空軍115/9/14發文]

(國空人庶字第1150216081號)

[調整說明]

因應公共空間的照明,仍需符合統需書的要求,
公共空間照明無法達到預期的0.48
故,

調整兩項目(由以下兩項目增加分數),

1.熱水器

由"2級能效" → "1級能效" 瓦斯熱水器
(調整)

2.電梯

由"變壓變頻永磁馬達電梯"

(調整)

"變壓變頻控制螺旋齒輪 VVVF+電力回生裝置"





五管變更預計時程

更新日期：2026/9/27

編號	變更項目	預計掛件及 預計取得時間	實際掛件及 實際取得時間	預計變更內容	備註
01	消防	(預計)115.04.24掛件 (預計)115.07.10取得	(實際)115.04.24掛件 115.07.21取得核准 115.07.22取得核准函 (北市消大四字第1153005909號函)	配合建築修正消防圖	115年6月份 消防局換消防大隊 審查
02	給水	(預計)115.03.19掛件 (預計)115.06.30取得	(實際)115.03.19掛件 115.06.16取得核准 115.06.17取得核准函 (北市水技字第1156015204號函)	配合建築修正給水圖	115/6/16核准
03	電氣 (台電)	(預計)115.03.19掛件 (預計)115.06.30取得	(實際)115.04.10掛件 115.07.15取得核准文件	配合建築修正電氣圖	115/7/14做副本
04	電信	預計115.03.19掛件 預計115.06.30取得	(實際)115.03.23掛件 115.05.21取得核准函 (TP515字第0095號函)	配合建築修正電信圖	115/5/21核准

[註]以上預估時程電機及消防技師提供,污排水不需辦理變更作業





五管變更差異比較

■ 8/17 發文提送差異比較,納入後續案內變更設計辦理 (115宏工字第1150004815號函)

正本
發文方式：電子交換

檔 號：
保存年限：

宏昇營造股份有限公司 函

地址：804高雄市鼓山區中華一路868號1樓
221411
新北市汐止區新台五路1段112號22樓
承辦人：吳雅蘭
電話：(02)2894-8645

受文者：亞新工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國115年8月17日
發文字號：115宏工字第1150004815號
連別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：https://reurl.cc/lnbyg9

主旨：檢送「復興崗營區職務宿舍新建統包工程」五大管線第一次變更設計（電信、電力、給水、消防）與細部設計核定圖說差異相關事宜，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依115年8月14日第218次專業技術協調會議會議討論內容辦理。
- 二、旨揭工程五大管線第一次變更設計(電信、電力、給水、消防)已於115年5月至7月中旬取得核准，本次提出與細部設計核准圖說差異比較，惠請同意將其納入後續變更設計作業內容。

正本：亞新工程顧問股份有限公司
副本：王正源建築師事務所、王騰建築師事務所

宏昇營造股份有限公司
負責人 郭倍宏

■ 8/25 亞新轉機關(亞新(工管)字第1150049670號)

(一)弱電

更新日期：2026/9/27

	五階核定版	第一次變更審訖版	備註說明
(一)補上圖例			
圖號T1-09	電信室內僅表示光纖芯數接頭"96SCx15"	補上光終端配線架型式 "OLDF-18"	

(二)給水

	五階核定版	第一次變更審訖版	備註說明
(一)戶數變更			
圖號WW1-01~WW2-65	戶數原1戶	裝設4只40mm總表、1只20mm公共專用表	
	原裝設75mm專用表1只	301只分表、4只25mm公共分表	
		並分層設置分表	
(二)A棟B棟C棟地下三層水箱及A棟,B棟,C棟,D棟R1F水箱容量變更			
圖號WW1-02~WW2-05,WW2-06~WW2-10,WW2-63~WW2-65	A棟B3F水箱原為32.83噸,B棟B3F水箱原為32.52噸,C棟B3F水箱原為31.46噸	A棟B3F水箱為32.73噸,B棟B3F水箱為27.74噸,C棟B3F水箱為31.48噸	
	A棟R1F水箱原為40.07噸,B棟R1F水箱原為40.07噸,C棟R1F水箱原為40.07噸,D棟R1F水箱原為40.07噸	A棟R1F水箱為39.34噸,B棟R1F水箱為39.34噸,C棟R1F水箱為39.34噸,D棟R1F水箱為39.34噸	
(三)昇位圖內容變更			
圖號WW1-02~WW1-07	各棟陸上型恆壓變頻加壓機組3HPx2台共8組	各棟陸上型恆壓變頻加壓機組0.5HPx1台共48組	
	A棟.B棟11F至13F,C棟10F至12F,D棟12F至14F及屋頂公共為立式水表	A棟.B棟11F至13F,C棟10F至12F,D棟12F至14F及屋頂公共為平面式水表	
	B3F地下水箱揚水泵設於水箱(一)及水箱(二)內		
		增加分表詳圖及各層水表空間示意圖	
(四)平面圖內容變更			
圖號WW2-06~WW2-10	B3F地下水箱採水箱(一)進水,水箱(二)揚水補水,故揚水泵均設於水箱(二)內		
	A棟B棟C棟B3F水箱容量變更		
圖號WW2-11~WW2-20	補各棟減壓閥設置情形說明表及受水管上下立管		
圖號WW2-21~WW2-24	裝設4只40mm總表、1只20mm公共專用表及補各棟受水管下立管		
圖號WW2-26~WW2-52	分層設置分表及補繪表位配置圖		
圖號WW2-54~WW2-61	分表設置於R1F層		
圖號WW2-63~WW2-65	各棟R1F水箱容量變更,及A棟.B棟11F至13F,C棟10F至12F,D棟12F至14F及屋頂公共設置平面式水表		





五管變更差異比較

更新日期：2026/9/27

(三)電氣

	五階核定版	第一次變更審訖版	備註說明
(一)電錶箱設備容量變更			
圖號 EE0-02-01~EE0-02-03	KWH-MP=478.16kVA(契約容量=140KW)	KWH-MP=679.2kVA(契約容量=200KW)	
	KWH-MA=239.44kVA	KWH-MA=241.42kVA	
	KWH-MB=239.44kVA	KWH-MB=241.06kVA	
	KWH-MC=237.44kVA	KWH-MC=238.88kVA	
	KWH-MD=237.44kVA	KWH-MD=243.96kVA	
	KWH-MPK2=210kVA	KWH-MPK2=210kVA	
	1LA1~10LA7=15.44kVA	1LA1~10LA7=18.26kVA	
	11LA1~12LA7=15.44kVA	11LA1~13LA7=18.76kVA	
	13LA1~13LA3=15.94kVA	13LA1~13LA3=18.76kVA	
	13LA5=18.56kVA	13LA5=19.68kVA	
	13LA6=18.6kVA	13LA6=19.68kVA	
	2LB1~10LB7=15.44kVA	2LB1~10LB7=18.26kVA	
	10LB1~12LB7=15.44kVA	11LB1~13LB7=18.76kVA	
	13LB1~13LB3=15.94kVA	13LB1~13LB3=18.76kVA	
	13LB5=18.56kVA	13LB5=19.68kVA	
	13LB6=18.6kVA	13LB6=19.68kVA	
	1LC1~9LC7=15.44kVA	1LC1~9LC7=18.26kVA	
	10LC1~11LC7=15.44kVA	10LC1~11LC7=18.76kVA	
	12LC1=18.6kVA	12LC1=19.68kVA	
	12LC2=18.56kVA	12LC2=19.68kVA	
	12LC3~12LC6=15.94kVA	12LC3~12LC6=18.76kVA	
	1LD1~11LD7=15.44kVA	1LD1~11LD7=18.26kVA	
	12LD1~13LD7=15.44kVA	12LD1~13LD7=18.76kVA	
	14LD1~14LD7=15.94kVA	14LD1~14LD7=18.76kVA	
(二)燈具規格變更			
圖號EE0-05-01~EE0-05-03	吸頂圓盤燈-LED 60W	吸頂圓盤燈-LED 15W及20W 增設吸頂圓盤燈-LED 45W	

	五階核定版	第一次變更審訖版	備註說明
(三)單線圖規格變更			
圖號EE2-01-01~EE2-11-14,EE7-02-01~EE7-02-03,EE8-01-01	1.部份分電箱IC值修正 3.部份分電箱設備容量變更	2.部份分電箱管線徑修正	
(四)插座配置平面圖變更			
圖號EE3-04-01~EE3-11-07	1.1F幼兒園增設插座設備 座設備	2.2F至R1F各棟梯間增設插座設備	
(五)燈具照明平面圖變更			
圖號EE4-04-01~EE4-12-02	1.B3F至B1F車道燈具部份減少 宅減少炭式燈具	2.1F至14F各棟各戶住 3.各棟屋頂層減少燈具	
(六)動力配置平面圖變更			
圖號EE5-01-01~EE5-02-02	補繪筏基層及B3F水泵電源設備位置		





五管變更差異比較

更新日期：2026/9/27

(四)消防

		五階核定版	第一次變更審訂版	備註說明
(一)系統圖				
系統圖	1	原審建築物用途複合乙檢討	建築物用途改為二款七日<集合住宅>,幼兒園視為另一場所	
	2		補防災監控系統綜合操作裝置認定基準及調整點數表	
	3		配合建築變更修正平面圖、數量表、昇位圖及計算式	
(二)消防設備平面圖				
消防設備平面圖	4	原審設置獨立的綜合盤與室內栓箱	消防栓箱移位,合併火警綜合盤及室內消防栓箱	
	5	原審水箱上設置泡沫頭	水箱上方補設差動式探測器	水箱上方設置探測器可取消泡沫設備
	6		補減壓閥於圖面上	
	7		新增滅火器及移位	
	8		新增出口門燈	
	9	管道間探測器設置在屋突層	配合建築變更設計新增探測器	與建築確認管道間各樓層有樓板,面積大於1m2設置探測器
	10		新增緊急照明燈	
	11	原審建築物用途複合乙檢討	幼兒園已另一場所檢討	
	12	原審設置兩只啟動開關	採水手動啟動開關改為一只	
(三)泡沫設備平面圖				
泡沫設備平面圖	13	原審水箱上設置泡沫頭	水箱上方取消泡沫頭	水箱上方設置探測器可取消泡沫設備
	14		流水檢知裝置移位	
	15		因取消泡沫頭配合結構重新調整泡沫區劃	
(四)排煙設備平面圖				
排煙設備平面圖	16		配合建築重新檢討自然排煙窗	
	17	(執照階段/原消防核准圖)原審幼兒園居室部分為F60A防火門	幼兒園視為另一場所,居室改為一般門,需增加防煙垂壁	1.若門上方有50公分以上不燃材可以取代防煙垂壁 2.經檢討B棟1樓公共空間門上方皆有50CM以上的不燃材, C棟1樓無障礙廁所、男廁、女廁、茶水間的天花由(高程)240cm提高至(高程)270cm(工程竣工前完成報備作業)






五管變更差異說明

更新日期：2026/9/27


[消防變更]B棟、C棟公共空間需增設防煙垂壁,調整以門上方有50CM以上的不燃材,取代防煙垂壁

- > B棟1樓公共空間門上方皆有50CM以上的不燃材,
C棟1樓無障礙廁所、男廁、女廁、茶水間的天花由[240cm]提高至[270cm]

調整前

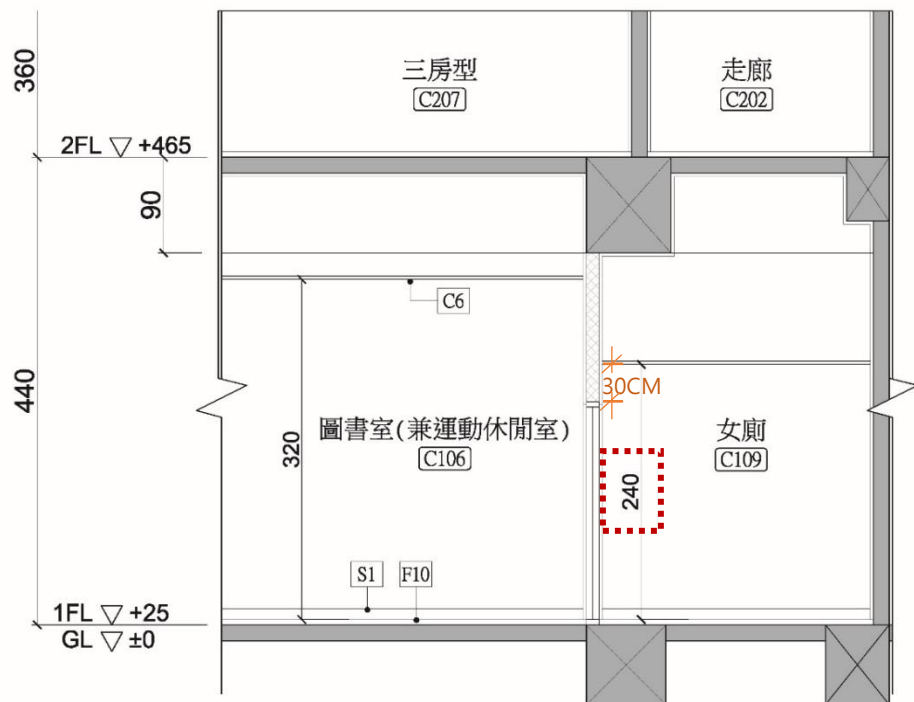

調整後

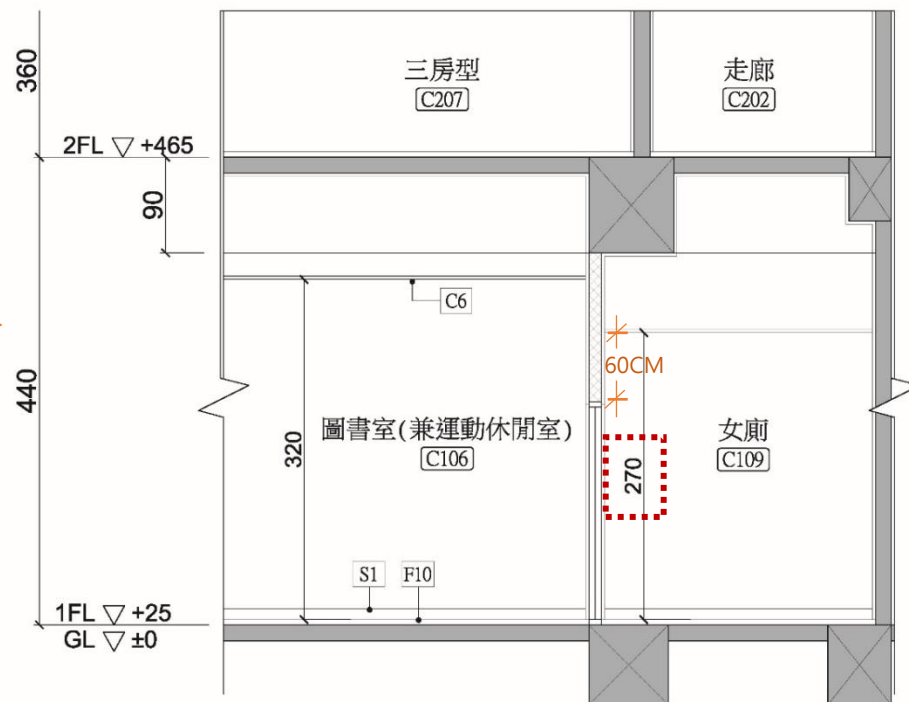

[註]竣工前需辦理完成報備作業





五管變更預計時程

更新日期：2026/9/27

(設計)電機技師回復:

有關於五管變更是否影響現場施作事宜?

回復如下:

- 一、地下室電氣管線原規劃均採樑下施作，並無設計穿樑，不涉結構體之開孔或破壞。
- 二、金屬（鐵）管部分採明管吊架施作，僅 2 吋以下 PVC 管為暗埋施作，且該暗埋管路均敷設於樓板或牆內，未穿越樑柱結構。
- 三、綜上，本次圖說變更應不涉穿樑及埋柱等影響結構強度之情形，故應不影響結構施工。

(設計)電機技師回復:

業主詢問,有關於工作陽台的瓦斯熱水器是否能調整為電熱水器?

回復如下:

- 一、依需求書為瓦斯熱水器。
- 二、各戶用電保護開關已達100A，已是單相電錶最大值。
- 三、現各戶約83A+電能熱水器約123A，保護開關不足。



校方側(基地外側)排水計畫

- 
- 115/01/05 補充水利圖資於大群組
 - 115/01/08 合署作業
 - 115/01/23 修正資料放大群組
 - 115/02/04 聯審作業
 - 115/02/10 正式發文(第一版,修訂2次)
115宏工字第1150000980號函
 - 115/02/13 專管依115/2/11第193次專技會議結論
於農曆春節連假前將書圖文件函轉主辦機關
亞新(工管一)字第1150008788號函
 - 等機關回復後續辦理方式
 - 115/3/30 (亞新(工管一)字第1150016355號函)
建築能效1+級及基地外側排水計畫書圖文
件納入第2次變更設計範圍內
 - 115/4/28 依4/28建研環字第1157638324號函整理相
關資料後辦理





建築能效評估(詳「能效評估研討會議」)簡報

更新日期：2026/9/27

- 8/3 發文申請用印115宏工字第1150004554號函
- 8/5 專管轉工營中心
(亞新(工管)字第1150046022號)
- 8/17 檢送候選建築能效評估申請文件鈐印
(國空人庶字第1150192396號)
(8/19統包收到用印文件)
- 8/19 資料轉建築能效評估顧問,整合後送件
- 8/24 沙德爾颱風,南部放假
- 8/25 顧問收到資料,彙整並於當日寄出掛件資料
- 9/2 建築中心同意收件
- 9/8 收到建築中心發出繳費單「發票抬頭確認文件」申請業主用印(115宏工字第1150004555號函)
- 9/14 完成繳費作業(101,000元)
- 9/17(五)取得空軍用印文件(空軍115/9/14發文)
(國空人庶字第1150216081號)
- 9/21(一)完成上傳作業,等待審查作業
- 9/23取得審查意見
- 9/24(二)、9/29(二)~10/02(五)修正作業

宏昇營造股份有限公司 函

地址：804高雄市鼓山區中華一路868號1樓
承辦人：黃昭雄
電話：(02)2894-8645

受文者：王騰建築師事務所

發文日期：中華民國115年9月8日
發文字號：115宏工字第1150005238號
類別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：https://reurl.cc/rkY2Gx (1150005238_Attach1.pdf)

主旨：有關「復興崗營區職務宿舍新建統包工程」候選建築能效評估之發票抬頭確認文件申請事宜，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依國防部空軍司令部人事軍務115年8月17日國空人庶字第1150192396號函續辦。
- 二、旨揭工程候選建築能效評估已於115年8月25日送出掛件文件，115年9月2日取得建築中心收件憑證，115年9月8日收到繳費通知相關文件，其中「發票抬頭確認用印文件」(乙式1份)需使用單位用印，除請貴公司函轉使用單位申請用印，俾利後續呈送營管機關辦理完成掛件作業。

正本：亞新工程顧問股份有限公司
副本：國防部軍備局工程營產中心、王騰建築師事務所、王騰建築師事務所

宏昇營造股份有限公司 黃昭雄 啟

申請案件	復興崗營區職務宿舍新建統包工程
發票抬頭	國防部軍備局工程營產中心
統一編號	01026014
發票金額 (含稅)	新台幣 101000 元整
執具編號/捐贈愛心碼	(若為個人戶，請填寫執具編號或捐贈愛心碼)

備註：請於繳款後，填寫發票抬頭、統一編號，並請案件申請單位用印簽名後，於SSO系統上傳掃描檔，完成所有繳費程序。

用印
簽名

發票抬頭統編確認用印文件

[註]有關能效評估詳細內容，詳115.04.09(四)第200次專業技術協調會議_統包商簡報。





簡報大綱

1

整體進度報告

整體進度說明

歷次展延/不計工期控管表

估驗計價及施工進度表

建管行政流程進度控管表

2

施工單位報告

三月預定進度

三週預定進度

施工進度說明

現場施工照片

送審文件管制

3

設計單位報告

設計進度說明

設計議題討論

4

會議結論辦況



項次	會議結論	辦況
一、	細部設計各階段逾期不可歸責之檢討(自第101次~224次專技會議，未完成)：114年5月22日經與機關及統包商研討確認，納入計價請款時之設計工期檢討，統包商說明預計第二期設計費後辦理。工營中心114年11月26日已完成第二期設計費計價。	細部設計各階段逾期不可歸責之檢討 屬於第四期設計費用辦理事項 114/11_完成設計費第3期計價作業 115/01_完成設計費第3期計價作業 第4期計價及不可歸責檢討 細部設計階段不可歸責乙方原因 已於115/07/01發文提出 (115宏工字第1150003877號函) 工營115/7/20回函 因專管需逐項澄復統包商所提佐證資料， 同意寬限至本中心文到後30天內完成 ★115/9/1備工建規字第11500011371號函,工營同意展延至9/21
6.	115年9月21日專管單位已亞新（工管）字第1150055010號發函，敬請機關展延工作天15日。（本項次持續列管）	依114/11/26 工營中心 備工建規字第1140017534號函辦理 細部設計報告書(含工期檢討) 屬於第四期設計費用辦理事項 細部設計階段不可歸責乙方原因 已於115/07/01發文提出 (115宏工字第1150003877號函) 工營115/7/20回函 因專管需逐項澄復統包商所提佐證資料， 同意寬限至本中心文到後30天內完成 ★115/9/1備工建規字第11500011371號函,工營同意展延至9/21





項次	會議結論	辦況
一、	建照第2次報備圖說與原核准細設圖差異：專管單位於115年5月12日以亞新（工管一）字第1150025040號函文機關，同意廠商以設計釋疑辦理。115年6月4日第208次專技會議，專管單位請統包商儘速辦理圖說釋疑。設計單位說明，本項主要係因B棟1樓排煙窗及天花板高度等內容，於第二次報備變更送審過程中配合消防審查意見辦理調整，致部分內容與原細設圖說不符。另第二次報備變更相關圖說、差異表及附件資料均已完成彙整，經會議討論，本項原則併入第二次建照變更一併辦理；惟如現場施工時程不及，得先以圖說釋疑或設計釋疑方式先行釐清，後續再併同第二次建照變更程序辦理。專管提醒倘涉及建築法第39條變更設計要件，應先行辦理變更設計程序後再行施工，請避免先行施工情事再發生。（本項次持續列管）	依照115/5/12 亞新（工管一）字第1150025040號函辦理 經115年5月7日第204次專技會議記錄及統包商說明確認非屬契約第21條契約變更部分， 同意另案辦理設計釋疑。





項次	會議結論	辦況
三、	第1次五大管線變更設計：(本項次持續列管)	
7.	115年9月17日(專管9/18收文)，北工處發函備北工營字第1150007909號，請專管單位配合五大管線第一次變更設計核准，檢附業管機關核准證明，並依契約規定完成設計疏責、同等品及工期增減等相關檢討後再行提送，俾利本處憑辦。115年9月23日，專管單位發函回覆北工處發函備北工營字第1150007909號，建請機關以第220次專業技術協調會議說明，將本案納入後續變更設計程序辦理(本項次持續列管)	竣工前完成相關修正作業





項次	會議結論	辦況
四、	流出抑制計畫與施工作業期程影響(歷經第164次~224次專技會議，未完成)：114年9月4日第170次專技會議，統包商說明排水滯洪規劃之滯洪量依臺北市政府工務局水利工程處核定之流出抑制設施排水計畫辦理，無須辦理變更。114年10月2日第174次專技會議，經水利技師及工地確認後流出抑制須辦理變更設計，變更時程最遲需於使照請領前6個月辦理相關作業。(本項次持續列管)	1.目前案件排水滯洪量規劃 依113/9/30臺北市政府工務局水利工程處核定 (北市工水水字第1136045972號函) 流出抑制設施排水計畫辦理 2.經檢討建議辦理變更設計作業 3.變更時程最遲需於使照前6個月辦理相關作業





項次	會議結論	辦況
五、	建築能效評估(歷經第163次~224次專技會議，未完成)：臺北市政府都市發展局於114年7月14日北市都授建字第1143048016號函已說明本工程建築能效應達第1+級。工營中心114年7月28日備工建管字第1140010618號函說明四略以「另針對建築能效評估乙案，...釐清本案後續適用規定、原核定細設內容須配合調整項目、是否涉及其他契約變更等初步檢討，於114年8月8日前提送本中心，.....」。	遵照辦理,本工程建築能效應達第1+級
1.	有關建築能效初步評估展延部分(本項次持續列管)	
(1)	工營中心於114年8月18日函同意展延至114年8月25日。	
(2)	114年9月4日第170次專技會議設計單位說明展延至114年9月18日。	
(3)	114年9月18日第172次專技會議統包團隊說明需再展延至114年10月9日提出初步評估資料，專管單位提醒，統包團隊欲展延日期在不影響現場工進前提下無意見，建築能效初步評估若因統包團隊持續延宕，進而影響材料設備發包作業執行或現場工進，仍屬統包團隊責任。	(前情詳220次專件會議說明,本次由115/4/27) 4/27(電聯)4/27或4/28會發文 (依4/28建研環字第1157638324號函辦理) 機電5/31前提送修正資料,供建築能效評估 顧問檢討相關內容,(預計)115/8/15掛件, (預計)116/03/31取得候選證書 7/31(五)完成報告書, 8/3 發文申請業主用印 (115宏工字第1150004555號) 8/5 專管轉工營中心 (亞新 (工管) 字第1150046022號) 8/19(三)空軍用印文件(115/8/19收文) (115/8/17_國空人庶字1150192396號) 取得用印文件,轉顧問 8/24(一) 沙德爾颱風,南部放假 8/25(二) 顧問收到資料,彙整並於當日寄出掛件資料 9/2(三) 建築中心同意收件 9/8 (二) 收到建築中心發出繳費單「發票抬頭確認文件」, 申請業主用印(115宏工字第1150004555號函) 9/14(一) 完成繳費作業(101,000元) 9/17(五) 取得空軍用印文件(空軍115/9/14發文) (國空人庶字第1150216081號) 9/21(一) 完成上傳作業,等待審查作業 9/23取得審查意見 9/24(二)、9/29(二)~10/02(五)修正作業
(4)	114年10月9日第175次專技會議工營中心要求114年10月底前提出確定方案予工營中心。	
(5)	統包團隊未依據第175、177次專技會議結論調整合宜方案，致無法於第178次專技會議提出方案予使用單位在會議中討論，無法依工營中心要求於114年10月31日前提出確定方案，需再展延日期請統包商於下週專技會議回報。114年11月13日第180次專技會議，統包設計單位於會議中說明，114年11月6日協同專管相關顧問召開建築能效討論會議之意見尚未調整完妥，預計於114年11月27日專技會議提出方案討論，並預定114年12月5日前提出初步評估資料。	
(6)	114年11月27日第182次專技會議，因揚水泵PEB之Qc計算方式認定問題，統包設計單位諮詢建築中心，目前建築中心討論中，初步評估資料恐無法於114年12月5日提出。114年12月4日第183次專技會議，統包設計單位回復因揚水泵PEB之Qc計算方式認定問題尚未確認，初步評估資料需再展延至114年12月31日提出。	
(7)	114年12月31日第187次專技會議，統包商設計單位於114年12月22日以E-mail提供建築中心辦理後續，本日(12/31)會中統包設計單位說明，因揚水泵PEB之Qc計算方式認定，尚未收到建築中心確認資訊，故初步評估資料預計需再展延至115年1月31日提出。	
(8)	115年1月29日第191次專技會議，統包設計單位說明，經電話聯繫建築中心承辦，本案有納入115年1月22日內部會議討論，惟未取得結論，另建築中心建議發文予建研所協助確認，統包設計單位已於115年1月28日發文，持續因揚水泵PEB之Qc計算方式認定，尚未收到建築中心確認資訊，故初步評估資料預計需再展延至115年2月28日提出。	
(9)	115年2月26日第194次專技會議，統包設計單位已於115年1月28日發文予建築中心、建研所協助確認，持續因揚水泵PEB之Qc計算方式認定，尚未收到建築中心確認資訊，故初步評估資料預計需再展延至115年3月31日提出。	
(10)	115年3月25日第198次專技會議，有關建築能效釋疑申請，持續因揚水泵PEB之Qc計算方式認定，尚未收到建築中心、建研所確認資訊，故初步評估資料預計需再展延至115年4月30日提出。	[註]:上週提出預計取得建築能效評估時間為116/2/28，為最快可以取得時間，實際仍依業管機關審核及核發時間為主。



項次	會議結論	辦況
五、	建築能效評估(歷經第163次~223次專技會議，未完成)：臺北市政府都市發展局於114年7月14日北市都授建字第1143048016號函已說明本工程建築能效應達第1+級。工營中心114年7月28日備工建管字第1140010618號函說明四略以「另針對建築能效評估乙案，...釐清本案後續適用規定、原核定細設內容須配合調整項目、是否涉及其他契約變更等初步檢討，於114年8月8日前提送本中心，.....」。	遵照辦理,本工程建築能效應達第1+級
1.	有關建築能效初步評估展延部分(本項次持續列管)	同六、2之說明
(11)	115年4月29日第203次專技會議，建研所115年4月28日建研環字第1157638324號函指示PEB之Qc計算方式，設計單位將依該函指示進行相關作業，會盡快提供預定完成日期在專技會議說明。	(前情詳220次專件會議說明,本次由115/4/27) 4/27(電聯)4/27或4/28會發文 (依4/28建研環字第1157638324號函辦理)
(12)	115年5月7日第204次專技會議，設計單位說明預計115年8月中完成。惟專管監造單位於會議中表示，若評估完成時程落於8月中，恐壓縮統包商後續現場設備相關作業期程，爰設計單位回應，將於下週第205次專技會議前09:30由機電技師到場說明，並進一步釐清建築能效評估後續辦理期程及相關配合作業。	機電5/31前提送修正資料,供建築能效評估顧問檢討相關內容,(預計)115/8/15掛件, (預計)116/03/31取得候選證書
(13)	115年5月14日第205次專技會議，設計單位報告預計於115年5月31日前完成機電檢討及圖說調整作業，並提送修正資料供建築能效評估顧問檢討；另預計於116年2月28日取得候選證書，惟實際辦理時程仍可能依主管機關審查進度調整，前述時程僅供會議追蹤管控。	7/31(五)完成報告書, 8/3 發文申請業主用印 (115宏工字第1150004555號)
(14)	115年6月10日第209次專技會議，設計單位回報建築能效依照P43、44頁進度，盡量於七月底八月初前確認，是否影響結構施工，第210次專技會議持續追蹤進度。	8/5 專管轉工營中心 (亞新 (工管) 字第1150046022號) 8/19(三)空軍用印文件(115/8/19收文)
(15)	115年6月25日，第211次專技會議，機關詢問建築能效目前實際辦理進度，並表示先前所提出之期程為7月底至8月初完成相關圖說及資料整合，惟目前每週會議紀錄僅記載「持續檢討」或「設計單位辦理中」，無法掌握各項工作之實際完成程度，亦無法確認原訂期程是否可能延誤。	(115/8/17_國空人庶字1150192396號) 取得用印文件,轉顧問
(16)	115年7月2日，第212次專技會議，設計單位說明預計於115年7月底取得第一版評估資料；如受假日或作業影響，可能順延至8月初提供。	8/24(一) 沙德爾颱風,南部放假
(17)	115年7月2日第212次專技會議，為釐清機關對整體辦理期程之疑慮，請設計單位儘量協調建築能效顧問或相關技師，於115年7月16日前之專技會議到會或以線上方式說明目前辦理進度、後續作業及預定完成期程。	8/25(二) 顧問收到資料,彙整並於當日寄出掛件資料
(18)	115年7月16日第214次專技會議，設計單位林建築師語音遠端說明，截至115年7月8日空調、外殼等皆完成，預計115年7月31日(五)完成一版，115年8月4日(二)前提供群組1版並開始啟動申請業主用印作業(詳細進度與日期，詳簡報P39)。	9/2(三) 建築中心同意收件 9/8 (二) 收到建築中心發出繳費單「發票抬頭確認文件」,申請業主用印 (115宏工字第1150004555號函)
(19)	115年7月22日第215次專技會議，設計單位說明，目前建築能效進度截至115年7月19日空調外殼、熱水皆完成，整體進度73.8% (其他進度：用印文件、爐台設備、地下停車場送排風機、電梯、揚水泵50%、照明節能90%)預計115年7月31日(五)完成一版，115年8月4日(二)前提供群組1版並開始啟動申請業主用印作業(詳細進度與日期，詳簡報P40)。	9/14(一) 完成繳費作業(101,000元) 9/17(五) 取得空軍用印文件(空軍115/9/14發文) (國空人庶字第1150216081號) 9/21(一) 完成上傳作業,等待審查作業
		(預計)116/03/31取得候選證書 [註]:前幾週提出預計取得建築能效評估時間為116/2/28，為最快可以取得時間，實際仍依業管機關審核及核發時間為主。



項次	會議結論	辦況
五、	建築能效評估(歷經第163次~223次專技會議，未完成)：臺北市政府都市發展局於114年7月14日北市都授建字第1143048016號函已說明本工程建築能效應達第1+級。工營中心114年7月28日備工建管字第1140010618號函說明四略以「另針對建築能效評估乙案，...釐清本案後續適用規定、原核定細設內容須配合調整項目、是否涉及其他契約變更等初步檢討，於114年8月8日前提送本中心，.....」。	遵照辦理,本工程建築能效應達第1+級
1.	有關建築能效初步評估展延部分(本項次持續列管)	
(20)	115年7月30日第216次專技會議，設計單位說明，目前建築能效進度截至115年7月29日外殼、空調、照明、熱水、爐台、地下室停車場送排風機、電梯皆完成，整體進度93.8% (其他進度：用印文件、揚水泵50%)預計115年7月31日(五)完成一版，115年8月4日(二)前提供群組1版並開始啟動申請業主用印作業(詳細進度與日期，詳簡報P44)。	同六、2之說明 (前情詳220次專件會議說明,本次由115/4/27) 4/27(電聯)4/27或4/28會發文 (依4/28建研環字第1157638324號函辦理)
(21)	115年8月6日第217次專技會議，設計單位說明統包團隊於115年8月3日以115宏工字第1150004555號函，檢送本工程候選建築能效評估申請所需之起造人用印文件。專管單位業於115年8月5日以亞新(工管)字第1150046022號函轉起造人，請其協助辦理用印。	機電5/31前提送修正資料,供建築能效評估 顧問檢討相關內容,(預計)115/8/15掛件, (預計)116/03/31取得候選證書
(22)	115年8月18日第219次專技會議，機關說明，起造人於115年8月17日國空人庶字第1150192396號發函通知，已完成鈐印(專管監造單位於8月19日收文)，後續由設計單位接續辦理掛件及審查作業。	7/31(五)完成報告書, 8/3 發文申請業主用印 (115宏工字第1150004555號) 8/5 專管轉工營中心 (亞新(工管)字第1150046022號)
(23)	115年8月28日第220次專技會議，設計單位說明，於115年8月19日取得起造人用印文件後即轉交建築能效顧問；因8月24日颱風南部停班，顧問於8月25日收到資料並於當日寄送掛件資料予建築中心。惟目前尚待確認建築中心實際收件及掛件情形，設計單位持續追蹤，並於下週專技會議明確說明掛件程序及審查進度。	8/19(三)空軍用印文件(115/8/19收文) (115/8/17 國空人庶字1150192396號) 取得用印文件,轉顧問
(24)	115年9月2日第221次專技會議，設計單位說明，建築中心已確認收受紙本申請資料，惟尚待完成正式掛件收執並排入審查程序。主席考量以116年3月31日前取得候選證書為目標，整體辦理期程已較為緊迫，請設計單位主動向建築中心確認申請文件是否完整、有無須補正事項及正式掛件日期。設計單位表示，已持續主動追蹤掛件及缺件情形，惟建築中心內部尚有既定行政作業流程，仍須俟其正式書面通知後續將持續追蹤辦理進度。	8/24(一) 沙德爾颱風,南部放假 8/25(二) 顧問收到資料,彙整並於當日寄出掛件資料
(25)	115年9月11日第222次專技會議，設計單位說明，於115年9月8日115宏工字第1150005238號發函通知專管單位，建築中心已於115年9月2日收受申請資料、9月8日通知繳納審查費新臺幣10萬1,000元及「發票抬頭確認文件」，前開審查費由設計單位先行墊付，後續再依程序向機關辦理請款。專管單位於115年9月11日亞新(工管)字第1150055188號發函請空軍辦理文件用印，並請於用印完成後逕交統包商接續辦理。俟完成繳費及文件補正後，始得正式掛件，俟完成繳費及補件後始得正式掛件；預估行政作業約需2週，可能至10月初進入審查，考量後續審查約需4個月，116年3月31日前取得候選證書已有期程風險。另目前能效估算92.59分，已達1+級，後續將以提升瓦斯熱水器能效、調整電梯系統及增設電力再生裝置補足分數，相關變更費用尚待確認。	9/2(三) 建築中心同意收件 9/8 (二) 收到建築中心發出繳費單「發票抬頭確認文件」,申請業主用印(115宏工字第1150004555號函) 9/14(一) 完成繳費作業(101,000元) 9/17(五) 取得空軍用印文件(空軍115/9/14發文) (國空人庶字第1150216081號)
(26)	115年9月17日第223次專技會議，設計單位說明，有關建築能效評估辦理進度，已於115年9月14日完成繳費作業；另空軍司令部人事軍務處已於115年9月14日以國空人庶字第1150216081號函辦理相關用印事項。俟用印文件完成後，續由設計單位提送財團法人台灣建築中心辦理正式掛件程序，續予列管	9/21(一) 完成上傳作業,等待審查作業 9/23取得審查意見 9/24(二)、9/29(二)~10/02(五)修正作業
(27)	115年9月24日第224次專技會議，設計單位說明，有關建築能效評估辦理進度，空軍端用印完成後，資料於9月21日上傳；9月23日建築中心已有初步審查意見。	(預計)116/03/31取得候選證書 [註]:前幾週提出預計取得建築能效評估時間為116/2/28，為最快可以取得時間，實際仍依業管機關審核及核發時間為主。



項次	會議結論	辦況
六、	第二次變更設計暨新增需求作業(「新設圍牆校方側排水工程」及「建築能效」): (本項次持續列管)	
1.	北工處115年3月24日備北工營字第1150002388號函催辦「建築能效」相關期程及圖說資料，俾與基地外側排水計畫併案辦理第二次變更設計暨新增需求作業。	
2.	115年6月4日第208次專技會議，請統包廠商評估「新設圍牆校方側排水工程」是否影響要徑需要先行施工？統包商於會中回覆，本項排水工程原則上會影響新設圍牆、瓦斯管線及污水管線等相關施工界面；惟該排水係銜接至原設箱涵，對主體結構體施工原則上尚無重大影響。另考量若現階段未先行辦理，後續再行施作水溝時，相關施工界面恐較為複雜，仍需就排水銜接、管線界面及施工順序再予釐清。鑑於機關已指示本項排水工程併入第二次設計變更一併討論，故後續俟第二次設計變更程序完成後，再行啟動相關作業。	
3.	115/6/24統包商以115宏工字第1150003767號函提送第二次變更設計基地外側排水計畫事宜，專管單位原則無附加意見，並已於115年6月30日以亞新(工管一)字第1150036796號函請機關核示。	
4.	機關已於115年7月15日備北營字第1150005962號函文，請依照函文內容指示辦理。(專管監造單位於115年7月20日收文)	
5.	115年7月30日第216次專技會議，針對「新設圍牆校方側(基地外側)排水工程」與建築能效評估採拆案或併案辦理進行討論。會中考量本項排水工程與新設圍牆、景觀及瓦斯管線之施工界面密切，原則朝納入本案第二次變更設計辦理方向研議；另請統包商補充提供圍牆、景觀及排水工程之工期及細部施工排程，供專管單位彙整後續函復機關。	
6.	115年8月6日第217次專技會議，專管單位於115年7月24日以亞新(工管)字第1150042978號函，申請將本案回覆期限展延至115年8月7日；惟為加速案件辦理，專管單位仍於展延期限屆至前，於115年8月4日以亞新(工管)字第1150046353號函完成函復。機關嗣於115年8月5日以備北工營字第1150006762號函，同意前述展延申請。專管單位於函復內容中說明，綜合考量整體排水功能、施工順序、工程界面、權責劃分及工期管控等因素，為避免後續拆除、復舊及重複施工，造成公帑浪費，不宜將基地外側排水工程自本次變更設計排除而僅先行施作新設圍牆。爰建議將基地外側排水工程納入本案第二次變更設計先行辦理；建築能效相關變更項目則與基地外側排水工程分案辦理，俟候選證書及相關變更內容確認後，再依程序續辦。	115/02/04 聯審作業 115/02/10 正式發文(第一版,修訂2次) 115宏 工字第1150000980 號函
7.	115年8月13日第218次專技會議，專管單位說明，基地外側排水與建築能效分案辦理之相關資料已循程序陳報，後續俟機關核示。	
8.	115年9月2日第221次專技會議，會議就基地外側排水、景觀、新設圍牆、瓦斯管線及主體工程之施工界面進行討論。統包商說明，基地外側排水與新設圍牆、瓦斯管線及流出抑制設施銜接具有先後關係，如未儘早確認，恐增加後續拆除、復舊及施工界面處理。經會議討論，現階段統包商希望優先推動基地外側排水第二次變更設計的進行，建築能效及其他項目另案辦理；機關及專管單位則要求統包商提出更明確的施工順序、銜接節點及影響說明，不能僅以口頭表示會影響工期，須有具體資料供機關，作為機關審議及後續工期檢討參考；所涉經費及工期俟機關同意辦理變更設計後，再依契約程序議定。	
9.	115年9月11日第222次專技會議，專管監造單位希望統包商提出基地外側排水、新設圍牆、景觀及瓦斯管線之施工進度、工序與界面影響資料。統包商表示可提供其他資料說明施工順序及界面影響；雙方對資料呈現方式尚待協調；所涉工期及經費待成案後，再依約檢討。	
10.	115年9月17日第223次專技會議，有關第二次變更設計，本機關已於115年9月9日及9月10日分別函請專管監造單位辦理相關事項，並要求於115年9月25日前完成回覆。考量專管單位尚需辦理資料彙整、函稿簽核及適逢假日等因素，請統包商原則於115年9月21日前完成相關資料整理及正式回覆，以利專管單位依限彙整函復。前開議題於前兩次專技會議均已討論，部分審查意見亦已先行提供統包商，請統包商依相關意見及期限儘速辦理，避免影響後續第二次變更設計作業。	
11.	115年9月24日第224次專技會議，有關第二次變更設計基地外側排水工程，統包商說明，已於115年9月21日以115宏工字第1150005452號函檢送相關資料予專管單位，並於會中表示，考量現階段施工進度，以及後續景觀、新設圍牆、瓦斯管線及主體工程等施工界面，基地外側排水工程與相關工項之施工順序及界面銜接密切相關，爰建議儘速啟動第二次變更設計程序。經會議討論，原則同意先行啟動第二次變更設計相關作業，至統包商所提工期調整部分，另依實際影響情形及相關佐證資料續予檢討。另機關說明，基地外側積水區及排水設施涉及原計畫範圍外之新增需求，相關程序仍須持續辦理。請專管單位依本次會議討論結果彙整相關資料，於115年9月29日前提供機關，俾利機關於115年9月30日辦理後續函文作業	



項次	會議結論	辦況
七、	有關北投醫院借地期限至114年12月31日止，因北投醫院借地期程掌握不確定，經北工處初步協調，待通知後再行歸還，這段期間原則都可以使用。另統包商於114年12月16日以114宏工字第1140008668號函說明，俟收到通知後再行歸還北投醫院用地。115年8月28日第220次專技會議，有關地面樓層混凝土澆置借道政戰學院校地事宜，統包商說明既有借道及隔離設施方案前已提送，且本工程與政戰學院無契約關係，仍須由機關協助協調。經會議討論，原則以北投分院工程上網公告作為預先準備節點，並以決標作為正式啟動借道及還地協調之節點，也請相關單位持續留意北投分院工程招標及決標進度，並於正式啟動前儘早與政戰學院確認借道動線、隔離設施及交通維持措施。(歷經第176次~224次專技會議，未完成)。(本項次持續列管)	依共識辦理。
八、	114年11月27日第182次專技會議，統包商簡報 P37，有關本工程與北投醫院界面高程，減作擋土牆不可行原因，經統包商依專業立場提供高程降挖之優劣分析，恐影響流出抑制變更、五大管線變更、建照變更或報備、已核定之細部設計變更設計等，影響層面過多，且不利本案後續工進，不建議辦理調整，請統包商發文提送專管監造單位，以利機關函轉北投分院憑辦；114年12月4日第183次專技會議，北工處說明已將上週(114年11月27日)專技會議紀錄結論提供北投醫院承辦供參。統包商於114年12月16日以114宏工字第1140008668號函，檢送與北投分院工程界面調整高程(減作擋土牆)優劣分析資料，專管單位於114年12月19日以亞新(工管一)字第1140074315號函，審轉機關核示。(本項次持續列管)	本案已正式上網公告，建議解列。






項次	會議結論	辦況
九、	有關瓦斯改管部分：	
3.	115年7月9日第213次專技會議，有關瓦斯管線遷移費用代墊須由機關發文指示一節，機關承辦表示刻正辦理相關發文作業，後續俟機關函文送達後，請統包商依函示內容及契約程序續辦。(本項次持續列管)	請機關確認程序無後續疑義後，再正式發文予本公司辦理。
4.	115年8月6日第217次專技會議，有關瓦斯管線遷移事宜自115年6月17日第210次專技會議起研議，並於同年6月25日邀集專管監造單位及統包商共同往訪瓦斯公司研商。嗣於第211次專技會議，考量瓦斯公司須完成繳費後始得派工，而本處須俟遷移工程完成並經查驗確認後始得辦理付款，爰請統包商研議先行代墊費用之可行性，並於第212次至第216次專技會議持續列管。經本次會議確認，前開遷移費用得依統包契約規費相關規定辦理；為避免影響後續工程進度，請統包商先行代墊，俟工程完成並經查驗確認後，檢附瓦斯公司繳費通知、付款證明、完工及查驗資料等文件，依契約程序函報本處審核歸墊。本項結論納入本次會議紀錄，並由本處另函通知統包商辦理。	



項次	會議結論	辦況
十一、	有關泵浦類材料送審日期，與建築能效揚水泵未確認相關，請統包商再行檢討預定送審日期合理性。統包商於115年3月25日第198次專技會議說明，送審文件(材料)管制表，後續將俟北工處核定預定進度網圖後，再依最新網圖調整預訂送審時程，115年4月20日機關北工處於115年4月20日依備北工營字第1150003386號函，核定施工網圖。(本項次持續列管)	已更新送審文件管制總表送審時程



An architectural rendering of a modern high-rise building with a distinctive design featuring vertical brown slats and horizontal white bands. The building is set against a clear blue sky with a crescent moon and scattered clouds. In the foreground, there is a large green tree, a paved walkway, and a row of purple flowers. Two small figures of people are visible near the base of the tree. The overall scene is bright and clear.

簡報完畢
敬請指教

請 假 單

本案 王騰建築師，茲因另有會議，不克參加『復興崗營區職務宿舍新建統包工程』於115年09月30日召開『第225次專業技術協調會』，敬請見諒，惠請 貴中心准假乙天，並授權由鄭伊婷經理代理出席。

此致

國防部軍備局工程營產中心


王騰建築師事務所

請假人：王騰 建築師

身分證字號：F121848257

代理人：鄭伊婷經理

身分證字號：H222891023



中 華 民 國 115 年 09 月 29 日
